

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๑๔๘/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๕๐ ถนนสิโรรสสาย ๒ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดย นายนาอ็ฟ หะมี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๑๔๘๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพร หมู่ที่ ๓ - บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) ณ ถนน คสล. สายบ้านพร หมู่ที่ ๓ - บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบป้ายและแบบก่อสร้าง จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันสัญญา ของ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๑๐๐๐๗๘๗๑๗๖๘๒ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายนาอ็พ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕๓,๗๓๘.๓๒ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๘๗,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพรุ หมู่ที่ ๓ - บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพรุ หมู่ที่ ๓ - บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะมะอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายนาอ็ฟ หะมิ)



เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอึพ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบและความ ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่า จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับ จ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายนาอ็ฟ หะมิ)

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว

หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕,๘๗๕.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายนาอึฟ หะมิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีธงเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)



ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เลขที่โครงการ ๖๘๑๒๙๐๕๔๑๕๒

เลขคุมสัญญา ๖๘๐๒๒๒๐๐๗๕๖๕



อ.ศ.5 ใบสลิปหลังตราสาร

เลขที่ 00927
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

เลขประจำตัว 0953557000143 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ด้านหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ไผ่

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ชื่อผู้ : เลขรหัสประจำบ้าน	ชื่ออาคาร -
ห้องเลขที่ -	ชั้นที่ -
หมู่บ้าน -	หมู่ที่ -
เลขที่ 50	แยก -
ตรอก/ซอย -	แขวง/ตำบล สะเตง
ถนน สีโระส สาย 2	จังหวัด ยะลา
เขต/อำเภอ เมืองยะลา	
รหัสไปรษณีย์ 95000	

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีแสดมภ์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราภาษีแสดมภ์ ปี 23
ลักษณะตราสาร คู่ฉบับ ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	2,196,261	68
ค่าภาษีแสดมภ์	5	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	5	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (ห้าบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 003848

ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

เลขระบุเอกสาร อ.ศ.4 คือ 12950010-25690223-1-02-000008

ลงชื่อ

(นางสาวยามิระ ระสิมพะมิ)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่งานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสลิปหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภาษีแสดมภ์ของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและยกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100078717682

วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนปราจิณ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ้ว และ นางจุฑาทิพย์ ภัทรเศรษฐกร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพรุ หมู่ที่ 3 - บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) ณ ถนน คสล. สายบ้านพรุ หมู่ที่ 3 - บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 00148/2569

เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 117,500.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 117,500.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2571 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ้ว) 2220

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นางปาริยพิชชา อินทรรัตน์)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นายฐาปนนท์ ทองนุ้ย)

พยาน

การขอรับหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-43935448-1-1 :-

EFF_C_1_NY_PLUS

2835632

K-Contact Center 02-8888888

www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

หมายเลข 010753600015



ที่ ยล. 000982

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953557000143

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายนาอ็อพ ทะมิ

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

700,000.00 บาท

2. นายมนูธรรม มะเซ็ง

ลงหุ้นด้วย เงิน

จำนวน

300,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายนาอ็อพ ทะมิ/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนสิโรธรส สาย 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 26 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(นางสาวพรพรรณ ห้วยห่อ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็อพ ทะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce and Industry





ที่ ยล. 000982

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000982

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเสดิน สุขมะแอ) ประธานกรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภีรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce



ป1 (ทพ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน
 - ดอผลของทรัพย์สินนั้น
 - (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
 - (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าตางในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
 - (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น
- โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสืบทอดเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน
- ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 - (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชย์กรรม

- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง บาล์ม น้ำมัน
- ปอ ผ้าย นุ่น พืชไร่ ผลไม้แห้งที่จากสินค้าดังกล่าว ครึ่ง หนังสือ หนังสือนิตยสาร ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น
- หรือได้จากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา งามป่าสมุนไพรร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหาร
- สด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช
- อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้ายทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายย้อมยัด เส้นใยโนลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม
- เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหมัก รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเสถียรภาพ
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเค้นกัท เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ
- เครื่องพอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหุงต้มไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น
- เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
- เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์(นายระเด่น สละมะแอ)
- และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบลม
- เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ
- (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง.....กรรมการ
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางทันตกรรม (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้างกรมการ
- ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม (นายนาอึฟ หนะมี)
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ
- และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ (ลงชื่อ).....พยาน
- เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)
- (ลงชื่อ).....พยาน


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประธานกรรมการ

(นายนาอึฟ หนะมี)

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 26 ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการรับเหมานำก่อสร้างอาคาร, อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัยสถานที่ราชการ, ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(24) ประกอบกิจการค้าหิน ดิน ทราย ขอรรับสันปทาถนนลูกรัง

(25) ประกอบกิจการจำหน่าย เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด รวมทั้งชิ้นส่วน อะไหล่ ทุกชนิด

(26) ประกอบกิจการรับเหมาคิดค้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ อาคาร สำนักงาน คิดค้ำระบบทีวีและงานดาวเทียมสำหรับอาคาร สำนักงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาประธานกรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจัดการ

(นายนาอ็ฟ หะมี)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ทะเบียนเลขที่ 0953557000143



แบบ ทค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ยะลาผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 ร้องนายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

.....ประธานกรรมการ


ออกให้ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ).....

(นายนาอึฟ ทะมิ)

ผู้รับจ้าง

กรรมการ



(นายสุดใจ ทองแก้ว)

นายทะเบียน

.....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

.....

พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

e-GP 03-0102

วันที่แจ้งลงทะเบียน 06/09/2559

แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

วันที่อนุมัติ 07/09/2559

ลำดับการลงทะเบียน M-2559-037777

วันที่เริ่มใช้งาน 07/09/2559

สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0953557000143)

ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล

2. ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขง

ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) Subsungai

3. ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 50

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน สีโรรสสาย 2

ตำบล/แขวง สะเตง

อำเภอ/เขต เมืองยะลา

จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95000

โทรศัพท์ 0807099783

อีเมล dekfuda@gmail.com

4. กรณีบุคคลธรรมดา

(เลขประจำตัวประชาชน -)

วัน/เดือน/ปีเกิด

สัญชาติ ไทย

5. กรณีนิติบุคคล

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953557000143

วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/03/2557

จดทะเบียนที่

ทุน

(1) เงินทุนจดทะเบียน

1000000.00 (บาท)

6. ประเภทของการประกอบกิจการ

ประเภทกิจการ

ประเภทสินค้าและหรือบริการ

ผลิต

วัสดุครุภัณฑ์

ส่งออก

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ขายส่ง

จ้างก่อสร้าง

ขายปลีก

จ้างเหมา

ให้บริการ

เช่า

จ้างที่ปรึกษา

จ้างออกแบบและควบคุม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดๆอันเป็นการลวงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสารการเสนอราคา กับหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป สำหรับการจัดซื้อ

จัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้เสนอขอจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดจ้างมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท และแก้ไข...ผู้รับจ้าง

เพิ่มเติมที่กำหนดให้ผู้ที่เข้าเป็นคู่สัญญา กับ หน่วยงานภาครัฐที่สัญญา มีมูลค่าตามจำนวนเงินดังกล่าวต้องลงทะเบียน (นายนาอียัพ หนึ่ง)

พิมพ์เมื่อวันที่ 12/07/2566 เวลา 08:27:37 น รหัส atd.vic

(ลงชื่อ).....พยาน

ประธานกรรมการ (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

กรรมการ (ลงชื่อ).....พยาน

กรรมการ (นางสาวธนพร ปานเกิด)



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00303 64 4
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย นานีฟ หะมี

Name Mr. Naif

Last name Hami

เกิดวันที่ 22 ม.ค. 2535

Date of Birth 22 Jan. 1992

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 138 หมู่ที่ 3 ต.บาสล

อ.รามัน จ.ยะลา

30 ธ.ค. 2562

วันออกบัตร

30 Dec. 2019

Date of Issue

(นายธานีฟ หะมี)
เจ้าพนักงานอำนวยการ

21 ม.ค. 2571

วันบัตรหมดอายุ

21 Jan. 2028

Date of Expiry



9501-02-12301149

.....ประธานกรรมการ
นายธานีฟ หะมี
(ลงชื่อ).....กรรมการ.....ผู้ว่าจ้าง
.....(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธานีฟ หะมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรณพร ปานเกิด)

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



กรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 - 9538 - 87000 - 14 - 3

ชื่อผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพัฒน์สง

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพัฒน์สง

เป็น สำนักงานใหญ่ สาขาที่

ตั้งอยู่ อาคาร

ห้องเลขที่

(ลงชื่อ) ชั้นที่

หมู่ที่

เลขที่ 50

(นายระเด่น สมะแสง)

หมู่ที่ ตรอก/ซอย

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายก อบจ. ยะลา 2
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ตำบล/แขวง ศบ.ตง

อำเภอ/เขต เมืองยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95000

โทรศัพท์ (หมายเลขพื้นที่)

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 31 กรกฎาคม 2562

(ลงชื่อ) พยาช

ออกให้เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒

ผู้ออกทะเบียน (นางสาววิภาดา ดิโนมสง)

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

ตำแหน่ง สรรพากรพื้นที่ยะลา

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ผนวก.....1.....มีหน้า.....1.....ถึง.....?

จำนวน.....1.....ฉบับ
ผนวก.....1.....หน้า.....1.....

ป้ายประชาสัมพันธ์

ดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ ๒ 25 ซม. สีขาว
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...00148/2569.....
หรือสื่ออื่นตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....

2.40 เมตร



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

ชื่องาน : จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพรุ หมู่ที่ 3 - บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย ที่อยู่ 50 ถนนสิโรธร สาย 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นายนาอ๊าฟ หนะมิ โทร. 080-7111585

ระยะเวลา : เริ่มต้นสัญญา 24 กุมภาพันธ์ 2569 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 21 กันยายน 2569 รวมเป็นระยะเวลา 210 วัน

ค่าก่อสร้าง : 2,350,000 บาท

ผู้ควบคุมงานผู้ว่าจ้าง : 1. นายอำมรินทร์ ตาละ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน 2. นายณัฐกร เจ๊ะชู ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทร. 073370-3625

ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง : 1. นายอำมรินทร์ เบ็ญอะฮ์หมัด ตำแหน่ง วิศวกรกรมโยธา 2. นายมุฮัมมัดอาคิบ คาเร็ง ตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง โทร. 0975-5791396

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

1.20 เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ๊าฟ หนะมิ)
ให้ดำเนินการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวง)

๐๔๓๓.๔/ว ๖๔๐๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ” (ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

หมายเหตุ : 1. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่มั่นคงแข็งแรง ป้องกันแผ่นป้ายลัมให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่ติดตั้งแผ่นป้าย 2. ข้อความ “ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ” กรณีแหล่งที่มาของงบประมาณในการก่อสร้างมาจากแหล่งอื่น ให้ปรับเนื้อหาข้อความให้สอดคล้องกับแหล่งที่มาของงบประมาณในการก่อสร้างนั้น 3. กรณีสภาพพื้นที่งานก่อสร้างมีพื้นที่จำกัด หรือไม่เหมาะสมต่อการติดตั้งป้ายแบบตั้งพื้น สามารถปรับแบบติดตั้งป้ายแบบติดพื้นตามแบบที่แนบมาได้ 4. ขนาดแผ่นป้าย ข้อความ และตัวอักษร สามารถปรับเปลี่ยนขนาดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 5. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรูปแบบป้ายงานก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการติดตั้งป้าย

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่....00148/2569.....

ผนวก.....1.....หน้า.....2.....

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านพรุ - บ้านโต๊ะพราน (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

บ้านพรุ หมู่ที่ 3 - บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (นายระเด่น สมะแอ)

ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตร.ม.
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รวมความยาว 0.480 กิโลเมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ / กองช่าง

คึกาน่า
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00148/2569.....

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 26 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลวงท้องถิ่น ได้ให้อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ดำเนินการกำหนด มาตรฐานและลักษณะของหลวงและงานทาง ประกอบแผนกการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 26 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลวงท้องถิ่น ได้กำหนดภารกิจให้กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษา แนะนำทางวิชาการ ทั้งได้กำหนดหลักข้อบังคับ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการให้บริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐานงานทาง เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยให้จัดทำมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นคู่มือปฏิบัติงานสำหรับงานทางและก่อสร้างทางวิชาการ เป็นแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีการรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานและนำแบบมาตรฐานมาประยุกต์โดยคำนึงและให้ความสำคัญองแบบ เงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมตรงกับสภาพงานก่อสร้างที่ถูกติดตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะ อันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านพยุ หมู่ที่ 3 - บ้านโคกพราน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าอาน อำเภอขามเฒ่า จังหวัดยะลา ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตร.ม. จำนวน 1 โครงการ

รายการทั่วไป

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่าง ๆ ให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดี ใช้งานได้จริงและคุ้มค่า โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ
 - แจ้งขอรับปฏิบัติงาน
 - ส่งแผนการปฏิบัติงาน
 - ส่งข้อมูลจากผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
 - ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด วัสดุ และ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ส่วนที่ ๓ กค. (กวจ) 0405.2/ว.๒๑ ลว. 18 ก.พ. 2564
 ให้้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการ
- วัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในโครงการฯ ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในโครงการฯ ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในโครงการฯ ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างยังคงรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้าง ด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
- ค่าระดับและหมู่หลักฐานตามแบบที่กำหนด (บม.) เป็นค่าระดับและหมู่ที่ใช้เฉพาะในโครงการฯ เท่านั้น
- เขตทางขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
- งานตัดได้แก่ งานตัดดิน , งานตัดหิน , งานตัดหินแข็งและงานตัดอื่น ๆ
- รถขนส่งวัสดุทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
- ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานช่างของกรมทางหลวงชนบท (มทช.) เฉพาะในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดให้ใช้
- ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน
- ค่าการอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น
- ข้อ คสล. ให้ใช้เต็มความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในโครงการก่อสร้าง
- ให้แนบดินเดิม และ/หรือ ร่องน้ำเดิมบริเวณปลายท่อที่ลงข้าง เพื่อให้น้ำสามารถระบายผ่านท่อได้โดยสะดวก
- จำนวนท่อในแต่ละแถว ตำแหน่งวางวางท่อและค่าระดับหน้าเข้า - ออก อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสามารถระบายน้ำได้ดี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

รายการแบบ	แบบเลขที่	แผ่นที่
ใบประทวน		1
คำนำ , วัตถุประสงค์ , ล่าารบัญญัติแบบและรายการทั่วไป		2
แผนที่ผังชัย		3
บัญชีปริมาณงาน		4
รูปตัดและผังโครงร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคุณสมบัติวัสดุ		5
แผนป้ายแนวดังรายละเอียดงานก่อสร้าง		6

- ตำแหน่งก่อสร้างที่ตลอดเหลี่ยม เครื่องหมายจราจร รางระบายน้ำ และบ่อพักอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ตำแหน่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการปรับแต่งตามข้อ 14, 15 และ 16 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณยอดรวมทั้งสิ้นของและรายการน้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
- รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาชีพที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ
- ผู้รับจ้างจะต้องหามาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าอันตรายนั้นจะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมที่กระทำหรือสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตราการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง ซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่ประกาศใช้บังคับในภายหน้าด้วย
- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างทำการก่อสร้างตลอดระยะเวลา งานจนแล้วเสร็จ
- มีติดางา มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่นไว้โดยนัย.....ผู้ว่าจ้าง
- ในกรณีที่ทำเป็นและให้เหมาะสมกับสภาพหน้า อาจจะปรับตำแหน่งและมุมเอียง (SKEW ANGLE) ของแนวท่อลอดเหลี่ยม , ท่อลอดกลม , รางระบายน้ำ จากแบบก่อสร้าง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน (นายระเด่น สิมะเออ)
- ถ้าบริเวณก่อสร้าง มีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ข้างเคียงหรือมีสิ่งกีดขวางอื่น ๆ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขออนุญาตและขออนุญาตจากเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้างข้างเคียงหรือมีสิ่งกีดขวางอื่น ๆ ให้ดำเนินการขออนุญาตก่อนดำเนินการก่อสร้าง

นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

พัสดุประเภทวัสดุหรือกลุ่มที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

- วัสดุหรือกลุ่มที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
- เหล็กที่ใช้ในโครงการก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดมูลค่า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป (ลงชื่อ).....พยาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
(สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา)			
เลขาฯ	ดำรง	นายจะชาย หนึ่งและ	เห็นชอบ
หัวหน้าโครงการ (ลงชื่อ)	ดำรง	นายสมิธ ศาละ	2 PM
	ออกแบบ	นายเกษม ศาละ	
แบบและผัง	เขียนแบบ (เขียนแบบ)	นายวิศุทธิ์ ใจดี	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	วิศวกร	นายสุมาท บุญ	
		นายอิศราณ ใจดี	
แบบเลขที่ ฉบับที่ 2	หน้า 2	นายณัฐกร ใจดี	อนุมัติ
แก้ไขครั้งที่	หน้า 2	นายณัฐกร ใจดี	นายณัฐกร ใจดี

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...00148/2569

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569

จุดเริ่มต้นโครงการ

กม.ที่ 0+480


N°06:55015 ; E°101.47990



แผนที่ประเทศไทย

สัญลักษณ์

- ทางหลวงแผ่นดิน(กรมทางหลวง)
- ทางโครงการ ที่จะทำการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท)
- แม่น้ำ , ลำคลอง
- ท้องน้ำ , ห้วย
- หมู่บ้าน
- วัด , คูหา , โรงเรียน
- ที่ตั้ง จังหวัด , อำเภอ

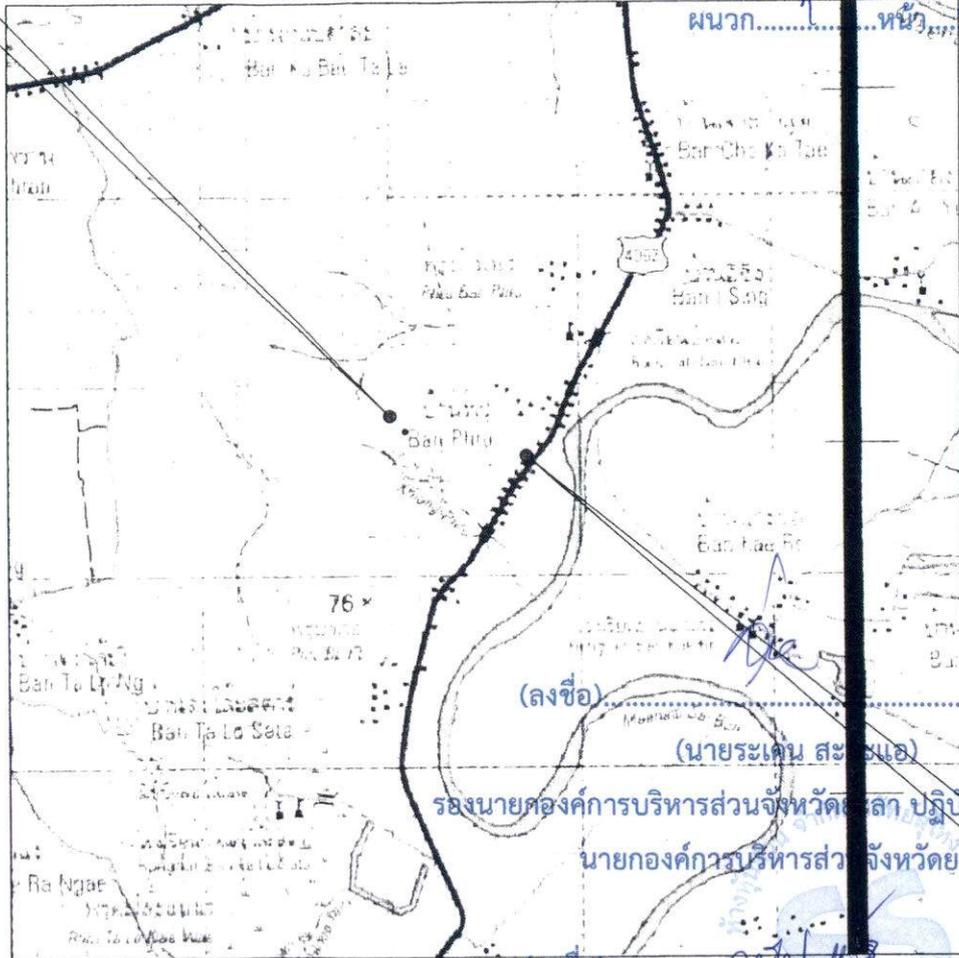

ผนวก.....1 หน้า.....4

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
จุดเริ่มต้นโครงการ
กม.ที่ 0+000
N 06.548682 , E 101.483862



แผนที่ลงเขป (นายนาอ็ฟ หะมี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
(นางสาวอรอนพร ปานกิติ)				
เดินทางโดย	สำรวจ	นายจ๊ะฮาน ทะย๊ะและ	เห็นชอบ	
(ลงชื่อ) นายโคทราน	สำรวจ	นายออลัด ตาละ		
แบบแปลน	แบบแปลน	นายออลีน ตาละ		
แบบแปลน	แบบแปลน	นายนิศุล เจ๊ะกู	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
แบบแปลน	แบบแปลน	นายอูสมาน ยูนี	อนุมัติ	
แบบแปลน	แบบแปลน	นายสิริพร เจ๊ะโต		
แบบแปลน	แบบแปลน	นายออลกาซ ยีนิบ		
แบบแปลน	แบบแปลน	นายสมบูรณ์ เสนะพงษ์	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...00148/2569.....

ลงวันที่..... 23 กุมภาพันธ์ 2569

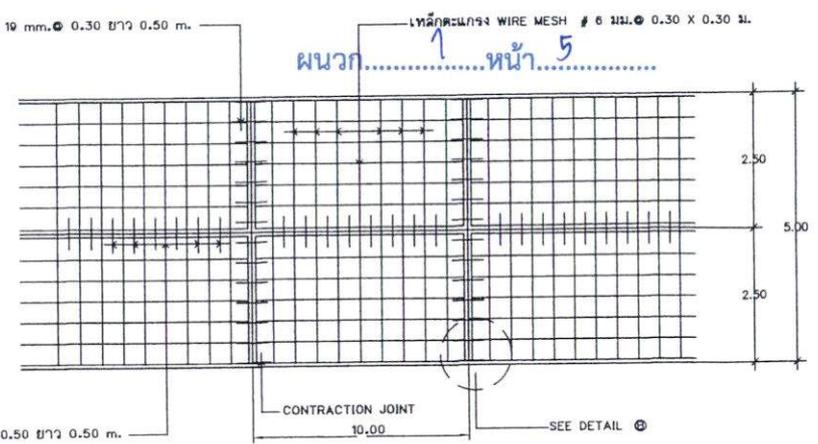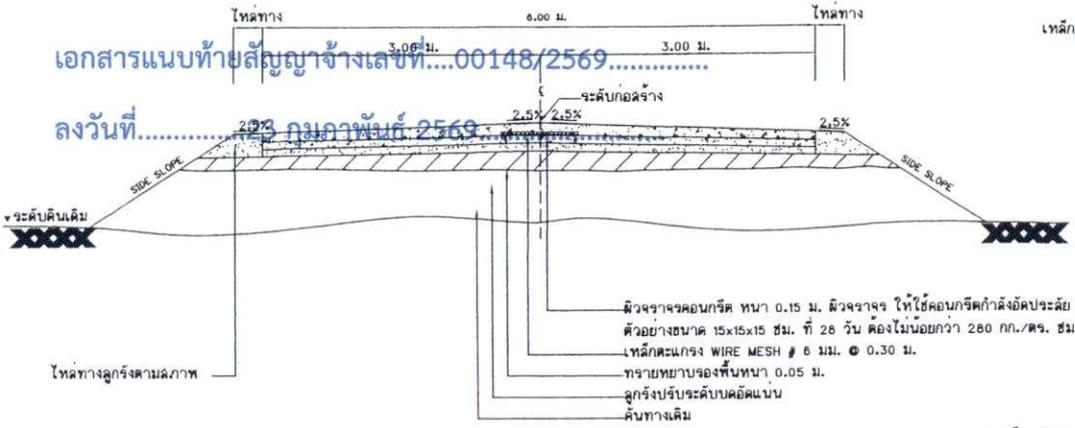

รูปตัดแลดูโครงลวดวางนคอนกรีตเสริมเหล็กและคุณลุ่มบิติวัดดู

แปลนแลดูการเสริมเหล็กถนน ค.ล.ล.

บัญชีปริมาณงาน

ลำดับ	รายการแบบ	หน่วย	ปริมาณงาน	อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	1,160.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านที่ 1 อปท.
2	งานถางป่าและขุดดิน ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	4,000.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านที่ 1 อปท.
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม	1,200.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านที่ 1 อปท.
4	งานดินถมคันทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	226.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านที่ 1 อปท.
5	งานรองพื้นทางทางลูกรัง บดอัดแน่น ทน 20 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	324.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านที่ 1 อปท.
6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	75.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านที่ 1 อปท.
7	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม	2,400.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านที่ 1 อปท.
8	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	235.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านที่ 1 อปท.
9	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	480.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านที่ 1 อปท.
10	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑0.80 ม. ยื่น 3	ม.	20.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านที่ 1 อปท.
	งานเปิดตัดดี			
11	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) (ทางเชื่อม)	ตร.ม	500.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านที่ 1 อปท.
12	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	45.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านที่ 1 อปท.
13	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	100.00	แบบมาตรฐานงานทางด้านที่ 1 อปท.

รายการก่อสร้างถนน

- การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด
- EXPANSION JOINT จะใช้เฉพาะกรณีที่มีเชื่อมต่อกับโครงสร้างที่มีฐานจากมันฉนวนหรือบริเวณทางแยกที่เป็นถนนคอนกรีต
- วัสดุขยายรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน (CONCRETE JOINT SEALER HOT - Poured ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
- วัสดุแอสตัลต์อุดรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTENDING JOINT FILLER) ใช้กระจายตามข้อต่ออย่างสม่ำเสมอตาม มอก.1041
- ลวดม้วนคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 7 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร. ซม. **ผู้ว่าจ้าง**
- เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.20 (ASTM A601) **(นายระเด่น สมะแอ)**
- ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก.737) ตามตารางที่ 1. แทน BAR MESH ได้ โดยให้ผู้จ้างแลดูใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตและรองนายกรัฐมนตรีกรมการช่างก่อสร้างให้มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ และให้ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือไปจากตารางที่แนบมาได้แก่เหล็กตะแกรง (STEEL AREA) ที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่าที่จะระบุไว้ในตารางที่ 1
- มีดีคาง ที่แลดูไว้เป็นเมตร มักจะระบุไว้เป็นข้ออื่น
- การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ทำโดยลากเบรจกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง โดยร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
- การตีเส้นจราจร ให้ตีเฉพาะเส้นแบ่งทิศทางจราจร (CENTER LINE) โดยใช้เทอร์โมพลาสติก ตาม มอก.542
- ระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๕ ปี นับจากวันที่เริ่มก่อสร้าง ปริมาณจราจร (ADT) 200 คัน/วัน **ผู้ว่าจ้าง**
- การบดคอนกรีต เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะต้องบดอยู่ไม่น้อยกว่า 7 วัน **(นายนาอ์ฟ หะมี)**

หมายเหตุ

- จำนวนที่อื่นแต่ละแถวและตำแหน่งในการวางที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมสภาพพื้นที่อันอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ขอรวมต้องเท่าเดิม
- ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และบ่อที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ไหล่ทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
- งานตัด ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหิน, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอื่นๆ
- อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางด้านที่ 1 อปท. หรือกรมการช่างก่อสร้าง

ตารางที่ 1. แลดูขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

BAR MESH (Fe - 1,200 Kcc) (เหล็กเส้นกรม SR 24)		WIRED MESH (Fe - 2,750 Kcc) (เหล็กเชื่อมตะแกรงสำเร็จรูป)	
DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม. /ม.)	DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม. /ม.)
๑ 6 มม. @ 0.40 ม.	0.710	๑ 4 มม. @ 0.30 ม.	0.419
๑ 9 มม. @ 0.30 ม.	2.12	๑ 6 มม. @ 0.30 ม.	0.940


(ลงชื่อ).....พยาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


แลดูค่าจ้าง	สำรวจ	นายระเด่น สมะแอ	เห็นชอบ
(ลงชื่อ).....พยาน	สำรวจ	นายระเด่น สมะแอ	
	ออกแบบ	นายณัฐ งาม	
แบบแลดู	(นางสมณพร ปานพิทักษ์)	นายณัฐ งาม	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
บัญชีปริมาณงาน	เขียนแบบ	นายณัฐ งาม	อนุมัติ
	วิศวกร	นายณัฐ งาม	
แบบเสร็จ	หน้าที่ยื่น	นายณัฐ งาม	
แก้ไขครั้งที่	หน้าที่ยื่น	นายณัฐ งาม	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...00148/2569.....


ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....




CONTRACTION JOINT



LONGITUDINAL JOINT



CONSTRUCTION JOINT



แปลนไม้กวาด


รูปคานหน้า

รูปคานข้าง

แบบขยายไม้กวาดลากผิวพื้น ค.ล.ล.

เหล็ก DOWEL BARS RB 19 mm.Ø 0.30 ยาว 0.50 m.

เหล็กคานกรง WIRE MESH # 6 มม.Ø 0.30 X 0.30 M.

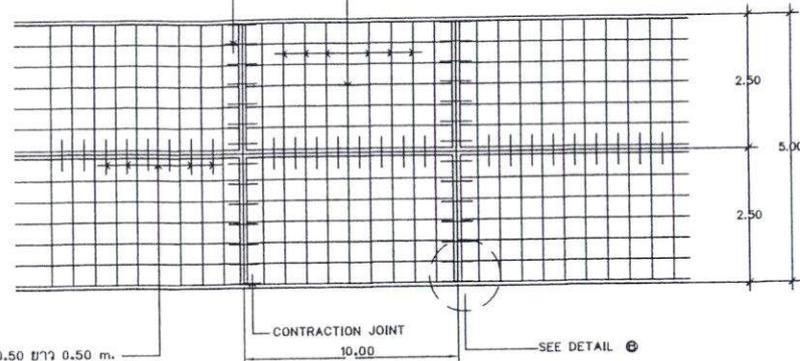

ผนวก.....1.....หน้า.....6.....

เหล็ก TIE BARS DB 12 mm.Ø 0.50 ยาว 0.50 m.

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ล.ล.

ข้อกำหนดรายการประกอบแบบก่อสร้าง

- ยกเลิกข้อความรายการประกอบแบบ ข้อที่ 1 แบบเลขที่ ทด-2-202 มีจางจอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัว อย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 325 กก./ซม. ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม.
- ยกเลิกแผ่นพลาสติก CONTRACTION JOIN, CONSTRUCTION JOIN
- MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้ตามมาตรฐาน AASHTO M.175-60 (1974) , ASTM D. 190-74
- JOIN FILLER (ลงชื่อ) AASHTO M. 153-70 , ASTM. 1753-67.(1973).....ผู้ว่าจ้าง
- ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้ WIRE MESH (มอก.) แทนเหล็กเสริมตามตารางที่ 1 ได้โดยผู้จ้างจะต้องแจ้งใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตให้
ให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการและในกรณีที่มีการต่อทับ WIRE MESH จะยึดเกาะต่อทับจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม. ทั้งนี้พื้นที่หน้าตัด
ของเหล็กเสริมที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า MINIMUM STEEL AREA OF WIRE MESH ที่ขอมไว้ในตารางที่ 1
- เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กเสริมมาตรฐาน มอก.20 และ มอก.24
- วัสดุที่ไม่ได้กำหนดในแบบให้ใช้คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานงานพื้นทางชนบท
- มีติเป็น "เมตร" ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
- ขอยต่อในคอนกรีตเว้น EXPANSION JOINT ให้ทำรอยต่อด้วยเครื่องขยายคอนกรีต
- การเทพื้นคอนกรีต (ลงชื่อ) CONCRETE PAVER โดยช่างผู้ทำจะเป็นผู้ควบคุมการตีด้วยแรงคนในพื้นที่ที่มีพื้นที่ในลักษณะช่วงเว้นไว้วาดคิด
ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
- การทำผิวหน้าให้หยาบ ให้ทำโดยลากเบรจแล้วปล่อยให้แห้งก่อนปิดด้านหนึ่งอย่างเร็วแล้ว และให้พร้อมกันโดยช่องที่
เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.


(ลงชื่อ)..... พยาน

(องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)			
เดินทางโดย	สำรวจ	นายเจสสัน หงษ์และ	เห็นชอบ
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ	สำรวจ	นายอดิธ ศาจร	L 00
	ออกแบบ	นายชาน ศาจร	
แบบแสดง	(นาง).....	นายนิรุจ เจษฎ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
รูปแสดงโครงสร้าง	เขียนแบบ	นายอุสมาน มุญ	อนุมัติ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	วิศวกร	นายอิสรหามัน เจ๊ะเด	ME
แบบเลขที่ อบจ.ยล	แผ่นที่ 5	นายเอกราช ยี่สิ้น	
แก้ไขครั้งที่	แสดงค่าวางออกแบบ	นายสมบุญ เลนพงษ์	นายอำนวยการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐148/2569
 2. ความหมายของคำที่ใช้ในสัญญา
 หรือใช้ในความหมายอื่นของและหน่วยงาน

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....

ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สูง 10 ซม สีขาว
 สถานที่ติดตั้งและโทรศัพท์ สูง 5 ซม สีขาว
 สันวัก..... 1หน้า..... 7.....

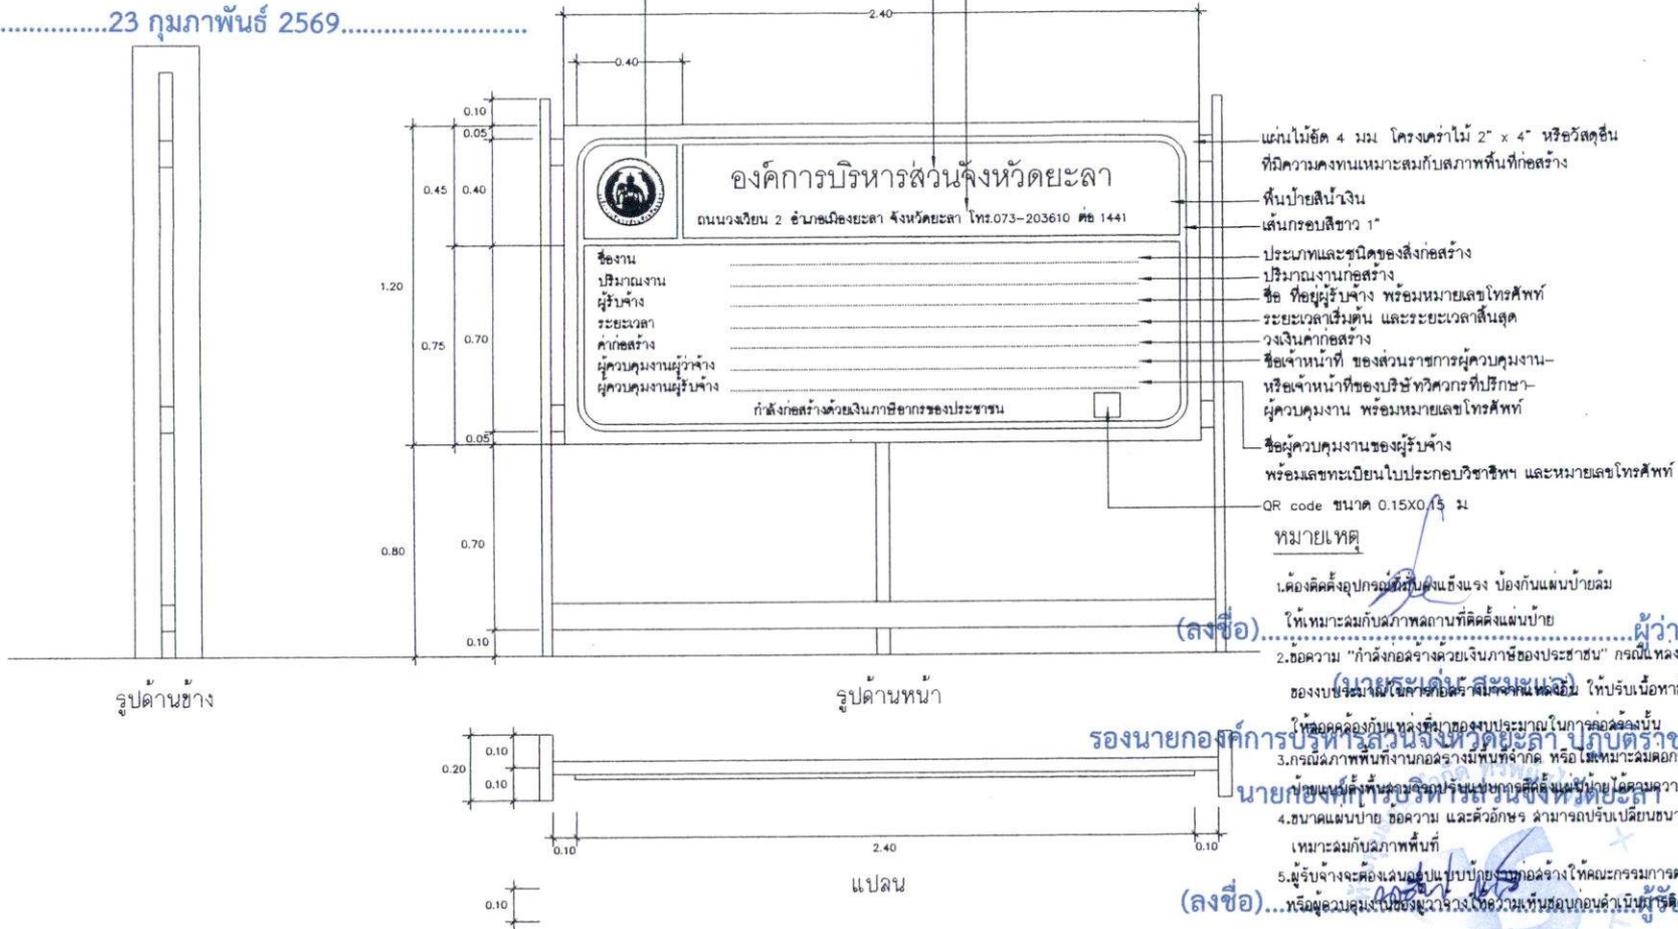

- แผ่นไม้ยึด 4 มม โครงคร่าไม้ 2" x 4" หรือวัสดุอื่นที่มีความคงทนเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง
- พื้นป้ายสีน้ำเงิน
- เส้นกรอบสีขาว 1"
- ประเภทและชนิดของสีที่ใช้ก่อสร้าง
- บริเวณงานก่อสร้าง
- ชื่อ ที่อยู่ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด
- วงเงินค่าก่อสร้าง
- ชื่อเจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน-หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท วิศวกรที่ปรึกษา-ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ชื่อผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง พร้อมเลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพฯ และหมายเลขโทรศัพท์
- QR code ขนาด 0.15X0.15 ม

หมายเหตุ
 1. เคื่องคิดตั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งแข็งแรง ป้องกันแผ่นป้ายล้ม
 2. ให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่ติดตั้งแผ่นป้าย
 2.ข้อความ "กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน" กรณีในหลังที่มาของงบประมาณใช้การก่อสร้างที่ดำเนินการให้รับเนื้อหาข้อความ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองตรี ประจักษ์ วัฒนศิริ
 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

รายละเอียดป้าย

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม หรือ ไม้เนื้อแข็ง
- พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
- ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 ม.
- โครงคร่าไม้ขนาด 2 x 4
- ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร
- มิติเป็นเมตรนอกจากรูปเป็นอย่างอื่น
- ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
เส้นทางสาย (ลงชื่อ) ดำรง	ดำรง	ดำรง	ดำรง
บ้านทุ่ง - บ้านโคกพรหม	ดำรง	ดำรง	ดำรง
แบบแปลน	ดำรง	ดำรง	ดำรง
แบบแปลนรายละเอียดงานก่อสร้าง (ลงชื่อ) ดำรง	ดำรง	ดำรง	ดำรง
แบบแปลนที่ ๐๖๗๘	ดำรง	ดำรง	ดำรง
นักโครงสร้าง	ดำรง	ดำรง	ดำรง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00148/2569.....

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพรุ หมู่ที่ ๓ - บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๕.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๘๗,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานทาง

- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ
- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม แล้วเสร็จ
- งานถางป่าและขุดต่อ แล้วเสร็จ
- งานดินถมคันทาง แล้วเสร็จ
- งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ แล้วเสร็จ
- งานวางท่อกลม คสล. แล้วเสร็จ
- งานรองพื้นทางลูกรัง แล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณงาน ๒๐.๐๐ ลบ.ม.
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ปริมาณงาน ๔๐๐.๐๐ ตร.ม.
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint)
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๓.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานทาง

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณงาน ๒๕.๐๐ ลบ.ม.ผู้ว่าจ้าง
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ปริมาณงาน ๑,๕๐๐ (ตามต้นแบบ)
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint)
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....

-๒-

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๒.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๗๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานทาง

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ แล้วเสร็จ
- งานทางเชื่อมผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint) แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint) แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง ทางเชื่อม (Contraction joint) แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อตามยาว ทางเชื่อม (longitudinal joint) แล้วเสร็จ

งานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของโครงการจนแล้วเสร็จเรียบร้อย

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญาพร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00148/2569 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

จำนวน 3 1 ฉบับ
หน้า 3 1 หน้า

จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพรุ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : ถนน คสล. สายบ้านพรุ หมู่ที่ 3 - บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโข

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
1.1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)				
1.1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	1,160.000	ตร.ม.	102.25	118,607.39
1.2	งานดิน (EARTHWORK)				
1.2.1	งานถางป่าและขุดตอ				
1.2.1.1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	4,000.000	ตร.ม.	2.60	10,408.37
1.2.2	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)				
1.2.2.1	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	226.000	ลบ.ม.	221.63	50,087.46
1.3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)				
1.3.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	1,200.000	ตร.ม.	16.73	20,070.80
	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง				
	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
1.3.2	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)				
	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง				
	(นายนาอ็พ พะมิ)				
1.3.2.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	324.000	ลบ.ม.	283.89	91,979.78
	(ลงชื่อ).....พยาน				
	(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)				
1.3.3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)				
	(ลงชื่อ).....พยาน				
	(นางสาวธนพร ปานเกิด)				
1.3.3.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	75.000	ลบ.ม.	765.56	57,417.32

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00148/2569 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน.....¹.....ฉบับ
 ผนวก.....³.....หน้า.....².....

จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพรุ หมู่ที่ 3 - บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : ถนน คสล. สายบ้านพรุ หมู่ที่ 3 - บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1.4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)				
1.4.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)				
1.4.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	2,400.000	ตร.ม.	628.33	1,507,998.95
1.4.1.2	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	235.000	เมตร	223.69	52,567.89
1.4.1.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	480.000	เมตร	92.00	44,159.23
1.5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)				
1.5.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	20.000	ม.	3,157.45	63,149.01
2	งานทางเชื่อม				
2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)				
2.1.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)				
2.1.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	500.000	ตร.ม.	628.33	314,166.45
2.1.1.2	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	45.000	เมตร	223.69	10,066.19
2.1.1.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	100.000	เมตร	92.00	9,321.15
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)					2,350,000.00

หมายเหตุ เพิ่มอีก 121.31 บาท ในรายการ 2.1.1.3

ลงชื่อ^{ทรัพย์สุโขทัย}.....(ผู้เสนอราคา)
 (นายนาอ็พ หะมิ)

(ลงชื่อ).....^{ปิยน}.....พยาน
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุโขทัย

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...00148/2569.....

วันที่..... 23 กุมภาพันธ์ 2569..... แบบใบเสนอราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า... นพ. ทรัพย์ (ส) น... อยู่เลขที่ 50 หมู่ที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ..... จังหวัด..... โทรศัพท์.....

ผู้ลงนามข้างทำยนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51009/... ลงวันที่..... โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน..... ข้าราชการส่วนท้องถิ่น.....

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้แนบท้ายใบเสนอราคาดัง นี้ เป็นเงินทั้งสิ้น..... บาท (...)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน..... บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา..... วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ ระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดย ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน..... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ใน หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามทีระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาดังนี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ) ประธานกรรมการ
(นางสาวธนพร ปานเกิด) กรรมการ

นพ. ทรัพย์ (ส) น

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....

-2-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รับผิดชอบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่...23...เดือน ' พ.ศ. 25 69

(ลงชื่อ)..... กฤษณ์ น.ธ.....
(นายชวสิทธิ์ หนี)

ตำแหน่ง..... ผู้ว่าจ้าง
ประทับตรา(ตัวเต็ม) สมะแอะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... กฤษณ์ น.ธ..... ผู้รับจ้าง
(นายชวสิทธิ์ หนี)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... พิณนีย์ พันธุ์งาม..... กรรมการ
(นางสาวกิริรินทร์ พงษ์เทศ) กรรมการ

(ลงชื่อ)..... สุวิ..... พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

บันทึกการต่อรองราคา

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....
การจ้างก่อสร้างถนน-คสล.สายบ้านพรุ หมู่ที่ ๓ - บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ ๑

ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๑๓๕-๑๔๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคา สำหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพรุ หมู่ที่ ๓ - บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๒,๕๒๔,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๒,๓๖๓,๕๘๗.๔๓ บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์) จำนวน ๑๔ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาจากคุณสมบัติ และพิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

- ๑. หจก. ทรัพย์สุโขทัย
- ๒. หจก. ผีเสื้อและดอกไม้
- ๓. หจก. เอ.เอ.เอ.บริการงานก่อสร้าง

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคา ทั้ง ๓ ราย มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนด และไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดย หจก. ทรัพย์สุโขทัย ยื่นเสนอราคา เป็นเงิน ๒,๓๕๖,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง และต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อรองราคาให้ทางฯ ลดวงเงินลงอีก ทางทางฯ ยินดีลดวงเงินให้อีก จำนวนเงิน ๖,๐๐๐.- บาท (หกพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๒,๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดทุกประการ โดยยื่นราคา ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๒๑๐ วัน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคาผู้รับจ้าง

(นายนาอิม นามอิฟ หะมี)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนอมน สันตวัฒน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุสมาน ยูนิ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่....00148/2569.....

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด
ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือ
บวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน
การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเชื่อม คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร
เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุม
คุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้
ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเชื่อมชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED
MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

๒.๒ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม
ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมตด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็ก
เดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึง
แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

๒.๓ งานทาง งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAI COATผู้ว่าจ้าง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

๒.๔ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีต
เสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก งานตาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก
(MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

/ดัชนีราคา...

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....

-๒-

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00148/2569.....

จำนวน.....๑.....ฉบับ
ผนวก.....๒.....หน้า.....๑.....

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....

หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่.....อบจ.ยะลา.....

วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....นายอำมีน เบ็ญอะฮ์หมัด.....อายุ 29 ปี

เชื้อชาติ.....ไทย.....สัญชาติ.....ไทย.....อยู่บ้านเลขที่ 22/5 หมู่ที่ 3 ถนน.....-

ตรอก/ซอย.....-.....ตำบล.....เปาะเล็ง.....อำเภอ.....เมืองยะลา.....จังหวัด.....ยะลา

หมายเลขโทรศัพท์.....093-579-1396.....สถานที่ทำงาน.....เมืองยะลา

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท.....วิศวกรรมควบคุม.....สาขา.....โยธา

แขนง.....-.....ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....ภย.78883

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด ถนน คสล. ... สายบ้านพร หมู่ที่ 3 - บ้านโคะพราน หมู่ที่ 1 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา จำนวน.....๑.....โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....วิศวกร
(...นายอำมีน เบ็ญอะฮ์หมัด...)

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.
(.....)
(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....(นายระเด่น สมะแอ)
.....พยาน
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(.....)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....ผู้รับจ้าง
(.....)
(.....)
(นายนาอ์ฟ หะมี)

คำเตือน

- ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)
- ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)
- หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)



ได้รับรองเป็นผู้ควบคุมงาน **โครงการก่อสร้าง ถนน คลอง 2 ชั้น สายบ้านพรุ หมู่ที่ 3 บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ 1 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา** ของ **กองทัพอากาศ** เท่านั้น



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ใช้รับรองเป็นผู้ควบคุมงาน
- บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ 3

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00518 89 6
ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อามีน เบ็ญอะฮ์หมัด
Name Mr. Amin
Last name Benahmad
เกิดวันที่ 11 ธ.ค. 2539
Date of Birth 11 Dec 1996
ที่อยู 255 หมู่ที่ 3 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.ยะลา
16 ธ.ค. 2566 อ.
19 ธ.ค. 2022 (นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด)
Date of Issue หน่วยงานออกบัตร

10 ธ.ค. 2574
วันหมดอายุ
10 Dec 2031
Date of Expiry

นายอามีน เบ็ญอะฮ์หมัด
ภย.78883
สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)..... 20 กุมภาพันธ์ 2569.....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ระเบียบแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00148/2569..... **ผนวก.....** **หน้า.....**

รหัสสถานศึกษา 1395016101
 จังหวัด **สุรินทร์** วันที่.....**23 กุมภาพันธ์ 2569**.....
 รหัสประจำตัว 63301210024
 ชื่อ - ชื่อสกุล นายมุขมัมมคอกาบ คารัง
 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม
 วัน เดือน ปีเกิด 4 มิถุนายน 2544
 เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00730 81 0
 ชื่อบิดา นายอัครอนิง คารัง
 ชื่อมารดา นางกมลริเยาะ นิแซ
 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
 สาขาวิชา โยธา
 สาขางาน โยธา

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา
 สถานศึกษาเดิม โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา
 จังหวัด ปัตตานี
 ระดับการศึกษาที่จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ปีการศึกษาที่จบ 2562
 เข้าศึกษาเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563
 หน่วยกิตที่รับโอน -
 หน่วยกิตที่เรียน 106
 หน่วยกิตที่ได้ 86
 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.30
 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ 11 มีนาคม 2565
 สำเร็จการศึกษาเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565



รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1					ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 3				
30000-1201	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	3	3.5	10.5	30121-2112	ระบบสุขาภิบาล	2	4.0	8.0
30000-1501	ชีวิตกับสังคมไทย	3	3.5	10.5		หน่วยกิตที่ได้ในภาค 5 หน่วยกิตสะสม 38			
30000-1602	การคิดอย่างเป็นระบบ	2	4.0	8.0		คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.70 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.43			
30001-1001	การบริหารงานคุณภาพในองค์กร	2	3.5	7.0	30000-1204	ภาษาอังกฤษโครงการ	1	2.5	2.5
30100-0101	กลศาสตร์วิศวกรรม	3	2.5	7.5	30000-1610	นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	1	3.5	3.5
30121-2002	คอนกรีตเทคโนโลยี	3	2.0	6.0	30001-2001	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ	3	4.0	12.0
30000-2001	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1		ผ.		30121-2001	การทดสอบวัสดุงานโยธา	3	3.0	9.0
30121-0001	กลศาสตร์โครงสร้าง	3	ผ.		30121-2004	การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์	3	2.0	6.0
30121-0002	วัสดุก่อสร้าง	3	ผ.		30121-2107	การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก	3	2.5	7.5
30121-0005	พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธา	3	ผ.		30121-2111	การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา	3	4.0	12.0
30121-0007	พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา	2	ผ.		30121-8502	โครงการ 1	2	3.5	7.0
หน่วยกิตที่ได้ในภาค 16 หน่วยกิตสะสม 16					30000-2003				
คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.09 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.09					กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3				
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2					หน่วยกิตที่ได้ในภาค 19 หน่วยกิตสะสม 57				
30000-1101	ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ	3	4.0	12.0	(ลงชื่อ).....	ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 4	ผู้ว่าจ้าง		
30000-1202	ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน	2	3.5	7.0	30000-1306	วิทยาการคอมพิวเตอร์	3	4.0	12.0
30000-1404	แคลคูลัส 1	3	4.0	12.0	30001-1052	กฎหมายและสัญญาเบื้องต้น	2	3.0	6.0
30100-0105	ความแข็งแรงของวัสดุ	3	3.0	9.0	30121-2005	การประมาณราคางานโยธา	3	4.0	12.0
30100-0301	ทฤษฎีโครงสร้าง	3	3.5	10.5	30121-2006	นายกองทัพอากาศ	3	2.5	7.5
30121-2003	ปฐพีกลศาสตร์	3	4.0	12.0	30121-2007	การสำรวจเส้นทาง	3	3.5	10.5
30000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2		ผ.		(ลงชื่อ).....	การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา	3	3.5	10.5
30121-0003	เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา	3	ผ.		30121-2103	วิศวกรรมการทาง	3	3.5	10.5
30121-0004	พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา	3	ผ.		(นายนาอ็ฟ หะมี)	ชลศาสตร์	3	2.0	6.0
30121-0006	พื้นฐานการสำรวจ	3	ผ.		30121-2105	โครงการ 2	2	2.5	5.0
หน่วยกิตที่ได้ในภาค 17 หน่วยกิตสะสม 33					(ลงชื่อ).....				
คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.67 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.39					30000-2004				
ปีการศึกษา 2563 ภาคฤดูร้อน					กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4				
30108-0002	การเขียนแบบก่อสร้าง	3	3.5	10.5	(นางเสกกี ภิรมิหาร)	หน่วยกิตที่ได้ในภาค 20 หน่วยกิตสะสม 82			
ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565					คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.20 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.29				

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565
 เหตุที่ออก สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(นางดวงกมล แก้วกัน)

หัวหน้างานทะเบียน

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นางสาวธนพร งามเกิด)

(นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู)

ผู้อำนวยการ

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เจ้าหน้าที่

นางสาวกมลรัตน์

นางสาวกมลรัตน์

นางสาวกมลรัตน์

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่....00148/2569.....

จำนวน.....1.....ฉบับ
ผนวก.....7.....หน้า.....1.....

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแเอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายนาอ๊าพ หะมิ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวอนพร ปานเกิด)

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้องอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแเอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....

ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ
รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
- ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ) (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

- ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนเหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

..... (นายนาอ็พ ทัมมิ)
..... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ผนวก.....๕ มีหน้า.....๑ ถึง.....๕

จำนวน.....๑ ฉบับ

ผนวก.....๕ หน้า.....๑

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00148/2569.....

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนาอ็ฟ หะมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานเรือโครงสร้างเดิม					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานฉาบทาง					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รายการ...	ตร.ม.				
					รวม	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...							

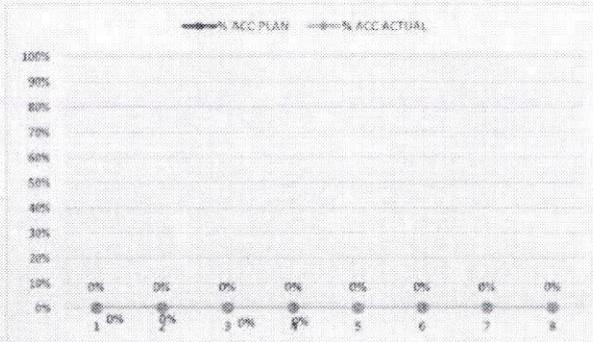

Money							
AccMoney							
% PLAN							
% ACC PLAN							
% ACC ACTUAL							
% ACC DIFF							
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF							

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สมะเอน)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายนาอ็พ ธรรมิ)
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)


- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานเรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้าง) (นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)
 - หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
 - Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
 - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากร้อยละของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉาบผิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
			รวม		3,040,000	100%

	1	2	3	4	5	6	7	8
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
	25	25	25	25				
		50	50					
				20	20	20	20	20
					25	25	25	25

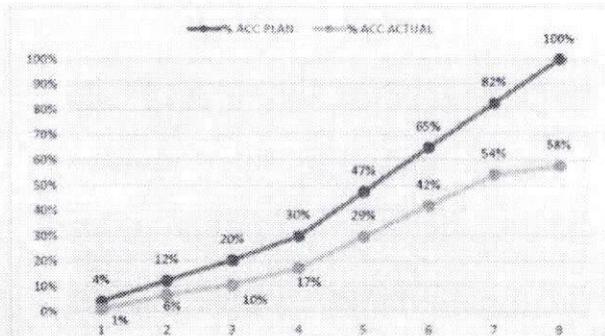

Money								
AccMoney								
(ลงชื่อ).....								ผู้ว่าจ้าง
% PLAN								(นายระเด่น สมะแอ)
% ACC PLAN								รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
% ACTUAL								นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
% PLAN/2								(นายนาอ็พ หะมี)
% PLAN/2 DIFF								

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเงินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเงินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 5 เดือน
 - 25 หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
 - Money มูลค่างานแต่ละรายการ ค่ารวมจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
 - % PLAN ร้อยละของแผนค่าเงินงาน ค่ารวมจากร้อยละของงานตามแผนค่าเงินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวสุนพร ปวานเกิด)


ลงวันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2569.....ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ระยะเวลาเงิน 1 ใน 2 ระยะเวลาเงิน 3 ใน 4 สิ้นสุดสัญญา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	
1	งานก่อสร้างเดิม	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
		a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานชีวทาง	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
		b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
		รวม				3,040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

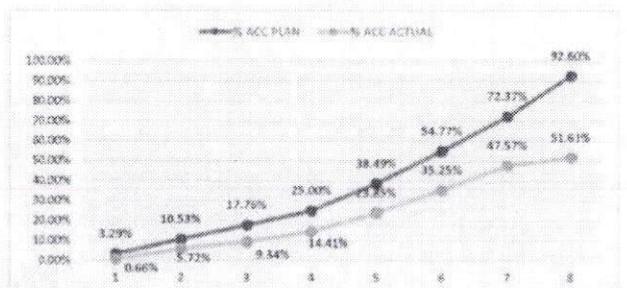

	เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money	100,000	220,000	220,000	220,000	10,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	16.89%	16.28%	17.69%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	(ลงชื่อ) 17.76%	25.00%	38.49%	54.77%	72.37%	92.60%
(นายระเด่น สะมะแอ)								
% ACTUAL	0.66%	5.07%	9.34%	14.41%	23.85%	35.25%	47.57%	92.60%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	23.85%	35.25%	47.57%	51.61%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	14.64%	19.52%	24.80%	40.99%

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวอิฟ หนึ่ง)
 (นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้าง)
 - หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (ในแต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
 - Money มูลค่างานแต่ละรายการ จำนวนจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
 - AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
 - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน จำนวนจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
 - % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
 - % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
 - % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
 - % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๓๖ /๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพรุ หมู่ที่ ๓ - บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพรุ หมู่ที่ ๓ - บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนน
คสล. สายบ้านพรุ หมู่ที่ ๓ - บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางดารุณี สองแก้ว

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

๒. นางสาวนิอัมณี สันตวไมตรี

กรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๓. นายอุสมาน ยูนี

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสมบุรณ์ เสนพงษ์

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายเอกราช ยี่เส้น

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๓. นายอสมิต ตาละ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายอามัน ตาละ

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. นายนันทรูล เจ๊ะซู

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
