

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๒๒๒ / ๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๔๑/๒๔ หมู่ ๑๐ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางสาวอีลฮาม เจะเต็ง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกูแบจือเนาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส็ง อำเภอเมืองยะลา - บ้านชะเมา หมู่ที่ ๕ ตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบจ.กำหนด) ณ ถนนสายบ้านกูแบจือเนาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส็ง อำเภอเมืองยะลา - บ้านชะเมา หมู่ที่ ๕ ตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา+บันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดปริมาณงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ

(นางสาวอีลฮาม เจะเต็ง)

๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพควบคุมงาน+หนังสือรับรองช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแบบป้าย+แบบแปลน จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันสัญญาของ บริษัท ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๑๐๐๐๖๘๕๑๓๓๐๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๑,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ๕.....(.....ห้า.....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง
(นางสาวอิลฮาม เจะแดง)
ENGINEERING

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๔๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕๙,๒๓๓.๖๔ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๒๕,๖๕๐.๒๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุ่มแจ้วเนิน หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา - บ้านชะเมา หมู่ที่ ๕ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๘,๓๔๙.๘๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดพันสามร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้างได้ทันที

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

ลงชื่อ




ผู้รับจ้าง

(นางสาวอีลฮาม เจะเต็ง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นางสาวอัสฮาม เจะเต็ง)



ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

ลงชื่อ




ผู้รับจ้าง

(นางสาวอีลฮาม เจะเด็ง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขัดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นางสาวอีลีฮาม เจ๊ะเต็ง)



ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นางสาวอีลฮาม เจ๊ะเต็ง)



ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖,๐๘๕.๐๐ - บาท (หกพันแปดสิบบห้าบาทถ้วน) และจะ

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นางสาวอีลฮาม เจะเด็ง)



ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นางสาวอีลฮาม เจ๊ะเต็ง)



ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย


ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ



(นายระเด่น สมะแอ)

(นางสาวอิลฮาม เจะเต็ง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปับัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ก่อสร้าง

๒๓.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ




ผู้รับจ้าง

(นางสาวอีลฮาม เจะเต็ง)



สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวอีลฮาม เจะเต็ง)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนรีกานต์ พิณโส)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๙๓๕๕๗๘๘

เลขคู่มือสัญญา ๖๗๐๕๒๒๐๒๑๐๐๙



อ.ศ.5 ใบสัถ์หลังตราสาร

เลขที่ 01523
วันที่ 7 มิถุนายน 2567

เลขประจำตัว 0953550000024 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิหังเงิ เชียงฉิเยมฉิง

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน ชื่ออาคาร -
ห้องเลขที่ - ชั้นที่ -
หมู่บ้าน - หมู่ที่ 10
เลขที่ 141/24 แยก -
ตรอก/ซอย - แขวง/ตำบล สะเตงนอก
ถนน - จังหวัด ยะลา
เขต/อำเภอ เมืองยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95000

คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียอากรแสดมภ์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมภ์ ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าอากรแสดมภ์	2,275	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	2,275	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองพันสองร้อย เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 007567 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567
เลขระบุเอกสาร อ.ศ.4 คือ 12950010-25670607-1-02-000029

ลงชื่อ _____
(นางสาวยามิละ ระสิมพะณี)
ตำแหน่ง _____
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัถ์หลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงาน เจ้าหน้าทีอากรแสดมภ์ของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100068513302

วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนปราจิณ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ้ว และ นางจุฑาทิพย์ ภัทรเศรษฐกร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกูแบจือเนาะ หมู่ที่ 3 ตำบลเปาะเส็ง อำเภอเมืองยะลา-บ้านชะเมาะ หมู่ที่ 5 ตำบลสะเต อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 00262/2567 ลงวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 121,700.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 121,700.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ้ว) ๒๕๖๗

ผู้ค้ำประกัน

(นางจุฑาทิพย์ ภัทรเศรษฐกร)

ลงลายมือชื่อ

(นายอนันพัฒนา ทองอยู่)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางปารย์พิชชา อินทร์รัตน์)

พยาน

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-34307056-1-1 :-

EFF_C_1_NY_PLUS

2580042

K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริง

141/24 (หมู่บ้านแสนดี) หมู่ 10 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์.073-227462 โทรสาร.073-227462 E-mail.

Vee1egn@gmail.com

หนังสือมอบอำนาจ

ที่ V1_088/2567

ทำที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริง

วันที่ 29 เมษายน 2567

ข้าพเจ้าห้างหุ้นส่วนจำกัด วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริง โดย นายมุฮัมมัดยูโซะ บาเฮะตำแหน่ง
หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจกระทำแทนห้างหุ้นส่วนจำกัด วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริง ขอมอบอำนาจให้
นางสาวอิลฮาม เจะเต็ง อายุ 38 ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ 4/11 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย
..... ถนน ตำบล/แขวง บ่อผุด อำเภอ/เขต เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1 9506 00019 06 3 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2566หมดอายุ 22 มิ.ย. 2574เกี่ยวข้องเป็น พนักงาน เป็นผู้มีอำนาจกระทำ
การดังต่อไปนี้ ให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. เสนอราคา,ยื่นขอเสนอราคาและต่อราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภูแบจือเนาะ หมู่ที่3 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง - บ้านชะเมาะ หมู่ที่ 5 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก..
2. ลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง.
3. ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินหรือรับเช็ค
4. ถอนคืนเงินหรือหนังสือค้ำประกันสัญญา แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในกรณีใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำลงไปในการนี้ทุกประการ โดยถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำเอง พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าและผู้รับมอบอำนาจได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้

(ลงชื่อ).....ผู้มอบอำนาจ
นางสาวอิลฮาม เจะเต็ง (นางสาวอิลฮาม เจะเต็ง) นายมุฮัมมัดยูโซะ บาเฮะ

(ลงชื่อ).....ผู้รับมอบอำนาจ
พยาน (นางสาวนริกันต์ พิณใส) (นางสาวอิลฮาม เจะเต็ง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริณัฐ์ ทองเทศ) พยาน

(นายสมาน บาเฮะ)

กรรมการ (นางสาวชูไรดา บาเฮะ)

กรรมการ (นางสาวชูไรดา บาเฮะ)



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 9410 00315 55 6

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย มุฮัมมัดยูโซ๊ะ บาเฮะ
 Name Mr. Muhammadyusoh Bahah

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย มุฮัมมัดยูโซ๊ะ บาเฮะ
 Last name Bahah

เกิดวันที่ 1 มี.ค. 2521
 Date of Birth 1 Mar. 1978

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 150/10 หมู่ที่ 10 ต.สะเตงนอก
 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

3 มี.ค. 2564

3 มี.ค. 2020

Date of Issue

(นายณานนท์ จงจรัส)
 เจ้าพนักงานออกบัตร

26 ก.พ. 2572
 วันบัตรหมดอายุ
 26 Feb. 2029
 Date of Expiry



9501-05-07031515

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(ลงชื่อ)..... (นายมุฮัมมัดยูโซ๊ะ บาเฮะ)
 (นายระเด่น สะมะแอ)
 (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองคึกฤทธิ์บริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัสยาม เจมดิง)
 (นางสาวอัสยาม เจมดิง)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวนันทน์ พันธ์ใส)
 (นางสาวนันทน์ พันธ์ใส)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)
 (นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)



รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9501-018909-7

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระเตงนอก

รายการที่อยู่ 150/10 หมู่ที่ 10

ตำบลสระเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2538

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(นางณัฐรินทร์ เค็ง)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563

สำเนาถูกต้อง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์คุณุโระ บารอง
หุ้นส่วนผู้จัดการ)

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9501-018909-7

ลำดับที่ 1

ชื่อ นายอนุวัฒน์คุณุโระ บารอง นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดยะลา สังกัด อบต.บ้านใหม่

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-9410-00315-55-6

สถานภาพ เจ้านาย

เกิดเมื่อ 1 มี.ค. 2521

มารดาให้กำเนิด ชื่อ สีเยาะ

(..... 3-9410-00315-54-8

สัญชาติ ไทย

บิดาให้กำเนิด ชื่อ เอกชัย

(..... 3-9410-00315-50-5

สัญชาติ ไทย

* มาจาก 60/4 หมู่ที่ 2 ต.กระโถด

อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เมื่อ 3 ก.ค. 2563

(..... พยาน

(นางณัฐรินทร์ เค็ง)

นายทะเบียน

.. ไปที่

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ.)

นายทะเบียน



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 9506 00019 06 3

ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. อีลิฮาม เจะเต็ง

นาม Miss Elham

นามสกุล Jhedeng

เกิดวันที่ 23 มิ.ย. 2528

Date of Birth 23 Jun. 1985

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 4/11 หมู่ที่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

21 มิ.ย. 2566

วันออกบัตร

27 Jun. 2023

Date of Issue

นางณิชากร ทนโส

เจ้าพนักงานออกบัตร

22 มิ.ย. 2574

วันบัตรหมดอายุ

22 Jun. 2031

Date of Expiry



9599-05-06211011

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
 (นายระเดน สมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภูมิภาคที่ ๑
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวอีลิฮาม เจะเต็ง)

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวณิชากร ทนโส)

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)



รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 8404-011048-0 สำนักทะเบียน กิ่งถิ่นเทศบาลเมืองเกาะสมุย

รายการที่อยู่ 4/11 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535

แจ้งความตามคำร้องที่ 1068, ๑๗ ลว. ๒ มี.ค. ๒๕

ลงชื่อ นายทะเบียน (น.ส.กัญญาพัชญ์ ใจกว้าง) วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 2 มีนาคม 2555

เจ้าหน้าที่จะต้อง ประธานกรรมการ (นายระเด่น สมะเนอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน (นางสาวอิลลียม เจ๊ะเต็ง) กรรมการ (นางสาวอิลลียม เจ๊ะเต็ง)

เลขที่ 8404-011048-0 ลำดับที่ 2 ชื่อ น.ส.อิลลียม เจ๊ะเต็ง (สงชื่อ) สัญชาติ ไทย เกิดเมื่อ 23 มี.ย. 2528 เลขประจำตัวประชาชน 1-9506-00019-06-3 ผู้อาศัย สัญชาติ ไทย บิดาผู้มีถิ่นกำเนิด ชื่อ อามีเนาะ (สงชื่อ) สัญชาติ ไทย บิดาผู้มีถิ่นกำเนิด ชื่อ มะ (นางสาวกักรินทร์ ทองเทศ) สัญชาติ ไทย * มาจาก 86/1 หมู่ที่ 3 ต.บาสอ แจ้งย้ายปลาทอง อ.รามัน จ.ยะลา เมื่อ 9 ก.ย. 2556 (น.ส.กัญญาพัชญ์ ใจกว้าง) ** ไฟที่ นายทะเบียน

ที่ ยล. 000258



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953550000024

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิหนึ่ง เอ็นจิเนียริง
- ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายมุฮัมมัดยูโซะ บาเฮะ	ลงหุ้นด้วย เงิน
จำนวน	14,000,000.00 บาท
2. นางสาวซูไรดา บาเฮะ	ลงหุ้นด้วย เงิน
จำนวน	1,000,000.00 บาท

- หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายมุฮัมมัดยูโซะ บาเฮะ

- ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ -ไม่มี-

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 141/24 หมู่ที่ 10 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 46 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บังคับราชการแทน

(ลงชื่อ).....นางสาวพรรณ ท้ายห้อง (นางสาวพรรณ ท้ายห้อง)

(นางสาวอิสรยา เจ๊ะเต็ง)

นายทะเบียน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฏฐา พันธรัตน์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation





ที่ ยล. 000258

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000258

1. ห้างนี้เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีคลาส เอ็นจิเนียริ่ง ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552/
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง!
(นายระเด่น สระมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ป้ายการค้าท้องถิ่น
(ลงชื่อ) นายกมลศักดิ์ วัฒนาธรรม
(นางสาวอีลฮาม เจะดีง)
(นางสุวิมล วัฒนสุข)
(ลงชื่อ).....
(นางสาวริگانต์ พิณโส)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
ก้าวสู่ความสำเร็จ

Leading Business
Empower People
Transformation





ที่ ยล. 000258

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000258

1. ห้างนี้เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีคลาส เอ็นจิเนียริ่ง ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552/
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา **สำนักงานกักต้อง**

(ลงชื่อ) นายกองเล็กการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(...นางสาวอีลฮาม เจงเต็ง...)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ว.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยกาสิโน และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับดำเนินการบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เสนอผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น (นายระเด่น สะระแอ)
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล บริการสุขภาพและผู้ป่วยเจ็บ ร่องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง (นางสาวอริสรา อธิวงษ์)
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันจมน้ำทุกประเภท (นายมานะ ฝายน)
- (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม (เสริมสวย) (นางสาวนริกานต์ พิณใส)
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป สิ่ง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร (นายมุฮัมมัดยูโซ๊ะ บาเฮะ)
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด (ลงชื่อ)..... หันส่วนผู้จัดการ
- (21) ประกอบกิจการประมวลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ให้แก่นักศึกษา นักศึกษา นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ (นางสาวศิริกานต์ พงษ์พุด)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:20 น.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

Ref:679500213000258

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....46.....ข้อ ดังนี้

(22) ประกอบกิจการค้าวัสดุครุภัณฑ์ สำนักงานทุกชนิด รวมทั้งเครื่องเขียนและ
แบบเรียน

(23) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์
ทั้งหมด ให้บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(24) ประกอบกิจการบริการดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า จัดสวนตลอดจน
รับจ้างตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคารสถานที่

(25) ประกอบกิจการรับออกแบบ ตกแต่งอาคารสถานที่ รับออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
ทั้งภายในภายนอกอาคาร ตลอดจนการประมูลเพื่อดำเนินการให้แก่หน่วยงานราชการ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ บุคคล หรือคณะบุคคลต่างๆ

(26) จำหน่ายพรมทุกชนิด ผลิตภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด โคมไฟที่ประชุมและจัดออกแบบ
ห้องประชุม

(27) จำหน่ายรถดับเพลิง รถขนขยะ รถไถนา เรือทุกชนิด ถังขยะ ถังเก็บน้ำ และอุปกรณ์
จราจรทุกชนิด

(28) จำหน่ายอุปกรณ์สนามเด็กเล่น จัดสนามเด็กเล่น และสื่อการสอน

(29) รับวางระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด ระบบแลนด์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ของใช้
ที่ทำจากเหล็ก อลูมิเนียม และสแตนเลส

(30) รับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำเว็บไซต์ สื่อมัลติมีเดีย จัดทำโปรแกรม แผนที่
ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

(31) ประกอบกิจการประมูล เพื่อรับจ้างเหมาแรงงาน ในการดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุ
ในวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ
(นายภูวดล สมะอ้อ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ) นายสุวิทย์ คุ้มทรัพย์
(นางสาวอติฉิน ใจแดง)

(นางมุขฉัตร กัญญา)

(นางสาวนันทิภา พิณใส)

(นางสาวกิริรินทร์ ทอนรัมย์)

พยาน



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 46 ข้อ ดังนี้

(32) ประกอบธุรกิจบริการทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมก่อสร้าง งานโยธาทุกชนิด

(33) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

(34) ประกอบกิจการค้า จัดซื้อ จัดหา รับออกแบบ ติดตั้งให้บริการซ่อมแซม รักษาดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร ระบบโทรศัพท์สแกนลงวงจรปิด ระบบการให้บริการรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า และ ระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมทั้ง อะไหล่วัสดุอุปกรณ์ ทุกชนิด

(35) ประกอบกิจการให้บริการงานด้านระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ากำลัง รับผิดชอบอุปกรณ์ไฟฟ้า รับเดินสายไฟฟ้าเคเบิล ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำ รวมทั้งให้บริการงานรับเหมาก่อสร้าง งานโยธา งานวางรากฐานเสาไฟฟ้าทุกชนิด ให้แก่การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไฟฟ้าฝ่ายผลิต บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ องค์กรและหน่วยงานรัฐ


(36) ประกอบกิจการเป็นผู้มีอาชีพโดยการรับจ้างแรงงานที่ทำโดยวิธีการประกวดราคา จ้างสอบราคาหรือเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบ ราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(37) ประกอบกิจการเข้าประมูล ประกวดราคา สอบราคา เสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการงานตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจองค์กรและหน่วยงานของรัฐ

(38) ประกอบกิจการรับออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานแบบพิมพ์ทางการก่อสร้าง รับออกแบบโครงสร้างอาคาร โครงสร้างรากฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

(ลงชื่อ)..... **สำเนาถูกต้อง** จ้างจ้าง (นายระเด่น สมนะหอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จ้างจ้าง

(...นางสาวอุบลวิมล...)

หุ้นส่วนผู้จัดการ พยาน

(...นางสาวกรรณิการ์...)

(ลงชื่อ)..... พยาน (นางสาวกรรณิการ์ ทองเพ็ญ)



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....46.....ข้อ ดังนี้

() ทุกชนิด

(39) ประกอบกิจการรับลอกคูคลอง รับจัดการบริหารระบบน้ำ

(40) ประกอบกิจการค้า จัดซื้อ จัดหา รับออกแบบติดตั้งให้บริการซ่อมแซม ดูแลระบบสื่อสาร ระบบโทรศัพท์วงจรปิด ระบบการให้บริการรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด

(41) รับก่อสร้างงานอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ

(42) ประกอบกิจการผลิตหรือจำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า แอลอีดีและผลิตภัณฑ์ด้านประหยัดพลังงานอื่นๆฯลฯ ให้กับบุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ

(43) ประกอบกิจการผลิตหรือจำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานทดแทนทุกชนิด เช่น ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ด้านพลังงานน้ำ ด้านพลังงานลม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบให้กับบุคคล นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ องค์กรและหน่วยงานของภาครัฐ

(44) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบยานพาหนะทุกประเภท

(45) ประกอบกิจการผลิตหรือจำหน่ายระบบประปา

(46) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ติดตั้ง อุปกรณ์ระบายน้ำ คูน้ำคอนกรีต

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....นางสาวจาง

(นายระเด่น สมะเนอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายคองพิฑฒบริหารสามจังหวัดอุบลราชธานี

(นางสาวอิสฮาม เจะเด็ง)

(นายอูฮามดัยไซยะ นามฮะ)

(ลงชื่อ).....นางสาวกรรณิการ์

(นางสาวกรรณิการ์ พินโส)

(ลงชื่อ).....นางพ

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) ;

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่สังคมดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



แบบใบเสนอราคา

หน้า ๑ ถึง ๓
จำนวน ๓ (ฉบับ)

เรียน ประธานกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า...หจก.วีหนึ่ง เอ็นจิเนียริง ...อยู่เลขที่...141/24...หมู่ที่...10...ถนน..... ตำบล/แขวง.....สะเตงนอก.....อำเภอ.....เมืองยะลา.....จังหวัด.....ยะลา.....โทรศัพท์.....099-4012992..... โดย...นางสาวอิลฮาม เจะเต็ง.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตาม หนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51009/ 1190 ลงวันที่ ...23 เมษายน 2567....โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทาง ราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุ่มบือโจเนาะ หมู่ที่๑ ตำบลเปาะเส็ง อำเภอเมือง - บ้านชะเมาะ หมู่ที่ 5 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา... ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาตามที่ได้ระบุไว้แนบท้ายใบเสนอราคา นี้ เป็นเงินทั้งสิ้น.....2,444,000.00.....บาท (.....สองล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....159,887.85/บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอจะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา..... 180วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือก โดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน.....240.../วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบเงินประกันเป็นจุกหนนร้อยละ 5 ของราคาตาม สัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา นี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(นางสาวอิลฮาม เจะเต็ง)
กรรมการ
(นางสาวอิลฮาม เจะเต็ง)
(นางสาวอิลฮาม เจะเต็ง)
(นางสาวอิลฮาม เจะเต็ง)
(นางสาวอิลฮาม เจะเต็ง)
(นางสาวอิลฮาม เจะเต็ง)
(นางสาวอิลฮาม เจะเต็ง)

/หากข้าพเจ้า...

ลงวันที่ - ๗ มิ.ย. ๒๕๖๗

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา รับผิดชอบ หรือเรียกชดเชยค่าเสียหายจากผู้ออกหนังสือคำสั่งประกันรวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคา นี้ โดยละเอียดแล้วและเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกมลข้อฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....30.....เดือน ...เมษายน.....พ.ศ.....2567.....

(ลงชื่อ).....
(...นางสาวอีลฮาม เจะเต็ง...)
ตำแหน่ง.....ผู้รับจ้าง/ผู้รับมอบอำนาจ.....

(ประทับตรา (ถ้ามี))

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเคิน สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(...นางสาวอีลฮาม เจะเต็ง...)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนริกานต์ พิณไสย)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภูแบจือเนาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส้ง
อำเภอเมืองยะลา - บ้านชะเมา หมู่ที่ ๕ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๗/๑๑๘๘-๑๑๙๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภูแบจือเนาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา - บ้านชะเมา หมู่ที่ ๕ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ราคากลาง ๒,๔๔๕,๕๖๖.๒๓ บาท จำนวน ๖ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าว มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| ๑. หจก. ซายูติการโยธา | เสนอราคา ๒,๔๔๕,๕๐๐.- บาท |
| ๒. หจก. วิหนึ่ง เอ็นจิเนียริง | เสนอราคา ๒,๔๔๔,๐๐๐.- บาท |
| ๓. หจก. อาบาดีโยธากิจ | เสนอราคา ๒,๔๔๕,๐๐๐.- บาท |


คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันทั้ง ๓ ราย และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย หจก. วิหนึ่ง เอ็นจิเนียริง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒,๔๔๔,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง และต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อรองราคาให้ห่างๆ ลดวงเงินลงอีก ทางห่างๆ ยินดีลดวงเงินให้อีก จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๒,๔๓๔,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคา ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๒๔๐ วัน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....
(นายระเด่น สะมะนอ).....
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นางสาวอิลฮาม เจะเด็ง).....
(นางสาวอิลฮาม เจะเด็ง).....
(นางยุพาวรรณ บุญอินทร์).....
(นางสาวนริگانต์ พิณโล่).....
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ).....
(นายณัฐนนท์ ขุนราม).....
(นายนครล เจ๊ะซู).....

ผู้ต่อรองราคา
ENGINEERING
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๘๓๒๒/๒๖

ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ขนาด.....หน้า.....
 มีหน้า.....ถึง.....
 แบบปร.5
 จำนวน.....(ฉบับ)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกูแบจือเนาะ หมู่ที่ 3 ตำบลเปาะเส็ง อำเภอเมืองยะลา - บ้านชะเมา หมู่ที่ 5 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกูแบจือเนาะ หมู่ที่ 3 ตำบลเปาะเส็ง อำเภอเมืองยะลา - บ้านชะเมา หมู่ที่ 5 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

โครงการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ประมาณการโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิหนึ่งเอ็นจิเนียริ่ง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท	รวมเป็นเงิน/บาท	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกูแบจือเนาะ หมู่ที่ 3	2,434,000.00	2,434,000.00	
	ตำบลเปาะเส็ง อำเภอเมืองยะลา - บ้านชะเมา หมู่ที่ 5			
	ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา			
	รวม		2,434,000.00	
	เงินใน			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%			
	เงินประกันผลงานหัก.....-%			
	คอกเบี้ยเงินกู้.....6.....-%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%			
สรุป	รวมราคา		2,434,000.00	
	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต้)			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			
	ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ลงชื่อ).....		2,434,000.00	
ตัวอักษร	(สองด้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (นายระเด่น สะมะแอ) เจ้าจ้าง			

(ลงชื่อ) นายกรังกร บริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(นางสาวอริสรา...)

(ลงชื่อ) ENGINEERING

(นางสาวอริสรา...)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ลงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๗

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกูแบจือเนาะ หมู่ที่ 3 ตำบลเปาะเส็ง - บ้านชะเมาะ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกูแบจือเนาะ หมู่ที่ 3 ตำบลเปาะเส็ง อำเภอเมืองยะลา - บ้านชะเมาะ หมู่ที่ 5 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ประมาณการโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิหนึ่งเอ็นจิเนียริ่ง

วันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
	1.1 งานดิน				
	1.1.1 งานวางป่าและขุดคอ ขนาดเบา	ตร.ม.	1,100.000	2.59	2,849.000
2	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง	ตร.ม.	2,750.000	16.60	45,650.000
	1.2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม.				-
	1.2.2 งานรองพื้นทาง				-
	1.2.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	594.000	282.10	167,567.400
	1.2.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	145.000	856.10	124,134.500
3	1.3 งานผิวทาง				-
	1.3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,750.000	644.06	1,771,165.000
	1.3.2 รอยต่อเพื่อลดคานขวาง	ม.	265.000	220.65	58,472.250
	1.3.3 รอยต่อคานยาว	ม.	550.000	98.61	54,235.500
4	1.4 งานโครงสร้าง				-
	1.4.1 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 ม.	ม.	16.000	1,484.05	23,744.800
	1.4.2 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 ม.	ม.	27.000	2,904.34	78,417.180
5	1.5 งานทางเชื่อม				-
	1.5.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	150.000	644.06	96,609.000
	1.5.2 รอยต่อเพื่อลดคานขวาง	ม.	15.000	220.65	3,309.750
	1.5.3 รอยต่อคานยาว	ม.	30.000	98.61	2,958.300
6	1.6 งานเบ็ดเตล็ด				-
	1.6.1 เสาย้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม.	ม.	3.000	555.39	1,666.170
	1.6.2 แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างเสร็จ	ตร.ม.	0.720	4,476.17	3,222.842
	รวม				2,434,001.692
	เป็นเงินทั้งสิ้น (ลงชื่อ).....				2,434,000.00
	รวมทั้งหมดทั้งสิ้น (.....)				สองล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวภริณทร์ ทองเทศ)

(นางสาวอุลลามา ละเด็ง)

ตำแหน่ง ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับจ้าง

ผู้เสนอราคา

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกู่แบจือเนาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา - บ้านชะเมาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งเป็น ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๒๕,๖๕๐.๒๐.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสตางค์) ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
- งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)
- งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่
- งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก
- งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณงาน ๕๐.๐๐ ลบ.ม.
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ปริมาณงาน ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.
- งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction joint)
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๘,๓๔๙.๘๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดพันสามร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบสตางค์) ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานทางเชื่อมผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction joint) แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นป้องกันก่อสร้างแล้วเสร็จ และงานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของโครงการ

จนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)..... พยาน

(...(นางสาวนริภกมล..พินโค)...)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(...(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)...)



สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาจ้างต่อหน่วยหรือราคาจ้างเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาจ้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาจ้างเป็นงวด
ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือ
บวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเคลื่อน
บดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล
ปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติ
ของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐาน
ตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED
MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

๒.๒ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบ ด้วย
ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดี่ยว (DOWEL
BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง แผ่นพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

๒.๓ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
และงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อย
สายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.30 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
.....(นางสาวอัสลาม จะเด็ง) /ดัชนี...
ENGINEERING
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนริภานต์ พิณโล่)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ลงวันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๗

-๒-

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

- K = ESCALATION FACTOR
- It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริษัท ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริษัท ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- At = ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

(Handwritten signature)

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแอ) ^{ผู้รับจ้าง}

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)..... (นางสาวอิลฮาม เจ๊ะเต็ง) ^{ผู้รับจ้าง}

(นางสาวอิลฮาม เจ๊ะเต็ง)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวนริกันต์ พิณโส) ^{พยาน}

(นางสาวนริกันต์ พิณโส)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)



ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

หนังสือรับรอง หน้า ๕ ถึง ๖

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม..... (ฉบับ)

เขียนที่ หก รัตนวิเศษชัย

วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย สุทธิพงษ์ อิศมาอิน อายุ ๖๔ ปี
 ชื่อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๙/๔๐ หมู่ที่ ๑๐ ถนน -
 ตรอก/ซอย ตำบล หนองนาอน อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๓-๒๙๗๔๖๒ สถานที่ทำงาน หก รัตนวิเศษชัย
 ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท วิศวกรรมโยธา สาขา โยธา
 แขนง ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน สย. ๑๕๕๗๘
 และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยข้าพเจ้า
 เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น - ๓ ชั้น
 จำนวน.....โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,
 แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....วิศวกร
 (นาย สุทธิพงษ์ อิศมาอิน)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นาย ระเด่น สมมต)

(ลงชื่อ).....ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หก.
 (นางสาว อธิสวาม เจ๊ะเต็ง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 (ลงชื่อ) นาย ก้องเกียรติ บริหาร ส่วนจังหวัดยะลา
 (นางสาว อธิสวาม เจ๊ะเต็ง)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาว ปัทมา จิตรี)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาว นริภานต์ พิณใส)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาว ฐิติภา ฐิติ)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาว ภริรินทร์ ทองเทศ)

1. ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร



ใช้สำหรับออกแบบ คำนวณ...
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ เมตร ระยะทาง ๑.๕ กม. ๔:๑๖ ใต้กับ ทาง. ๖:๒๖ ๖:๒๖
สถานที่ ๑.๖ ต.ป่าไร่ เลี้ยว ๑.๖๖๐-๖.๒๖๐
- ๑.๖ ต.ป่าไร่ ๑.๖๖๐ ๑.๖๖๐ ๖.๒๖๐

(นายสุทธิพงษ์ อีสมาอิน)
วิศวกร สย.15578

000117411
7 มิ.ย. 2567



สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th

ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะเนอ)
ผู้จัดการโครงการบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายอภินันท์ อิศานสาร ส่วนจังหวัดยะลา
(นางสาวอ้อลิฮาม เจ๊ะเต็ง)

(นางสาวนริชานต์ พิภพใส)
.....



(นายสุทธิพงษ์ อีสมาอิน)
วิศวกร สย.15578

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นาย ประยูร ปาทน วุฒิ ปวส. ช่างโยธา
สาขา โยธา ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ถนน อรดี. ซอยหินก้ามจิ้งจอก - ซอย
สุขุมวิท ๓. 3 ซ. ปาราธวี ๐. ๖๖๖ จ. ชลบุรี - ๓. ๕ พ. ๖๖๐ อ. ชลบุรี จ. ชลบุรี
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ จันทน์อินจันชัยวิ ตั้งแต่วันที่..... เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
จันทน์อินจันชัยวิ เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภูบึงขาม

(ลงชื่อ) นายกองดี ภูบึงขาม
(นางสาวอีลฮาม เจ๊ะเต็ง)

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ
(นางสาวนริกาณี พงษ์ใส)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....
(นาย ประยูร ปาทน)
ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอีลฮาม เจ๊ะเต็ง)
ผู้เสนอราคา
จันทน์อินจันชัยวิ

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 9506 00435 79 9
Identification Number

ชื่อและชื่อสกุล นาย ประยูร ปาทาน
Name Mr. Prayoon
Last name Pathan
เกิดวันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๑๙
Date of Birth 6 Jul. 1976
ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 26 หมู่ที่ 1 ต.วังพญา
อ.รามัน จ.ยะลา
12 ก.ย. ๒๕๕๔
วันหมดอายุ
17 Sep. 2021
Date of Expiry

5 ก.ค. ๒๕๗๓
วันบัตรทองอายุ
5 Jul. 2030
Date of Expiry

0601 03 00121435

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายประยูร ปาทาน (...นางสาวอิลฮาม..เจ๊ะแดง...)

BORA-10.8-07-2563

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนริگانต์ พิงส์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

M53-1512835-53

เลขรหัสประจำบ้าน 9506-006750-5 เลขหมายเกี่ยวกับบ้าน สำนักทะเบียน อำเภอรามัญ

เล่มที่ 2

รายการที่อยู่ 26 หมู่ที่ 1
ตำบลวังพญา อำเภอรามัญ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ *[Signature]* นายทะเบียน
(นายชัยชนะ กตตยานาถ)
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 7 กรกฎาคม 2543

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

9506-006750-5

สัญชาติ ไทย



เล่มที่ 1 รายการบุคคลในครอบครัวของเลขที่ประจำบ้าน

ชื่อ นายประยูร ปาทาน

เลขประจำตัวประชาชน 3-9506-00435-79-9 สถานภาพ มีคู่สมรส

มารดาผู้เสียชีพ ชื่อ มีอนัย

บิดาผู้เสียชีพ ชื่อ กลาสัยน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรวิภากร ทัศนโส)

3-9506-00435-74-8 สถานภาพ มีคู่สมรส

(นางสาวกรวิภากร ทัศนโส)

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

.. 1/6

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

นายประยูร ปาทาน

หน้า ๒ หน้า ๒
หน้า ๒ หน้า ๑
หน้า ๑ หน้า ๑
จำนวน..... ๑๐..... (ฉบับ)

2.40 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุ่มจือเกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา - บ้านชะเมา หมู่ที่ ๕ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,750.00 ตารางเมตร

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิหนึ่ง เอ็นจิเนียริ่ง ที่อยู่ 141/24 หมู่ที่ 10 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นายมุฮัมมัดยูโซ๊ะ บาเฮะ โทร. 099 - 4012992
ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 8 มิถุนายน 2567 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 2 กุมภาพันธ์ 2568 รวมเป็นระยะเวลา 240 วัน
วงเงินงบประมาณที่ตัดจ่าย 2,500,000.-บาท

ราคาากลางค่าก่อสร้าง 2,445,566.23 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างที่ตกลงนามในสัญญาจ้าง 2,434,000.-บาทของนายกองเอกการปัทมสารจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ควบคุมงาน นายกองเอกการปัทมสารจังหวัดยะลา (นางสาวอลิษา ละเด็ง) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1. นายอดิสร ตาและ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625 1. นายเอกธราช ชัยสัน หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร.0-7320-3625
- 2. นายอุสมาน ยูณี ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ โทร. 0-7320-3625 2. นายชัยสุภรณ์ ชุ่มนันทน์ นายช่างโยธาอาวุโส โทร.0-7320-3625
- 3. นายอวัฒน์ ต๊ะสละ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.0-7320-3625

“(ลงชื่อ)..... (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)..... พยาน
“(ลงชื่อ)..... (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ).....
“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผนป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่นามในสัญญาจ้าง

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

_____ 1.20 เมตร _____

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดโจนะ หมู่ที่ 3 ตำบลปะเหล็ง อำเภอเมืองยะลา - บ้านชะเมา หมู่ที่ ๕

ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร พร้อมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,750.00 ตารางเมตร

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) *ประจักษ์ สิมะเสน* *ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา*

(... (นางสาวอิลซาม เจงคง)



(ลงชื่อ) *ประจักษ์ สิมะเสน* *ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา*

(... (นางสาวอิลซาม เจงคง)

(ลงชื่อ) *ประจักษ์ สิมะเสน* *ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา*

(... (นางสาวอิลซาม เจงคง)

(ลงชื่อ) *ประจักษ์ สิมะเสน* *ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา*

(... (นางสาวอิลซาม เจงคง)

(ลงชื่อ) *ประจักษ์ สิมะเสน* *ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา*

(... (นางสาวอิลซาม เจงคง)

(ลงชื่อ) *ประจักษ์ สิมะเสน* *ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา*

(... (นางสาวอิลซาม เจงคง)

(ลงชื่อ) *ประจักษ์ สิมะเสน* *ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา*

(... (นางสาวอิลซาม เจงคง)

ซึ่งงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2567
วงเงินค่าก่อสร้าง : 2,434,000.- บาท
แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้

0.60 เมตร



องค์การการประจําการซื้อของหลวง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนวิบูลย์นิคม - บ้านชะเมาะ
บ้านวิบูลย์นิคม หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมาะ อำเภอชะเมาะ จังหวัดน่าน

รองนายกองค์การการประจําการซื้อของหลวง
นาย **ประจําการ** (นางประจําการ สละเมาะ)
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร สูง 5.50 เมตร
ที่ STA. 0+000 ถึง 0+550
(ลงชื่อ) **PRING**
นางสาว **วิบูลย์นิคม** (นางวิบูลย์นิคม สละเมาะ)
รวมความยาว 0.550 กิโลเมตร

(ลงชื่อ) **Pring**
(นางสาววิบูลย์นิคม สละเมาะ)

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ ๒๕(๑)...

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปูนบนระ หน้าที่ ๖ ส่วนบนระลิ่ง ด้านถนนหน้า - บ้านพระยา หมู่ที่ ๕ ตำบลหนอง ต.บ้านพระยา...

รายการทั่วไป

- 1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจก่อนแบบและรายการก่อสร้าง 1. ในพื้นที่ก่อสร้าง...
1.1 แจ้งขอเข้าปฏิบัติงาน
1.2 ส่งแบบร่างปฏิบัติงาน
1.3 ส่งแจ้งราคาผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง...

ในท้องที่บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

- 2. วัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในทางก่อสร้าง...
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจก่อนแบบและรายการก่อสร้าง...
4. ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน...

นางสาวอริสสา... (นางประติมา) ... (นางสาวอริสสา) ... (นางประติมา) ...

- 6. งานตัดไม้ค้ำ งานตัดหิน...
7. งานขุดดินและถมดิน...
8. ผู้ควบคุมงาน...
9. มาตรฐานการก่อสร้าง...
10. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...

นางสาวอริสสา... (นางประติมา) ... (นางสาวอริสสา) ... (นางประติมา) ...

Table with 3 columns: No., Description, and Unit/Price. Contains items 15-22 related to construction materials and labor.




องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

Table with 4 columns: Position, Name, Signature, and Stamp. Lists officials from the contractor and the local government.

โครงการถนนบายพาสสายเลี่ยงทางเลขที่ ๑๐๖/๒๖๑/๒๖๑

ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

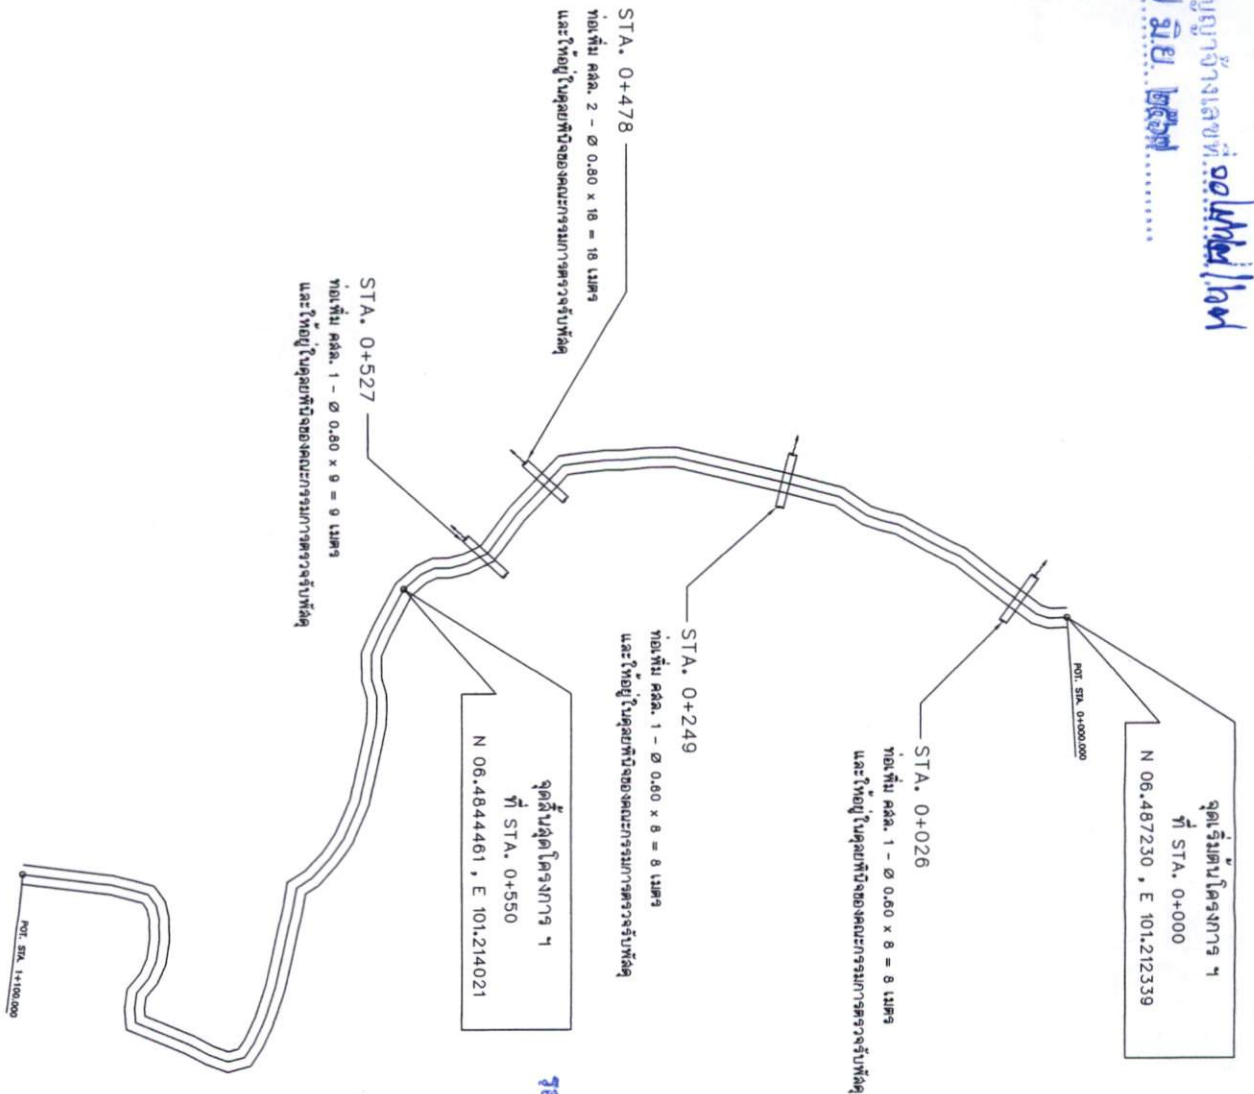

หน้า ๒

(ลงชื่อ)
นายระเด่น สะสมเสมอ
ผู้อำนวยการส่วนงานวิศวกรรม


(ลงชื่อ)
นางสาวอิลฮาม เจ๊ะเต็ง
นางสาวอิลฮาม เจ๊ะเต็ง

(ลงชื่อ)
นางสาวนริภานต์ พิณโกล
(นางสาวนริภานต์ พิณโกล)

(ลงชื่อ)
นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ
(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ตำแหน่ง	นายระเด่น สะสมเสมอ
ตำแหน่ง	นางสาวอิลฮาม เจ๊ะเต็ง
ตำแหน่ง	นางสาวนริภานต์ พิณโกล
ตำแหน่ง	นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ

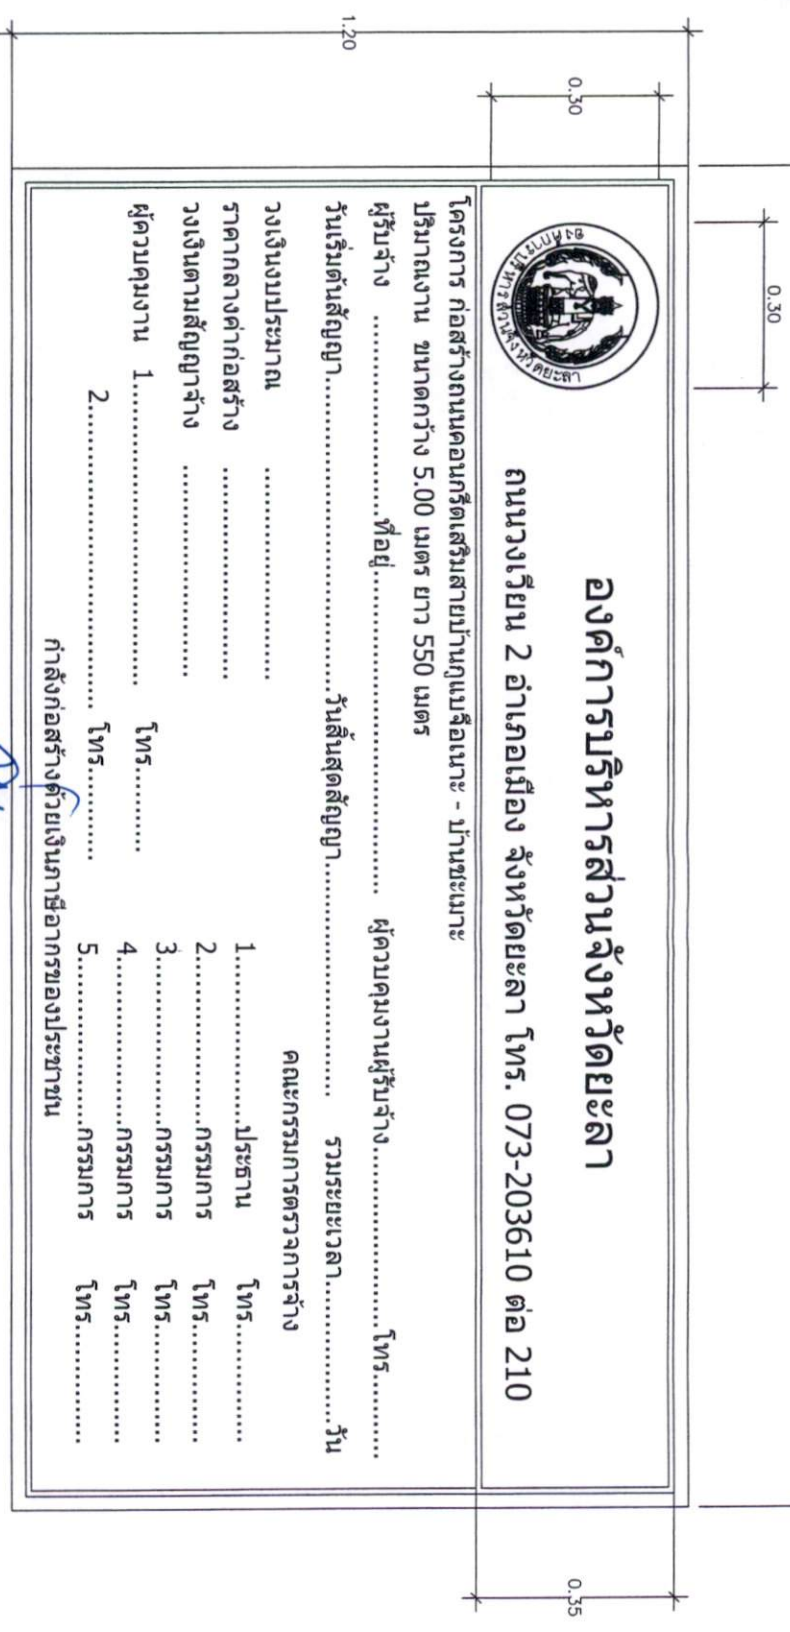

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 210

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสลายปานกอบน้อย - บ้านชะเมา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 550 เมตร

ผู้รับจ้าง ที่อยู่..... ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง..... โทร.....
วันเริ่มต้นสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา..... รวมระยะเวลา..... วัน

วงเงินงบประมาณ คณะกรรมการตรวจจ้าง

ราคาากลางค่าก่อสร้าง 1..... ประธาน โทร.....
วงเงินตามสัญญาจ้าง 2..... กรรมการ โทร.....
ผู้ควบคุมงาน 1..... โทร..... 3..... กรรมการ โทร.....
2..... โทร..... 4..... กรรมการ โทร.....
5..... กรรมการ โทร.....

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

(ลงชื่อ).....
ผู้อำนวยการส่วนงานก่อสร้าง

รองนายกฯศึกษารัฐวิจิตร วัฒนวิจิตร

(ลงชื่อ)..... นายกองเอกวิจิตร วัฒนวิจิตร

(.....) (นางสาวอริชชาม ละเต็ง)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวนริศกานต์ พิณใส)

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกริรินทร์ ทองเทต)

- รายละเอียดป้าย
- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม. หรือ ไขว้เหล็ก
 - พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
 - ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดแผ่นสี่เหลี่ยม 0.30 ม.
 - โครงสร้างไม้ขนาด 2 x 4"
 - ตัวป้ายสีตัดสูงจากพื้น 2.00 เมตร
 - มีสีเป็นแม่ทอนของกระทรวงมหาดไทย
 - ติดตั้งแผ่นป้ายบริเวณละแวกก่อสร้าง (7 ม. จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดจากป้ายอย่างน้อย 2 จุด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		ตำแหน่ง	
ผู้อำนวยการส่วนงานก่อสร้าง	วิจิตร วัฒนวิจิตร	นายกเทศมนตรี	วิจิตร วัฒนวิจิตร
รองนายกฯศึกษารัฐวิจิตร วัฒนวิจิตร	วิจิตร วัฒนวิจิตร	นายกเทศมนตรี	วิจิตร วัฒนวิจิตร
นายกองเอกวิจิตร วัฒนวิจิตร	วิจิตร วัฒนวิจิตร	นายกเทศมนตรี	วิจิตร วัฒนวิจิตร
(นางสาวอริชชาม ละเต็ง)	วิจิตร วัฒนวิจิตร	นายกเทศมนตรี	วิจิตร วัฒนวิจิตร
(นางสาวนริศกานต์ พิณใส)	วิจิตร วัฒนวิจิตร	นายกเทศมนตรี	วิจิตร วัฒนวิจิตร
(นางสาวกริรินทร์ ทองเทต)	วิจิตร วัฒนวิจิตร	นายกเทศมนตรี	วิจิตร วัฒนวิจิตร

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจวินิจฉัย ที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 (ลงชื่อ).....  นายอรรถกฤษณ์ บริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (นางสาวอิสยาม เจ๊ะเต็ง)
 (ลงชื่อ).....  20/๖/๖๗
 (นางสาวนริกันต์ พิณโส)
 (ลงชื่อ).....  พยาน
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)



ภาคผนวก ๓

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้องอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

ผู้

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองเอกบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางสาวอิสยาม เจะเต็ง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนริگانต์ พิณใส)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

ลงวันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๗

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

ณ

(ลงชื่อ).....
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองคึกฤทธิ์ หารสง จังหวัดยะลา
(นางสาวอิสลาม เจะเต็ง)

(ลงชื่อ)..... พยวน
(นางสาวนริกานต์ พิณโส.)

(ลงชื่อ)..... พยวน
(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ.)

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้
แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผน

ME

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น ตระเด่น)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
(นางสาวอรุณฉวี เจาะ)
(นางสาวอรุณฉวี เจาะ)
(ลงชื่อ)..... (นางสาวนริศกานต์ พิณชู)
(นางสาวนริศกานต์ พิณชู)




(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เงินเงิน	%
1	งานติดตั้งระบบ					
	รายการ...	ร.บ.ล.				
	รายการ...	ร.บ.ล.				
2	งานสำรวจ					
	รายการ...	ร.บ.ล.				
	รายการ...	ร.บ.ล.				
			รวม			0%


	1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

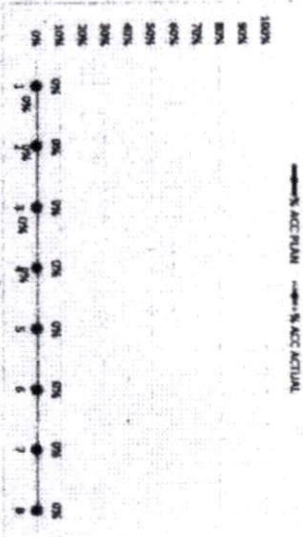

Money									
AccMoney									
% PLAN									
% ACC PLAN									
% ACTUAL (100%)									
% ACC ACTUAL (0%)									
รวมยอดโครงการติดตั้งระบบ (งบจัด)									
% ACC DIFF (งบจัด)									
% PLAN/2									
% PLAN/2 DIFF									

- หมายเหตุ:
- กรณีบริษัทฯ กำหนดระยะเวลาการทำงานเป็นงานสัญญา ๘ เดือน
 - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในปริมาณงานที่เกินของแผนการทำงานที่ระบุไว้ เช่น กรณีที่ติดตั้งระบบ (งบจัด) ซึ่งระบุไว้ว่าติดตั้งระบบ ๑ ระบบ (งบจัด) แต่จริงแล้วติดตั้งระบบได้ ๒ ระบบ
 - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในปริมาณงานที่เกินของแผนการทำงานที่ระบุไว้ เช่น กรณีที่ติดตั้งระบบ (งบจัด) ซึ่งระบุไว้ว่าติดตั้งระบบ ๑ ระบบ (งบจัด) แต่จริงแล้วติดตั้งระบบได้ ๒ ระบบ
 - Money
 - % PLAN

(ลงชื่อ)..... กวิน..... พิชาน
 (นางสาวกวิรัตน์พร... ของเทศ).....

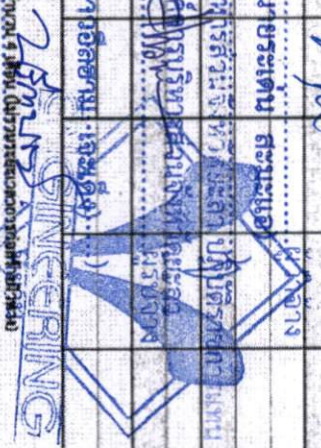

ตัวอย่างวิธีการจัดคำนวณการหักงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	ชุดเครื่องจักรกล	a1	100	5,000	500,000	10%
		a2	120	2,000	240,000	8%
2	คนผู้ตรวจ	b1	400	2,000	800,000	26%
		b2	300	5,000	1,500,000	69%
รวม					3,040,000	100%

	1	2	3	4	5	6	7	8
Money								
Acceloney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								

- หมายเหตุ:
- กรณีมีข้อ ๑๓ จากบรรทัดรายการที่ ๑๓ งานที่ ๑ ถึง ๑๐
 - กรณีมี ข้อ ๑๓ จากบรรทัดรายการที่ ๑๓ งานที่ ๑ ถึง ๑๐
 - กรณีมี ข้อ ๑๓ จากบรรทัดรายการที่ ๑๓ งานที่ ๑ ถึง ๑๐
 - Money
 - % PLAN


.....
 (นางสาววิริทธิ์ ของทด)



ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินงานตามตารางงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานติดตั้งสาย	A1	PLU	100	500,000	16%
		A2	PLU	120	200,000	8%
2	งานไฟฟ้า	B1	M2L	400	800,000	26%
		B2	M2L	300	5,000	0.16%
					1,500,000	49%
				3,040,000	100%	

100,000
 3,040,000 X 100 = 3.29 %

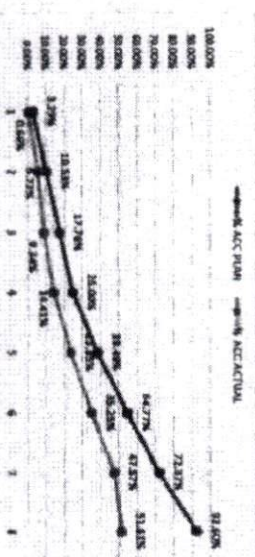

Money	เดือนที่ 1						เดือนที่ 2					
	มค	กย	ธค	มค	กย	ธค	มค	กย	ธค	มค	กย	ธค
100,000	220,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000				
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000				
% ACC PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	23.00%	38.49%	54.77%	72.37%				
% ACC ACTUAL	0.66%	5.07%	3.62%	5.07%	9.44%	11.40%	12.32%	4.02%				
% ACC DIFF					14.64%	19.52%	28.80%	40.99%				

- 1) วัตถุประสงค์ในการประเมินการดำเนินงานตามตารางงาน
- 2) วัตถุประสงค์ในการประเมินการดำเนินงานตามตารางงาน
- 3) วัตถุประสงค์ในการประเมินการดำเนินงานตามตารางงาน
- 4) Money
- 5) Accuracy
- 6) % PLAN
- 7) % ACC PLAN
- 8) % ACTUAL
- 9) % ACC ACTUAL
- 10) % ACC DIFF

นาย.....
 25 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ยพค ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกูแบจือเนาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส็ง อำเภอเมืองยะลา -
บ้านชะเมา หมู่ที่ ๕ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านกูแบจือเนาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส็ง อำเภอเมืองยะลา - บ้านชะเมา หมู่ที่ ๕ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัด
ยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกูแบจือเนาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส็ง
อำเภอเมืองยะลา - บ้านชะเมา หมู่ที่ ๕ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางยุพาวรรณ บุญอินทร์ ประธานกรรมการฯ
หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง

๒. นายณัฐนนท์ ขุนราม กรรมการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๓. นายณัศรุล เจ๊ะซู กรรมการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคณะสมบัติของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือ
เชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐรายงาน

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|---------------------------|----------------|
| ๑. นายเอกราช ยี่เส้น | ประธานกรรมการฯ |
| หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ | |
| ๒. นายชูโฮมี ชุมนุมพันธ์ | กรรมการ |
| นายช่างโยธาอาวุโส | |
| ๓. นายอามัน ตาละ | กรรมการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน | |
- อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้นและถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ๑. นายอสมิต ตาละ | หัวหน้าผู้ควบคุมงาน |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน | |
| ๒. นายอุสมาน ยูนี | ผู้ควบคุมงาน |
| ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ | |
- อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงานและรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
