

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๓๓๔/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๔๕/๑ หมู่ ๓ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัด ยะลา โดย นายโมฮัมหมัด สุแว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๒๖๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าแตรายอ หมู่ที่ ๕ - บ้านทำนบ ตำบลตานาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบบจ.ที่กำหนด) ณ สายป่าแตรายอ หมู่ที่ ๕ - บ้านทำนบ ตำบลตานาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข แห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายโมฮัมหมัด สุแว.....)



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพควบคุมงานและหนังสือรับรองช่างควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ แบบป้ายประชาสัมพันธ์และแบบแปลน จำนวน ๑๖ (สิบหก) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๐๒๐/๖๗ เลขที่ ๐๒๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๙๙,๐๒๕.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายโมอำหัด สุแว.....)



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๙๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๖๐,๔๐๖.๕๔ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่ร้อยหกบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๙๕,๖๑๒.๕๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยสิบสองบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าแตรายอ หมู่ที่ ๕ - บ้านทำนบ ตำบลตานะปุเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗


งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๙๔,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าแตรายอ หมู่ที่ ๕ - บ้านทำนบ ตำบลตานะปุเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๙๐,๗๓๗.๕๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบบาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายโมอำมหิต สุแว.....)



๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(.....)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายโมฮัมหมัด สุแว.....)



ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไปไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายโมฮัมหมัด สุแว.....)



การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขัดใจค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีการบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายโมอำหัด สุแวง.....)



ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายโมฮัมหมัด สุแว.....)

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ใช้งานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลัง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรากำลังหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลัง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๙,๙๕๑.๒๕ - บาท (เก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทยี่สิบ ห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับ จ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายโมฮัมมัด สุแว.....)



ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(.....)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(.....นายโมอ่ำหมัด สุแว.....)



ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พุทธิการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือ ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายโมฮัมหมัด สุแว.....)


ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ก่อสร้าง

๒๓.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(.....)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายโมฮัมหมัด สุแว)



สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายโมฮำหมัด สวาน)



(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๕๙๔๒๖๒๕๒

เลขคู่มือสัญญา ๖๗๐๗๒๒๐๒๔๑๖๔



อ.ส.5 ใบสัทธิหลังตราสาร

เลขที่ 02163
วันที่ 1 สิงหาคม 2567

เลขประจำตัว 0953543000081 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวาลักษณ์สร้าง

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน - ชื่ออาคาร -
ห้องเลขที่ - ชั้นที่ -
หมู่บ้าน - หมู่ที่ 5
เลขที่ 145/1 แยก -
ตรอก/ซอย - แขวง/ตำบล บางเกาะ
ถนน - จังหวัด ยะลา
เขต/อำเภอ บันนังสตา
รหัสไปรษณีย์ 95130

คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีแสดมภ์ เป็นตัว เงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราภาษีแสดมภ์ ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

| | บาท | สต. |
|---------------|-----------|-----|
| มูลค่าตราสาร | 3,720,093 | 46 |
| ค่าภาษีแสดมภ์ | 3,721 | 00 |
| เงินเพิ่ม | 0 | 00 |
| รวมเงิน | 3,721 | 00 |

จำนวนเงิน เป็นตัวอักษร (สามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 009594 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2567
เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25670801-1-02-000091

ลงชื่อ
ตำแหน่ง (นางสาวณิศา ระสินระณี)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัทธิหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภาษีแสดมภ์ของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

ที่ ยล. 000267



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953543000081

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้
 - 1 นายโมฮำหมัด สุแวง
จำนวน
 - 2 นายอาลีฟ สุแวง
จำนวน
3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้
 - 1 นายโมฮำหมัด สุแวง/
4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 145/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 28 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองศักดิ์.....

นางอามัด
ลงหุ้นด้วยเงิน

300,000.00 บาท
(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวปิยะธิดา ชุโชติ

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

(นางสาวนพวรรณ ห้วยห้อง)

นายทะเบียน



.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
สู่เศรษฐกิจ

Leading Business
Transformation





ที่ ยล. 000267

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000267

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลกร คุ้มแก้ว)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลกร คุ้มแก้ว)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)



.....

.....

.....



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
สู่สังคมดิจิทัล

Leading Business
Transformation



ว.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ

ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น

โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น

เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์

และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ โน้ตคลับ

(9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ (ลงชื่อ)..... พยาน

และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากรถเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(นายระเด่น สมะเอ)

(10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม

พาณิชย์กรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองดีการสินทร ส่วนจังหวัดยะลา

(11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น

รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ.)

(13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม

รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย

(ลงชื่อ)..... พยาน

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ

รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบ้สิ่ง

(17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สน้ำหนักสำหรับยานพาหนะทุกประเภท

รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย

(19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(20) ประกอบกิจการรวบรวมบริการอาบอบนวด

(21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่เป้าหมาย
มุ่งเติบโต

Leading Business
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี..... 28ข้อ ดังนี้

(22) ประกอบกิจการค้าวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด เครื่องเขียน แบบเขียน แบบคีย์บอร์ด อุปกรณ์การเขียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ คู่มือเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน กระดาษ

(23) ประกอบกิจการ รับออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานแบบพิมพ์ทางการก่อสร้าง รับออกแบบ โครงสร้างอาคาร รับงานตกแต่งภายใน งานตกแต่งอาคารสถานที่ให้แก่หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ บุคคลหรือ คณะบุคคลต่าง ๆ

(24) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือ ทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด รวมทั้งจำหน่ายดิน ถมดินปรับพื้นที่ หิน ทราซ เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง

(25) ประกอบกิจการให้บริการงานทางด้านระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ากำลัง รับผิดชอบอุปกรณ์ไฟฟ้า รับเดินสายไฟฟ้า ทั้ง ระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ

(26) ประกอบกิจการให้บริการงานทางด้านระบบประปา รับเดินประปา เขียนแบบและวางระบบประปา ทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับประปา

(27) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(28) ประกอบกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัย



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นางสาวปัทมา สุนว)
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
 (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ





กรมสรรพากร

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลินกก่อสร้าง

ชื่อสถานประกอบการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลินกก่อสร้าง

เป็น สำนักงานใหญ่ สาขาที่

ตั้งอยู่ อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่

หมู่ที่ ตรอก/ซอย

อำเภอ/เขต

ตำบล/แขวง

จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95130

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 13 มีนาคม 2543

ออกให้เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2543

ผู้ออกทะเบียน

(นางจิ่งเนตร ชูเกียรติ)

ตำแหน่ง


สรรพากรพื้นที่ยะลา

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ เป็นรายสถานประกอบการ ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษทัณฑ์ทางแพ่งและอาญา



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 9503 00057 60 8

ชื่อตัว นามสกุล นาย โมฮัมหมัด สุแวง



Name Mr. Mohammad

Last name Suwae

เกิดวันที่ 2 ส.ค. 2503

Date of Birth 2 Aug. 1960

ศาสนา อิสลาม



ที่อยู่ 145/1 หมู่ที่ 3 ต.บึงละแวก

อ.บ้านสิงห์ จ.ยะลา

8 มี.ค. 2567

วันออกบัตร

8 Mar 2024

Date of Issue



(นายธรรมชัย จันทร์รัตน์)

เจ้าพนักงานออกบัตร

ตลอดชีพ
 วันบัตรหมดอายุ
 LIFELONG

Date of Expiry

9503-06-03081505

BORA-8.5-01-2566



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โมฮัมหมัด



(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

.....พยาน

นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ



.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายการเดือกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9503-006134-7 สำนักทะเบียน อำเภอเมืองนิงสลา

รายการที่สู 145/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบาเจาะ อำเภอเมืองนิงสลา จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน ป่าข ลักษณ์ะบาย

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ นายทะเบียน นายประธาน ดิศร์หงศ์

วันเดือนปีที่พิมพ์ (ลงชื่อ) 11 ก.พ. 2543 (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายการแทน

(ลงชื่อ) นายกองดี บริบูรณ์วงษ์ (นางสาวศิริพันธ์ ทองเทศ) นายอำเภอเมืองนิงสลา

(ลงชื่อ) พยาน (นางสาวศิริพันธ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9503-006134-7 (นางสาวปิยฉิธา ขุโชติ)

ชื่อ นายโมฮาหมัด สุนว สัญชาติ ไทย เพศชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-9503-00057-60-8 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 2 ส.ค. 2503

มารดาให้กำเนิด ชื่อ สิริร่วมเียะ 3-9503-00057-59-4 สัญชาติ ไทย

บิดาให้กำเนิด ชื่อ นานซ 3-9503-00057-58-6 สัญชาติ ไทย

บ้านข้อมูลการทะเบียนราษฎร นายทะเบียน

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 12 ก.พ. 2529 นายประธาน ดิศร์หงศ์

ไป: นายทะเบียน



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature and a circular stamp.



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

(Handwritten signature)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

(ลงชื่อ) นายกองศลการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เมืออำหมัต สุนเว



ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาดิ้นก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ยะลา

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543

ออกให้ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556



(Handwritten signature)

.....ผู้อำนวยการเขต

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ลงวันที่..... 1 ส.ค. 2567

จำนวน..... 1 ฉบับ

ผนวก..... 1 หน้า..... 1

แบบใบเสนอราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. ข้าพเจ้า...ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง...อยู่เลขที่...๑๔๕/๑...หมู่ที่...๓... ตำบล/แขวง.....บาเจาะ.....อำเภอ.....บึงนังस्ता.....จังหวัด.....ยะลา.....โทรศัพท์.....๐๘๒-๘๒๓๕๑๘๗..... โดย.....นายโมฮัมหมัด สุแว ... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล ๕๑๐๐๙/ ...๑๗๘๓... ลงวันที่ ...๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗...โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ...จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าแตรายอ หมู่ที่ ๕ - บ้านท่าบับ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบึงนังस्ता จังหวัดยะลา ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมธนา)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่าที่ได้ระบุไว้แนบท้ายใบเสนอราคาราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น...๓,๙๙๐,๕๐๐.-.....บาท (.สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....๒๖๑,๐๖๐.๗๕.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปรารถนาแล้ว

(ลงชื่อ)..... พยาน

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.....๑๘๐.....(หนึ่งแสนแปดสิบนับสิบสอง) โดยวิธีคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ไต่ยอดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน.....๒๔๐.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา” ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน



Handwritten signature and initials.

/หากข้าพเจ้า...

ลงวันที่.....1 ส.ค. 2567

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายปาดทรายอ หมู่ที่ ๕ - บ้านท่าบ ตำบลตาดานะปุเต๊ะ
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ
ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๑๑๗๓- ๑๗๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการ
เข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปาดทรายอ หมู่ที่ ๕ - บ้านท่าบ ตำบล
ตาดานะปุเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีในวงเงินงบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
ราคากลางเป็นเงิน ๔,๐๓๕,๐๑๙.๕๐ บาท (สี่ล้านสามหมื่นห้าพันสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอ
ราคาในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับ
เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ
จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------------|----------|-----------------|
| ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาลันก่อสร้าง | เสนอราคา | ๓,๙๙๐,๕๐๐.- บาท |
| ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์สุโข | เสนอราคา | ๓,๙๙๕,๘๐๐.- บาท |
| ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค พาณิชย์ | เสนอราคา | ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท |

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่น
ข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ รายยังไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาลันก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
เป็นเงิน ๓,๙๙๐,๕๐๐.- บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) จึงเป็นราคาต่ำสุดที่ควรคัดเลือกผู้เสนอ
งงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้
ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาลันก่อสร้าง ทาง หจก. ฯ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นเงิน จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๓,๙๘๐,๕๐๐.- บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) และยินดี
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ. โดยยื่นราคาข้อเสนอ ๑๘๐ วัน (และส่งมอบงาน
ภายใน ๒๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน




(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
(นายไม้อ่ำหมัด สุแวง)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางดารุณี สองแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณกาญจน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอุสมาน ยูนี)

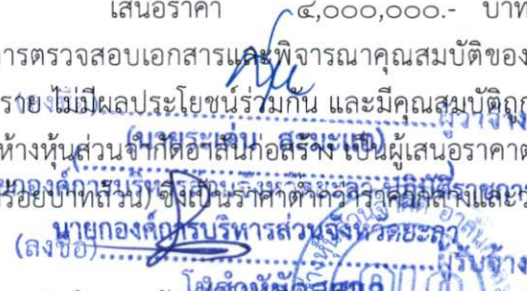

นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ
พยาน

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

จำนวน..... ๑ ฉบับ

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าแตรายอ หมู่ที่ ๕ - บ้านท่าหนบ ตำบลตาดนาปะเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน้า..... ๒ หน้า..... ๑

อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายป่าแตรายอ หมู่ที่ ๕ - บ้านท่าหนบ ตำบลตาดนาปะเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน |
|----------|---|-----------|-------|--------------|-------------|
| 1 | งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | |
| | งานดิน (EARTHWORK) | | | | |
| | งานถางป่าและขุดตอ | | | | |
| | 1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) | 3,200.000 | ตร.ม. | 2.62 | 8,384.00 |
| 2 | งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) | | | | |
| | 2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) | 1,370.500 | ลบ.ม. | 48.33 | 66,236.27 |
| 3 | งานดินคันทาง (EMBANKMENT) | | | | |
| | 3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) | 2,236.150 | ลบ.ม. | 209.34 | 468,115.64 |
| 4 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | |
| | - งานรองพื้นทาง (SUBBASE) | | | | |
| | 4.3 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) | 864.000 | ลบ.ม. | 284.00 | 245,376.00 |
| | -งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) | | | | |
| | 4.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) | 200.000 | ลบ.ม. | 855.70 | 171,140.00 |

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกัญญากร วัฒนศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกัญญากร วัฒนศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวปิยะธิดา ชูเขต)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ปริมาณที่.....๑.....ส.ค. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าแตทรายอ หมู่ที่ ๕ - บ้านท่าหนบ ตำบลตาดานะปุเต๊ะ

อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายป่าแตทรายอ หมู่ที่ ๕ - บ้านท่าหนบ ตำบลตาดานะปุเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน |
|----------|---|--------------------|-------|--------------|--------------|
| 5 | งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | |
| | -งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | | | | |
| | 5.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา...ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก | 4,000.000 | ตร.ม. | 646.32 | 2,585,280.00 |
| | 5.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | 395.000 | เมตร | 219.00 | 86,505.00 |
| | 5.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDIAL JOINT) | 800.000 (ลงข้อ) | เมตร | 94.00 | 75,200.00 |
| 6 | งานโครงสร้าง (STRUCTURES) | | | | |
| | 6.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม. | 64.000 (ลงข้อ) | ม. | 1,488.00 | 95,232.00 |
| | 6.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม. | 9.000 (ลงข้อ) | ม. | 2,900.00 | 26,100.00 |
| | 6.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม. | 44.000 (ลงข้อ) | ม. | 3,365.00 | 148,060.00 |
| 7 | งานเบ็ดเตล็ด | | | | |
| | 7.1 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS) | | | | |
| | -แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ | 0.720 | ตร.ม. | 4,435.00 | 3,191.09 |
| | 7.2 เสาป้ายจราจร (SIGNS POST) | | | | |

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าแตรายอ หมู่ที่ 5 - บ้านทำนบ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายป่าแตรายอ หมู่ที่ 5 - บ้านทำนบ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน |
|----------|--|--------|-------|--------------|--------------|
| | -เสาป้ายคอนกรีต ขนาด 0.12x0.12ม. (R.C.SIGN POST 0.12x0.12M.) (SIGNS POST) | 3.000 | ม. | 560.00 | 1,680.00 |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | 3,980,500.00 |





หมายเหตุ ลดในรายการแผ่นป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ 2.11 บาท

ตัวอักษร สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ.....

 นายโมฮัมมัด สุแว

 หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....

 (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้รับจ้าง
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....

 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ).....

 นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ
 (ลงชื่อ).....

 นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าแตรายอ หมู่ที่ ๕ - บ้านท่าบ่อ ตำบลตาดนาโง้ง ตำบลนาโง้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ผนวก.....๒ หน้า.....1.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๒.๕๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๘๙๕,๖๑๒.๕๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหกกร้อยสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
- งานทางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)
- งานตัดดินคันทาง
- งานวางท่อกลม คสล.
- งานดินถมคันทาง
- งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๐.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๙๔,๑๕๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ปริมาณของทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ๑๖๖๖.๖๖๖๖ ลูกบาศก์เมตร
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ปริมาณงานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ๑๖๖๖.๖๖๖๖ ลูกบาศก์เมตร
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint)
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๗.๕๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๙๐,๗๓๗.๕๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดกร้อยสามสิบบาทห้าสตางค์) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint) แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ และงานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของโครงการจนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน.....๑.....ฉบับ

หน้า.....๔.....หน้า.....๑.....

๑. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

P = (Po) x (K)

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ย บดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล ปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุม คุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDE

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Et/Fo

๒.๒ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กค้ำค้ำ (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึง แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๓๕ Ct/Co + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

๒.๓ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานรับระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร K = ๐.๓๕ + ๐.๒๐ It/Io + ๐.๑๕ Ct/Co + ๐.๑๕ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

- K = ESCALATION FACTOR
- It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ลงวันที่..... 1 ส.ค. 2567

จำนวน..... 1 ฉบับ

หนังสือรับรอง ผนวก..... 5 หน้า..... 1

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ หจก. อาลันก่อสร้าง

วันที่..... 1 เดือน..... สิงหาคม พ.ศ. 2567

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า..... นายณิกรพิรัชย์ หัสรินทร์ อายุ..... 55 ปี

เชื้อชาติ..... ไทย สัญชาติ..... ไทย อยู่บ้านเลขที่ 309 หมู่ที่ 4 ถนน.....

ตรอก/ซอย..... ตำบล..... เกาะกลาง อำเภอ..... เกาะลันตา จังหวัด..... กระบี่

หมายเลขโทรศัพท์..... 0 82-8235187 สถานที่ทำงาน..... หจก. อาลันก่อสร้าง

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท..... ภาควิศวกร สาขา..... โยธา

แขนง..... ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน..... กย. 35649

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด..... ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไฟฟ้าแรงดัน ม. 5-บ้านท่าแม่ ๓ จำนวน..... 1..... โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ)..... วิศวกร

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(.....)

(ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/หจก.

(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(.....)

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(.....)

คำเตือน

1. ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ลงวันที่..... 1 ส.ค. 2567



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สละมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

(ลงชื่อ)..... นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
โมอ่ำหมัด สุแส

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
นางสาวปิยะธิดา ชโชติ

ลงวันที่.....1 ส.ค. 2567.....

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายสมชาย หนู..... วุฒิ ปวส.
 สาขา.....ช่างโยธา..... ตั้งสำเนาไปประกาศ หรือ โอนอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง.....ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าแตงราย
 หมู่ 5 - บ้านท่านม ต.ตาเนาะปูเตะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
 ให้กับ บริษัท/ห้างฯ..... หจก. อาดินก่อสร้าง..... ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
 ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ.....
 หจก. อาดินก่อสร้าง..... เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....
 (นายระเด่น สมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
 (ลงชื่อ) นายกองเอก บรรณรักษ์ ส่วนจังหวัดยะลา
 โมฮัมหมัด.....

(ลงชื่อ).....
 (นายสมชาย หนู)
 ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
 พยาน

(ลงชื่อ).....
 (นายสมชาย หนู)
 ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)
 พยาน

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ..... หจก. อาสินก่อสร้าง

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ โอนอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

ลงวันที่.....1 ส.ค. 2567.....



KASEM BUNDIT UNIVERSITY

BANGKOK, THAILAND
ACADEMIC RECORD

No. 59211062

FACULTY OF วิศวกรรมศาสตร์ STUDENT CODE 57-04056-20354
 NAME (in English) MR. MASUWA YUNUH (in Thai) นาย มะสุวา ชูนี้
 NATIONALITY ไทย DATE OF BIRTH 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 PERSONAL I.D. No./PASSPORT No. I-9501-00171-15-0.
 QUALIFICATION FOR ADMISSION ปวส. (ช่างโยธา)
 DATE OF ADMISSION 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 DATE OF LEAVING ---- REASON สำเร็จการศึกษา
 DEGREE วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต DISTINCTION ----
 MAJOR วิศวกรรมโยธา DATE OF GRADUATION 9 มีนาคม พ.ศ. 2560
 REMARKS ---

| ภาคการศึกษาที่ 1, 2557 | ภาคการศึกษาที่ 2, 2558 | ภาคการศึกษาที่ 1, 2559 | ภาคการศึกษาที่ 2, 2559 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|-------|------|-----|--------|------|--------|---|----|-------|------|-----|-----|-----|--------|------|
| รหัสนักศึกษา | รายวิชา | รหัสนักศึกษา | รายวิชา | | | | | | | | | | | | | | | | |
| น.ก. | เกรด | น.ก. | เกรด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.217 | วิศวกรรมสำรวจ | วช.209 | ลูกทอวิทยา | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วค.102 | การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | วช.303 | การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.211 | วัสดุวิศวกรรม | วช.311 | ประพิกศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| คณ.109 | แคลคูลัส 1 | วช.312 | ปฏิบัติการประพิกศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วค.107 | การเขียนแบบวิศวกรรม | วช.314 | ความแข็งแรงของวัสดุ 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ฟส.110 | ฟิสิกส์ทั่วไป 1 | วช.320 | สัมมนาและรายงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CA | CS | CP | GP | GPA | CCA | CCS | CCP | CGP | GPAX | วช.326 | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ลงชื่อ)..... | 2 | B | | | | | | |
| 19 | 19 | 19 | 52.00 | 2.73 | 19 | 19 | 19 | 52.00 | 2.73 | วช.330 | วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ | 3 | C | | | | | | |
| ภาคการศึกษาที่ 2, 2557 | ภาคการศึกษาที่ 1, 2559 | ภาคการศึกษาที่ 2, 2559 | ภาคการศึกษาที่ 1, 2560 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.113 | กลศาสตร์วิศวกรรมสำหรับวิศวกรโยธา | วช.305 | การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.218 | การสำรวจเส้นทาง | วช.315 | วิศวกรรมชลศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.323 | เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสำหรับวิศวกรโยธา | วช.327 | การออกแบบคอกสกริดเสถียรเหล็ก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| คณ.110 | แคลคูลัส 2 | วช.418 | วิศวกรรมทหาร | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ฟส.111 | ฟิสิกส์ทั่วไป 2 | วช.423 | วิชา(ลงชื่อ)..... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CA | CS | CP | GP | GPA | CCA | CCS | CCP | CGP | GPAX | วช.426 | โครงการวิศวกรรมโยธา (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ) | 1 | A | | | | | | |
| 15 | 15 | 15 | 32.00 | 2.13 | 34 | 34 | 34 | 34.00 | 2.47 | วช.448 | การควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง | 2 | C+ | | | | | | |
| ภาคการศึกษาฤดูร้อน, 2557 | ภาคการศึกษาที่ 1, 2558 | ภาคการศึกษาที่ 2, 2559 | ภาคการศึกษาที่ 1, 2560 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.220 | การฝึกภาคสนามวิศวกรรมสำรวจ | วช.100 | การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.220 | การฝึกภาคสนามวิศวกรรมสำรวจ | วช.206 | ความแข็งแรงของวัสดุ 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.220 | การฝึกภาคสนามวิศวกรรมสำรวจ | วช.211 | ชลศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.220 | การฝึกภาคสนามวิศวกรรมสำรวจ | วช.212 | ปฏิบัติการชลศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.220 | การฝึกภาคสนามวิศวกรรมสำรวจ | วช.214 | วัสดุวิศวกรรมโยธา | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.220 | การฝึกภาคสนามวิศวกรรมสำรวจ | วช.208 | แคลคูลัส 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.220 | การฝึกภาคสนามวิศวกรรมสำรวจ | วช.210 | คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CA | CS | CP | GP | GPA | CCA | CCS | CCP | CGP | GPAX | วช.329 | สัญญาและการประมาณราคา | 2 | D | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 35 | 35 | 35 | 85.50 | 2.44 | วช.428 | โครงการวิศวกรรมโยธา 2 | 3 | A | | | | | | |
| ภาคการศึกษาที่ 1, 2558 | ภาคการศึกษาที่ 2, 2559 | ภาคการศึกษาที่ 1, 2560 | ภาคการศึกษาที่ 2, 2560 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.100 | การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา | วช.105 | เคมีทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.206 | ความแข็งแรงของวัสดุ 1 | วช.110 | ภาษาอังกฤษเพื่อการดำรงชีวิต | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.211 | ชลศาสตร์ | วช.166 | ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.212 | ปฏิบัติการชลศาสตร์ | CA | CS | CP | GP | GPA | CCA | CCS | CCP | CGP | GPAX | | | | | | | | |
| วช.214 | วัสดุวิศวกรรมโยธา | 19 | 19 | 19 | 35.00 | 1.84 | 90 | 90 | 90 | 192.50 | 2.13 | | | | | | | | |
| วช.208 | แคลคูลัส 3 | ภาคการศึกษาที่ 2, 2559 | ภาคการศึกษาที่ 1, 2560 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.210 | คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ | วช.329 | สัญญาและการประมาณราคา | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.210 | คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ | วช.428 | โครงการวิศวกรรมโยธา 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.210 | คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ | วช.442 | การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.210 | คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ | วช.443 | ธุรกิจก่อสร้างสมัยใหม่ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.210 | คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ | วช.447 | วิศวกรรมและการจัดการก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.210 | คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ | คณ.105 | เคมีทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.210 | คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ | คห.110 | ภาษาอังกฤษเพื่อการดำรงชีวิต | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วช.210 | คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ | คท.166 | ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CA | CS | CP | GP | GPA | CCA | CCS | CCP | CGP | GPAX | CA | CS | CP | GP | GPA | CCA | CCS | CCP | CGP | GPAX |
| 18 | 18 | 18 | 31.50 | 1.75 | 53 | 53 | 53 | 117.00 | 2.20 | 24 | 24 | 24 | 54.50 | 2.27 | 114 | 114 | 114 | 247.00 | 2.16 |



ป้ายประชาสัมพันธ์

2.40 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปาดทรายขอ หมู่ที่ 5 - บ้านท่าบ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลันก่อสร้าง ที่อยู่ 145/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดย นายโมฮัมหมัด สุเว โทร. 082-823-5187

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 2 สิงหาคม 2567 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 29 มีนาคม 2568 รวมเป็นระยะเวลา 240 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 4,000,000.00 บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 4,035,019.50 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 3,980,500.00 บาท

ผู้ควบคุมงาน

- 1. นายอสมิต ตาละ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625
- 2. นายนครล เจ๊ะซู ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทร. 0-7320-3625

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายกรรมการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โมฮัมหมัด สุเว

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1. นายนันต์ เพ็ชรการ ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.0-7320-3625
- 2. นายชอุ่ม บุญเลิศจันทร์ นายช่างโยธาอาวุโส โทร.0-7320-3625
- 3. นายอามัน ตาละ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.0-7320-3625

(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

1.20 เมตร

ลงวันที่..... 1 ส.ค. 2567

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

_____ 1.20 เมตร _____

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าแตทรายอ หมู่ที่ 5 - บ้านท่าหนบ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

0.60 เมตร

ปริมาณงาน: ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ อบจ. ยะลา
(.....วันเริ่มต้นประกันสัญญา: 2 ปี
(.....วันสิ้นสุดการรับประกัน:

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2567

วงเงินค่าก่อสร้าง : 3,980,500.00 บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกรินทร์ ทองเทศ..)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าแตรายอ - บ้านทำนบ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
สายป่าแตรายอ หมู่ที่ 5 - บ้านทำนบ ตำบลหนองขุ่น อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร (ลงชื่อ).....

สาย A STA. 0+000 - 0+780 (ไม่ข้ามหมัด สบ.)

สาย B STA. 0+000 - 0+000 (ลงชื่อ).....พยาน

รวมความยาว 0.800 กิโลเมตร (นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567 คำนำ

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 26 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงท้องถิ่น ได้ให้...

สารบัญแบบ

Table with 3 columns: รายการแบบ, แบบเลขที่, แผนที่. Includes items like ใบประเภท, คำนำ, แผนที่ตั้งเขย, แปลนถนนคสล., etc.

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปายทราย หมู่ที่ 5 - บ้านท่าบง ตำบลนาจะตุ้ระ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ความยาวจากสถานีหลักเดิมหลัก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ

รายการทั่วไป


- 1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจออกแบบและรายการค่าจ้าง ให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม... 2. วัสดุค่าจ้าง ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานหรือก่อน วัสดุใดหากมีการ...

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (ลงชื่อ) นายอดิศักดิ์... (ลงชื่อ) นายอดิศักดิ์... (ลงชื่อ) นายอดิศักดิ์...

- 15. ตำแหน่งก่อสร้างตลอดหลัสม เครื่องหมายจราจร จากระบายน้ำ และบ่อพักอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน... 16. ตำแหน่งอาคารก่อสร้างทางเชื่อมตามแนบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน...

Official stamp and signature area of องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร. Includes fields for name, position, and date.

ลงวันที่..... 1 ส.ค. 2567

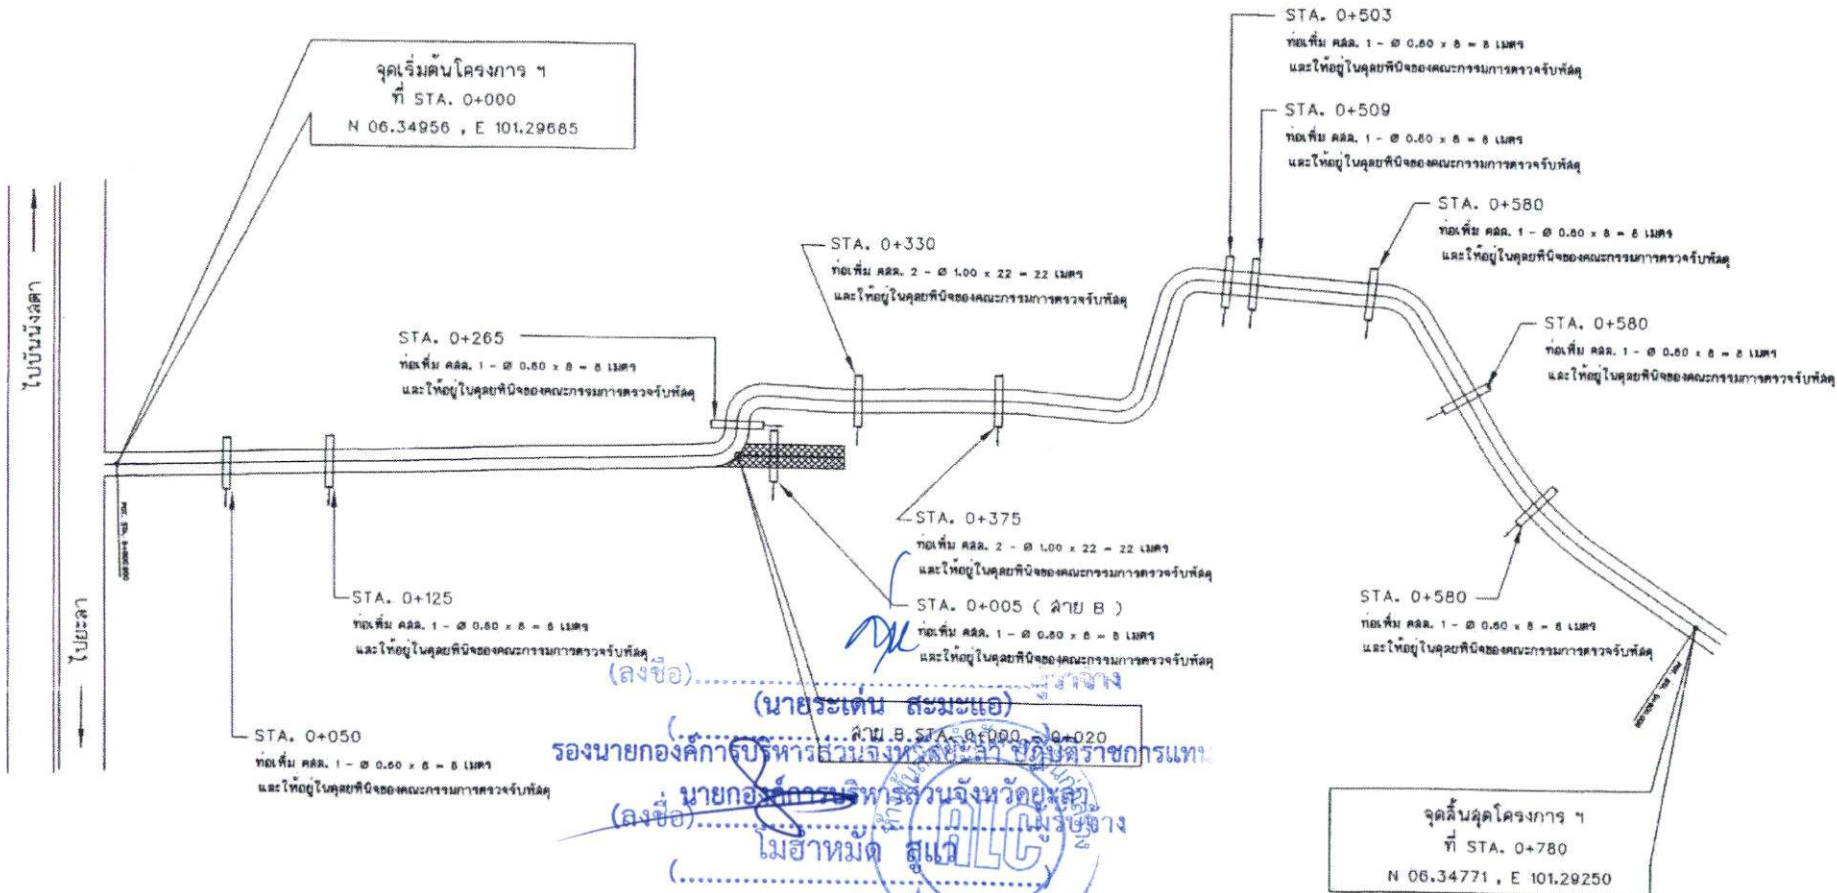


(นางระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ข้าราชการแทน
(ลงชื่อ) นายอภิรักษ์ อภิรักษ์กุล
ไม่หาหมัด สุแก้ว
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)



| องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | | | | |
|------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|-------------|
| เลขาธิการ | ตัวหนา | นายสุคนธ์ ฐิติ | เห็นชอบ | [Signature] |
| คำปรึกษา - ปราบทุกข์ | ตัวหนา | นายไฉน ชุมภักดิ์ | | |
| | ตัวหนา | นายอดิศักดิ์ ศาณะ | | |
| มอบหมาย | ตัวหนา | นายณัฐกร เจริญ | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | |
| เปลี่ยนมอบ | ตัวหนา | นายธานี ศาณะ | ทนาย | |
| ตัวหนา | ตัวหนา | นายไฉน ชุมภักดิ์ | | |
| ตัวหนา | ตัวหนา | นายสุคนธ์ ฐิติ | | |

ลงวันที่..... 1 ส.ค. 2567.....

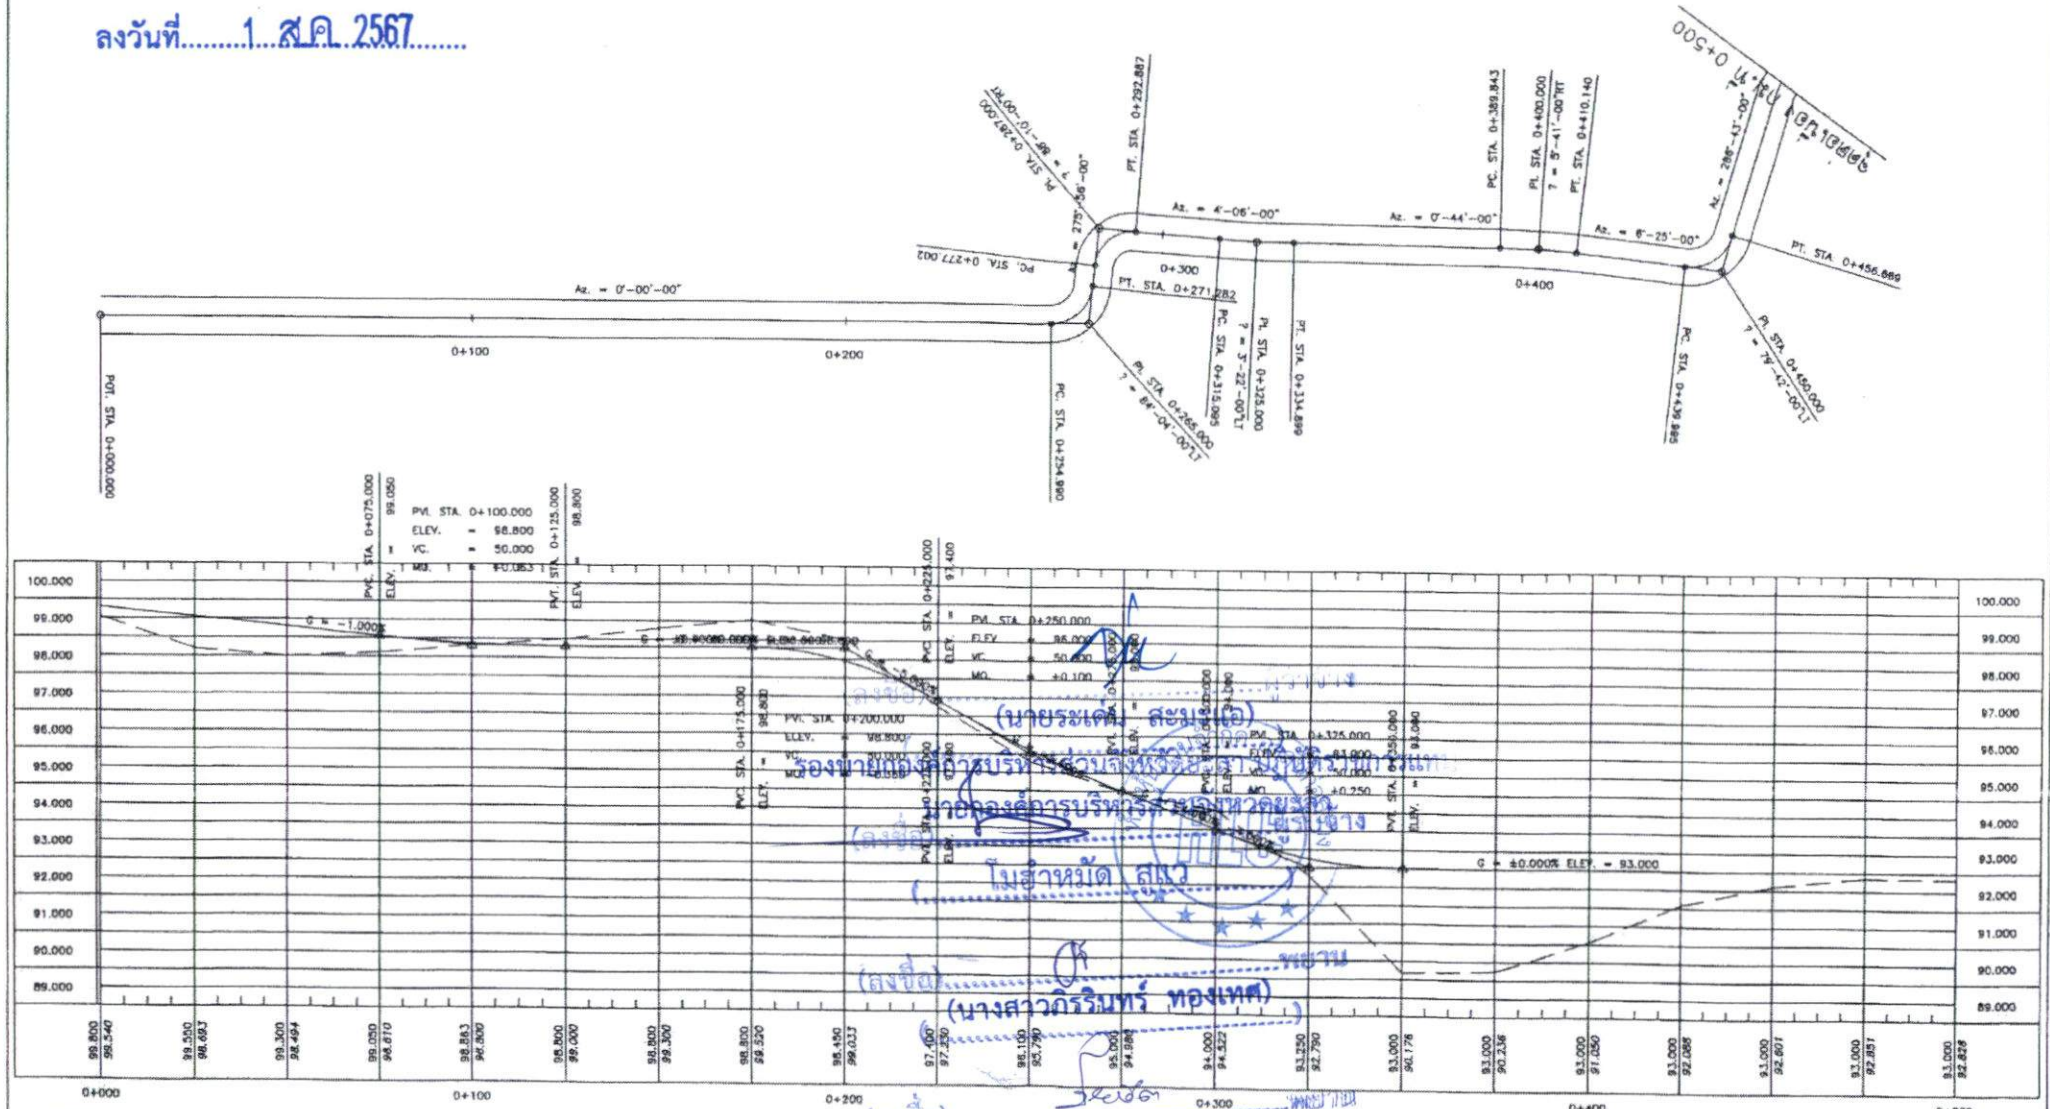

หมายเหตุ

- จำนวนที่ในแต่ละแถวและตำแหน่งในการวางท่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ยอดรวมต้องเท่าเดิม
- ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และบ่อที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- เขตทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
- งานตัด ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหิน, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอิฐ

(ลงชื่อ) นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

| | | | |
|----------------------|------------|-------------------|-----------------------------|
| ตำแหน่ง | สำรวจ | นายสุเมาน ชูชี | เป็นชอบ |
| ช่างเทคนิค - ปั่นค้ำ | สำรวจ | นายสุเมาน ชูชี | |
| | ช่างเทคนิค | นายชยศักดิ์ ศาณะ | |
| หัวหน้า | เขียนแบบ | นายนิพัทธ์ ใจศิริ | ผู้บังคับการส่วนจังหวัดยะลา |
| | เขียนแบบ | นายชยศักดิ์ ศาณะ | อนุมัติ |
| | สำรวจ | นายสุเมาน ชูชี | |


นายสุเมาน ชูชี




ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567




STA. 0+100.000
NGL = 98.800




STA. 0+200.000
NGL = 99.033




STA. 0+075.000
NGL = 98.610




STA. 0+175.000
NGL = 99.520




STA. 0+050.000
NGL = 98.494




STA. 0+150.000
NGL = 99.300



STA. 0+025.000
NGL = 98.693




STA. 0+125.000
NGL = 99.000



STA. 0+000.000
NGL = 99.540


(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สยามะเด)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวกมลทิพย์ สอน)

(นางสาวกมลทิพย์ สอน)
นางสาวปิยะธิดา ขุนดี




| องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|
| เลขาฯ | สำรวจ | นายสุคนธ์ สุวี | เก็บรอบ |
| ช่างฝ่ายช่าง - ปั้นดิน | สำรวจ | นายสุโยธิน ชูมงคลพันธ์ | [Signature] |
| | ออกแบบ | นายชวลิต ศาตนะ | |
| แบบแปลน | เขียนแบบ | นายนิรุช ธีงู | เปิดส่งการบริการส่วนจังหวัดยะลา |
| ผู้ควบคุมช่าง | ตรวจ | นายอรุณ ศาตนะ | อนุมัติ |
| แบบแปลนที่ ๑๒๕/๑๒ | หน้างานสำรวจออกแบบ | นายสุโยธิน ชูมงคลพันธ์ | |
| วันที่รับใช้ | ผู้ควบคุมช่าง | | |


ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567




STA. 0+325.000
NGL = 92.790




STA. 0+425.000
NGL = 92.088




STA. 0+300.000
NGL = 94.522




STA. 0+400.000
NGL = 91.050




STA. 0+275.000
NGL = 94.980




STA. 0+375.000
NGL = 90.236



STA. 0+250.000
NGL = 95.790




STA. 0+350.000
NGL = 90.176




STA. 0+225.000
NGL = 96.790

(ลงชื่อ) ผู้ว่าฯ
(นายระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ)
(นางสาวกฤษิรินทร์ ทองเทศ)
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)




| องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| เลขที่เอกสาร: ๐๓๓๔/๒๕๖๖ - ปีที่ ๒๕๖๖ | สำรวจ: [Signature] | นายสุรเมฆ พุฒิชัย | ช่างเขียน: [Signature] | นายอนุวัฒน์ ขุนภักดิ์ |
| แบบแปลน: ๐๓๓๔/๒๕๖๖ | ออกแบบ: [Signature] | นายสมนึก ศาตะ | นายอภิรักษ์ ศรีสุข | นายอภิรักษ์ ศาตะ |
| ผู้ควบคุมงาน: [Signature] | ตรวจสอบ: [Signature] | นายอนุวัฒน์ ขุนภักดิ์ | นายอนุวัฒน์ ขุนภักดิ์ | นายอนุวัฒน์ ขุนภักดิ์ |
| วันที่: ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ | ที่: [Signature] | นายอนุวัฒน์ ขุนภักดิ์ | นายอนุวัฒน์ ขุนภักดิ์ | นายอนุวัฒน์ ขุนภักดิ์ |


ลงวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๗




STA. 0+550.000
NGL = 92.606




STA. 0+650.000
NGL = 91.550




STA. 0+525.000
NGL = 93.066




STA. 0+625.000
NGL = 92.696




STA. 0+500.000
NGL = 92.828




STA. 0+600.000
NGL = 92.273




STA. 0+475.000
NGL = 92.851



STA. 0+575.000
NGL = 92.272



STA. 0+450.000
NGL = 92.601




(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ) นาย.....
(นางสาวปียะธิดา ชูชาติ)
นางสาวปียะธิดา ชูชาติ




องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

| | | | |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------------------|
| เลขที่เอกสาร | จำนวน | นายชุกราน ภูมิ | เงินขอบ |
| ตามประกาศ - ป้ายห้าม | จำนวน | นายสุโตมิ จรุงพันธ์ | ๑๕ |
| | ติดถนน | นายอดิศักดิ์ ศานตะ | |
| แบบแผน | เขียนแบบ | นายนิรุฒ สะระ | ปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา |
| ปฏิบัติงานจริง | เขียนแบบ | นายชานัน ศานตะ | อนุมัติ |
| แบบเสร็จ ๑๖๕.๐๐ | ตรวจ | นายสุโตมิ จรุงพันธ์ | ๑๖ |
| แบบที่ ๕ | เห็นด้วย | | |

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567

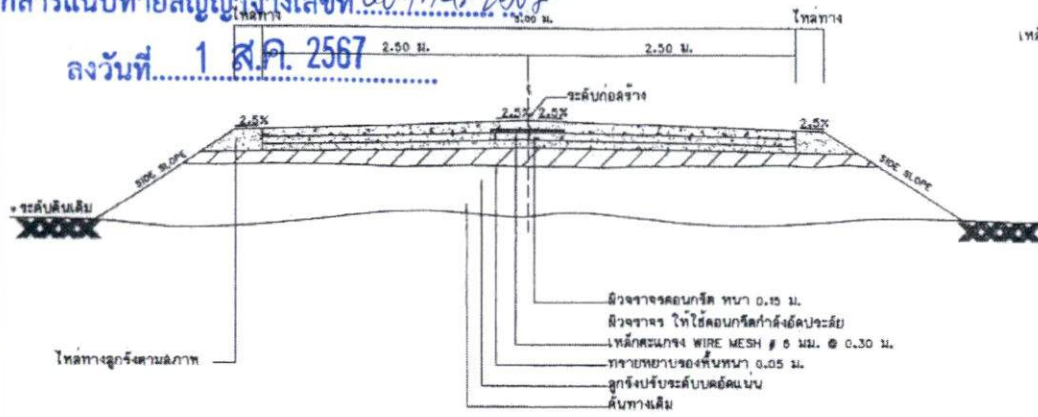

รูปตัดแนวดิ่ง โครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคูน้ำบดอัดผิว

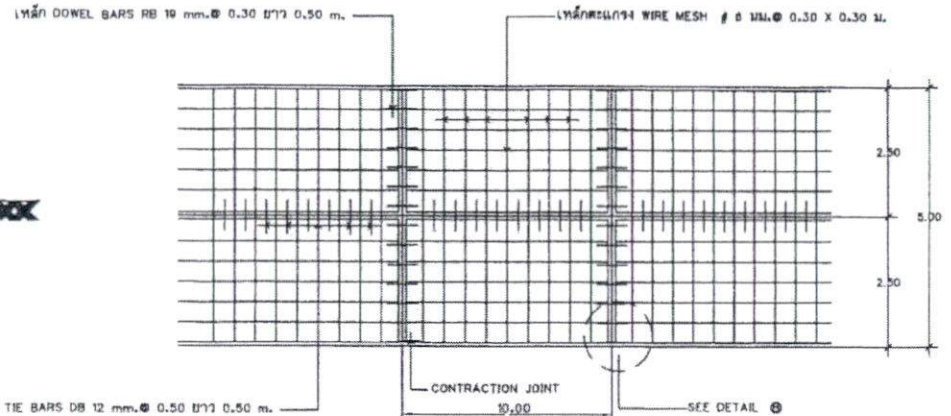

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ล.ล.

บัญชีปริมาณงาน

| ลำดับ | รายการแบบ | หน่วย | ปริมาณงาน | อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง |
|-------|--|-------|-----------|-------------------------|
| 1 | งานกำจัดวัชพืชและเศษดิน (CLEARING AND BRUBBING) | ตร.ม. | 3,200.00 | (ลงข้อ) |
| 2 | งานตัดดิน | ตร.ม. | 1,370.50 | แบบอยู่ที่ ทอ-2-201 (2) |
| 3 | งานดินถม | ตร.ม. | 2,236.15 | แบบอยู่ที่ ทอ-2-201 (3) |
| 4 | งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น ทน 20 ซม. | ตร.ม. | 884.00 | แบบอยู่ที่ ทอ-2-201 (3) |
| 5 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) | ตร.ม. | 200.00 | แบบอยู่ที่ ทอ-2-203 |
| 6 | งานผิวทางบดอัดและปูนซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ๓ | ตร.ม. | 4,000.00 | แบบอยู่ที่ ทอ-2-201 (2) |
| 7 | งานรอยต่อเมื่อตัดตามยาว (CONTRACTION JOINT) | ม. | 395.00 | แบบอยู่ที่ ทอ-2-202 |
| 8 | งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) | ม. | 800.00 | แบบอยู่ที่ ทอ-2-202 |
| 9 | งานท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. PIPE CULVERTS) ขนาด ๑.๐๐ ม. ยื่น 3 | ม. | 64.00 | แบบอยู่ที่ ทอ-2-201 (2) |
| 10 | งานท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. PIPE CULVERTS) ขนาด ๑.๐๐ ม. ยื่น 3 | ม. | 0.00 | แบบอยู่ที่ ทอ-5-101 |
| 11 | งานท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. PIPE CULVERTS) ขนาด ๑.๐๐ ม. ยื่น 3 | ม. | 44.00 | แบบอยู่ที่ ทอ-6-101 |
| 12 | งานแผ่นบดอัดผิวทางรองผิวจราจร | ตร.ม. | 0.72 | แบบอยู่ที่ ทอ-3-108 |
| 13 | งานค้ำยันคอนกรีต ขนาด ๐.12 x ๐.12 ม. | ม. | 3.00 | แบบอยู่ที่ ทอ-3-108 |

รายการก่อสร้างถนน

- การก่อสร้างถนนลาด, ในหมู่บ้านใหม่, ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด
- EXPANSION JOINT จะใช้เฉพาะกรณีที่มีเชื่อมต่อกับโครงสร้างที่มีฐานจากมันดหรือบริเวณที่แยกเป็นถนนคอนกรีต
- ใช้ความหนาของคอนกรีตแบบยืดหยุ่นหรือร้อน (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
- ใช้ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) ใช้ทรายขาวสะอาดอย่างละเอียดตาม มอก.1041
- งานบดอัดผิวจราจร (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) ใช้ทรายขาวสะอาดอย่างละเอียดตาม มอก.1041
- ใช้ปูนซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็ก (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ปูนซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็ก (COMPRESSIVE STRENGTH) ของท่อลอดคอนกรีตอย่างน้อย 15x15x15 ซม. และขนาด ๑.๐๐ ม. ยื่น ๓ เมตร
- ใช้เหล็กเสริมเหล็ก (REINFORCING BARS) ใช้เหล็กเสริมเหล็ก (REINFORCING BARS) ขนาด ๑๖ มม. และ ๑๘ มม. ตาม มอก.2๐ และ มอก.24
- ใช้เหล็ก WELDED WIRE MESH (มอก.733) ตามตารางที่ 1 และ BAR MESH ได้ โดยให้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตและแจ้งให้วิศวกรควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ โดยทางเปลี่ยนแปลนดังกล่าวให้มีผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในแบบพิมพ์พิมพ์ (STEEL AREA) ที่ใช้ต้องไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
- มีดีคัท ที่แสดงไว้บนแบบ นักจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- การคืนเงินจราจร ให้ได้เท่าเดิมแบ่งกับทางจราจร (CENTER LINE) โดยใช้หินโพลาลิก ตาม มอก.542
- ระยะเวลาการออกแบบ 15 ปี รับน้ำหนักบรรทุกทุก ระดับ ปริมาณจราจร (ADT) 200 คันต่อวัน
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 7 วัน

นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ

- หมายเหตุ
- จำนวนวันเริ่มตั้งแต่แนวเส้นส่วนที่ในการวางที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมสภาพพื้นที่ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุควบคุมงาน ทั้งนี้ควรต้องเท่าเดิม
 - ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และบ่อที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับชนิดที่จัดของวัสดุควบคุมงาน
 - โหล่ถนน ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
 - งานตัด ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหิน, งานตัดหินแฉะ และงานตัดอื่น ๆ
 - อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับรายละเอียดของส่วนที่อื่น ๆ ตามทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท


ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

| BAR MESH (fy = 1,200 Ksc) (เหล็กเส้นขนาด SR 24) | | WIRED MESH (fy = 2,750 Ksc) (เหล็กเส้นขนาดเส้นจางรูป) | |
|--|----------------------------|--|----------------------------|
| DIA / SPACING | STEEL AREA (Kg. / M.) | DIA / SPACING | STEEL AREA (Kg. / M.) |
| ๑ 6 มม. @ 0.40 ม. | 0.710 | ๑ 4 มม. @ 0.30 ม. | 0.419 |
| ๑ 9 มม. @ 0.30 ม. | 2.12 | ๑ 6 มม. @ 0.30 ม. | 0.940 |


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

| | | | |
|---------------|-------|---------------|-------------|
| เห็นชอบ | สำรวจ | นายสุเมธ ภูมิ | เก็บรอบ |
| นายสุเมธ ภูมิ | สำรวจ | นายสุเมธ ภูมิ | [Signature] |
| นายสุเมธ ภูมิ | สำรวจ | นายสุเมธ ภูมิ | |
| เห็นชอบ | สำรวจ | นายสุเมธ ภูมิ | [Signature] |
| นายสุเมธ ภูมิ | สำรวจ | นายสุเมธ ภูมิ | |
| เห็นชอบ | สำรวจ | นายสุเมธ ภูมิ | [Signature] |
| นายสุเมธ ภูมิ | สำรวจ | นายสุเมธ ภูมิ | |
| เห็นชอบ | สำรวจ | นายสุเมธ ภูมิ | [Signature] |
| นายสุเมธ ภูมิ | สำรวจ | นายสุเมธ ภูมิ | |


ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567




CONTRACTION JOINT



LONGITUDINAL JOINT




CONSTRUCTION JOINT



แบบขยายไม้กวาดลากผิวพื้น ค.ล.ล.

เหล็ก DOWEL BARS RB 19 มม.Ø 0.30 Ø77 0.50 m.

เหล็กตะแกรง WIRE MESH # 6 มม.Ø 0.30 X 0.30 m.

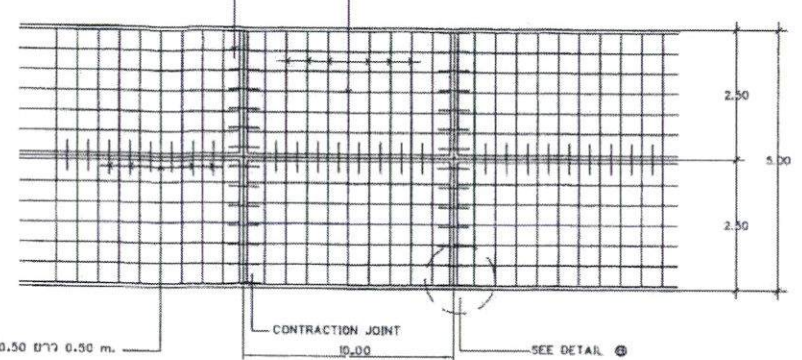

เหล็ก TIE BARS DB 12 มม.Ø 0.50 Ø77 0.50 m.

แปลนแลคกวางเสริมเหล็กถนน ค.ล.ล.

ข้อกำหนดรายการประกอบแบบก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(ไม้อำหมัด สมนะ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....


(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

- ยกเลิกความรายการประกอบแบบ ข้อที่ 1 แบบเลขที่ ทบ-2-202 มีวงจางจรคอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต ตัวอย่างรูปภาค 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 325 กก./ซม. ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปภาค 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม.
- ยกเลิกแผนทาลดลิก CONTRACTION JOINT, CONSTRUCTION JOINT ให้ใช้ตามมาตรฐาน AASHTO M.173-80 (1974) , ASTM D. 190-74 JOINT SEALER ให้ใช้ตาม AASHTO M. 153-70 , ASTM 1753-87 (1973)
- ยกเลิกใช้ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH (6 มม.) แทนเหล็กเสริมตามตารางที่ 1 ได้โดยผู้รับจ้างจะติดตั้งใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตให้พอวางก่อนติดตั้งนิมกวางและในกรณีที่มีการต่อทาบ WIRE MESH จะมีการต่อทาบจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม. ทั้งพื้นที่หน้าตัดและพื้นที่คงที่ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า MINIMUM EQUIVA STEEL AREA OF WIRE MESH ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
- เหล็กเสริมที่ใช้เหล็กเสริมมาตรฐาน มอก.20 และ มอก.24
- วัสดุที่ไม่ได้กำหนดในแบบ ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานงานหลวงชนบท มีดังนี้ "เบตง" ยกเว้นที่จะระบุเป็นอย่างอื่น
- ข้อต่อในคอนกรีตคอนกรีต EXPANSION JOINT ให้ทำรอยต่อด้วยเครื่องใส่ร่องคอนกรีต
- การทดสอบให้ใช้ CONCRETE PAVER ในกรณีที่จำเป็นต้องทดสอบการรับแรงด้นในแท่งคอนกรีตได้เฉพาะช่วงที่เว้นไว้ยาวที่สุดไม่น้อยกว่า 30 เมตร
- การกำหนดหน้าให้เทียบ ให้ทำโดยออกแบบจากออกแบบหนึ่งใบซึ่งออกแบบหน้าอย่างสม่ำเสมอ และให้ที่ต่อมกันโดยครั้งที่เกิดจะต้องไม่เกิน 2 มม.

| องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | | | | |
|------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|
| ผู้รับทราบ | สำรวจ | นายสุชนาน ชูชี | เซ็นชอ | [Signature] |
| ช่างประสานงาน | สำรวจ | นายชอุ่ม ชุมพันธ์ | | |
| | ออกแบบ | นายอดิศักดิ์ ศาตะ | | |
| แบบแสดง | เขียนแบบ | นายวิศรุต ศิริชู | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | [Signature] |
| | เขียนแบบ | นายชวิน ศาตะ | อนุมัติ | |
| | สำรวจ | นายชอุ่ม ชุมพันธ์ | | |
| นายช่างเทคนิค | นายช่างเทคนิค | นายชอุ่ม ชูชี | | |

2.40

0.30



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 210

0.35

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายปาแตรายอ - บ้านท่านม
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร

ผู้รับจ้าง ที่อยู่..... ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง..... โทร.....

วันเริ่มต้นสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา..... รวมระยะเวลา..... (ลงชื่อ)..... วัน

คณะกรรมการตรวจการจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

| | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|
| วงเงินงบประมาณ | | 1..... | ประธาน | รองนายก | กรรมการ | โทร..... |
| ราคากลางค่าก่อสร้าง | | 2..... | กรรมการ | โทร..... | โทร..... | โทร..... |
| วงเงินตามสัญญาจ้าง | | 3..... | กรรมการ | โทร..... | โทร..... | โทร..... |
| ผู้ควบคุมงาน 1..... | โทร..... | 4..... | กรรมการ | โทร..... | โทร..... | โทร..... |
| 2..... | โทร..... | 5..... | กรรมการ | โทร..... | โทร..... | โทร..... |

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

แบบแผนป้ายแด้คงรายละเอียดงานก่อสร้าง
 NOT TO SCALE

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ) พยาน


รายละเอียดป้าย

1. วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม หรือ 6 มม
2. พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
3. ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
4. โครงเคจ่าไม้ขนาด 2 x 4"
5. ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร
6. วัสดุเป็นมาตรฐานจากรูปเป็นที่ยอมรับ
7. ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของงาน

| องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | | | | |
|------------------------------|-----------|-----|--------------------|----------------------------------|
| ตำแหน่ง | ชื่อ | รูป | นามสกุล | เซ็นชื่อ |
| นายประจักษ์ - บ้านท่านม | สำรวจ | | นายสุคนธ์ บุญพันธ์ | |
| นายประจักษ์ | ช่างเขียน | | นายอภิศักดิ์ ศาปะ | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา |
| | เขียนแบบ | | นายอภิศักดิ์ ศิเร | |
| นายประจักษ์ | เขียนแบบ | | นายธานี ศาปะ | ช่างเขียน |
| | ตรวจ | | นายสุคนธ์ บุญพันธ์ | |
| นายประจักษ์ | ช่างเขียน | | นายประจักษ์ ศิเร | |

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้


 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (.....ไม้อ่ำหมัด สุแว)


 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)


 (ลงชื่อ).....นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ



ลงวันที่..... 1 ส.ค. 2567

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน (รวม) | วัสดุ ในประเทศ | วัสดุ ต่างประเทศ |
|-------------------|------------|-------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ๑ | ปูนซีเมนต์ | | | | | | |
| ๒ | กระเบื้อง | | | | | | |
| ๓ | ผ้าเพดาน | | | | | | |
| ๔ | หลอดไฟ | | | | | | |
| ๕ | คอมไฟ | | | | | | |
| รวม | | | | | xxx | xxx | xxx |
| อัตรา (ร้อยละ) | | | | | ๑๐๐ | ๗๐ | ๓๐ |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(บุคคลผู้มีอำนาจ).....
(รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปกครองราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)
(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการ
ไม้อ่ำหมัด สุแว
(.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)
(.....)
(ลงชื่อ).....
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | เหล็ก ในประเทศ | เหล็ก ต่างประเทศ |
|-------------------|--------------|-------|--------|-------------------|---------------------|
| ๑ | เหล็กเส้น | ตัน | | | |
| ๒ | เหล็กข้ออ | ตัน | | | |
| ๓ | เหล็กเส้นกรม | ตัน | | | |
| ๔ | | | | | |
| ๕ | | | | | |
| รวม | | | xxx | xxx | xxx |
| อัตรา (ร้อยละ) | | | ๑๐๐ | ๙๐ | ๑๐ |

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(
(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน
นางสาวปิยะธิดา ชูชาติ

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567

ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ
รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

| รายการ | จำนวนเงิน | อัตรา (ร้อยละ) |
|---------------------------------|-----------|----------------|
| มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ | (บาท) | |
| มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ | (บาท) | |

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

| รายการ | หน่วย | จำนวน | อัตรา (ร้อยละ) |
|-------------------|-------|-------|----------------|
| ปริมาณการใช้เหล็ก | ตัน | ตัน | |

สรุป

- เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
 - ร้อยละ ๖๐ พัสดุดังกล่าว (มูลค่า)
 - ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)
- ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
ผู้อำนวยการ

เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

ลงชื่อ..... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

()

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ)..... *ne*ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ปรึกษาด้านการเกษตร

(ลงชื่อ)..... *S*ผู้รับจ้าง
(นางสาวกัญญาพร อธิมา)

(ลงชื่อ)..... *TH*พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... *เจ๊ต๊อง*พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)



ลงวันที่..... 1 ส.ค. 2567


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | % |
|-----|----------------------|-------|-----------|--------------|----------|----|
| 1 | งานรื้อโครงสร้างเดิม | | | | | |
| | รายการ... | ลบ.ม. | | | | |
| | รายการ... | ลบ.ม. | | | | |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | |
| | รายการ... | ตร.ม. | | | | |
| | รายการ... | ตร.ม. | | | | |
| รวม | | | | | | 0% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... |
| | | | | | | | |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

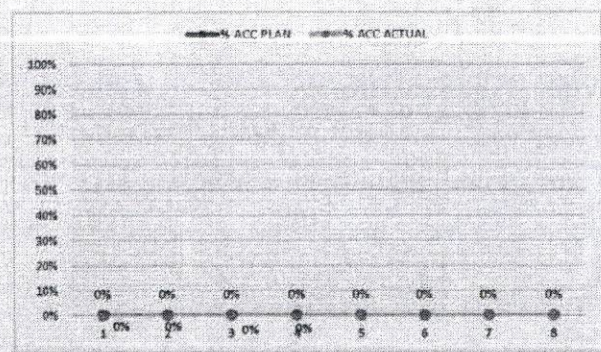


| | |
|---------------|--|
| Money | (นายระเด่น สดขยแอ) |
| AccMoney | รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน |
| % PLAN | (ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการ |
| % ACC PLAN | (นางสาวกัญฉวีพร รัตนพร) |
| % ACTUAL | (ลงชื่อ).....พยาน |
| % ACC ACTUAL | (นางสาวกัญฉวีพร รัตนพร) |
| % ACC DIFF | (ลงชื่อ).....พยาน |
| % PLAN/2 | (นางสาวกัญฉวีพร รัตนพร) |
| % PLAN/2 DIFF | |

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
 - หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
 - Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
 - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากร้อยละของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|----------------------|-------|-----------|--------------|-----------|------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| | | | | | | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค |
| 1 | งานเรือโครงสร้างเดิม | | | | | | | | | | | | | |
| | a1 | ลบ.ม. | 100 | 5,000 | 500,000 | 16% | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | |
| | a2 | ลบ.ม. | 120 | 2,000 | 240,000 | 8% | | 50 | 90 | | | | | |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | | | | | | | |
| | b1 | ตร.ม. | 400 | 2,000 | 800,000 | 26% | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | b2 | ตร.ม. | 300 | 5,000 | 1,500,000 | 49% | | | | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | รวม | | 3,040,000 | 100% | | | | | | | | |

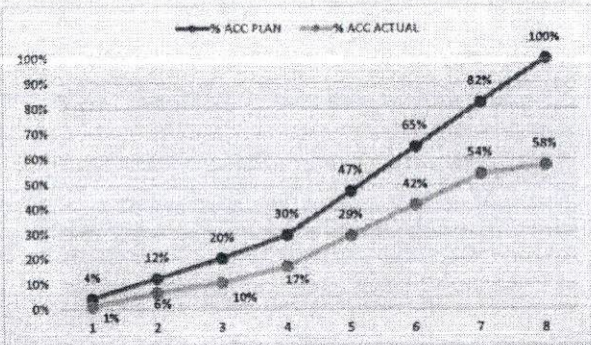

| | |
|---------------|--|
| Money | (ลงชื่อ)..... |
| AccMoney | (นายระเด่น สะมะนอ) |
| % PLAN | รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน |
| % ACC PLAN | (ลงชื่อ) นายระเด่น สะมะนอ |
| % ACTUAL | (.....ไม่อำมหัด.....) |
| % ACC ACTUAL | (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) |
| % ACC DIFF | (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) |
| % PLAN/2 | (ลงชื่อ)..... |
| % PLAN/2 DIFF | (นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ) |

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานเรือโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 5 เดือน
 - 25 หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานเรือโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
 - Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
 - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๕๓๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าแตรายอ หมู่ที่ ๕ - บ้านทำนบ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าแตรายอ
หมู่ที่ ๕ - บ้านทำนบ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้
เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าแตรายอ หมู่ที่ ๕ - บ้านทำนบ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางดารุณี สองแก้ว ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

๒. นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณกาญจน์ กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๓. นายอุสมาน ยูนี กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดใน
หนังสือเชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือ
เชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายนันต์ เพ็ชราการ

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายชูโฮมี ชุมนุมพันธ์

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

๓. นายอามัน ตาและ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายอสมิล ตาและ

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. นายนครล เจ๊ะชู

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
