

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๔๗๓/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ, ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการโยธา, ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๐ ซอย ๘ (ถนนเวฬุวัน) ถนนเวฬุวัน, ตำบลสะเตง, อำเภอเมือง ยะลา จังหวัด ยะลา, โดย นายวิระ พรหมจินดา, ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๒๙๐, ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘, แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ ๒/๗, ๒/๘, ๒/๑๑, ๒/๑๒, ๒/๑๓, ๒/๑๔, ๒/๑๕, ๒/๑๖, ๒/๑๗, ๒/๑๘, ๒/๑๙, ๒/๒๐ และ ๒/๒๑ โดยวิธีคัดเลือก ณ บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ถนนเอกราช ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิระ พรหมจินดา)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ภาคผนวก ๑ แบบป้ายและแบบก่อสร้าง จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) หน้า

๒.๒ ภาคผนวก ๒ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ภาคผนวก ๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน ๘๒ (แปดสิบสอง) หน้า

๒.๔ ภาคผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบันทึกต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๕ ภาคผนวก ๕ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ภาคผนวก ๖ หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๗ ภาคผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ ภาคผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๐๑๔๒๔/๖๘, ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท/ (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙๒,๙๕๐.๖๕ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ ๒/๗, ๒/๘, ๒/๑๑, ๒/๑๒, ๒/๑๓, ๒/๑๔, ๒/๑๕, ๒/๑๖, ๒/๑๗, ๒/๑๘, ๒/๑๙, ๒/๒๐ และ ๒/๒๑ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๖,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ ๒/๗, ๒/๘, ๒/๑๑, ๒/๑๒, ๒/๑๓, ๒/๑๔, ๒/๑๕, ๒/๑๖, ๒/๑๗, ๒/๑๘, ๒/๑๙, ๒/๒๐ และ ๒/๒๑ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๖๗๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ ๒/๗, ๒/๘, ๒/๑๑, ๒/๑๒, ๒/๑๓, ๒/๑๔, ๒/๑๕, ๒/๑๖, ๒/๑๗, ๒/๑๘, ๒/๑๙, ๒/๒๐ และ ๒/๒๑ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๘๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างดนั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)



การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๙๕๐.๐๐ - บาท (สองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พรหมจินดา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)



ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาก่อสร้าง

๒๓.๒ สาขาโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๘๙๕๐๖๑๑๙

เลขคู่สัญญา ๖๘๐๙๒๒๐๒๔๑๑๓



อ.ส.5 ใบสัณห์หลังตราสาร

เลขที่ 00020

วันที่ 2 ตุลาคม 2568

เลขประจำตัว 0953555000413

เลขที่สาขา

ชื่อผู้เสียภาษีอากร ด้านหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการการโยธา

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน 95990275200

ชื่ออาคาร -

ห้องเลขที่ -

พื้นที่ -

หมู่บ้าน -

เลขที่ 10

หมู่ที่ -

ตรอก/ซอย ซอย 8 (ถนนเวสุวัน)

แยก -

ถนน เวสุวัน

แขวง/ตำบล สะเตง

เขต/อำเภอ เมืองยะลา

จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95000

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238

เลขที่สาขา

ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียภาษีแถมเป็นเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราภาษีแถมปี ย่อ 23
ลักษณะตราสาร คู่ฉบับ ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	2,757,009	35
ค่าอากรแถมปี	5	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	5	00

จำนวนเงิน เป็นตัวอักษร (ห้าบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 000038

ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2568

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25681002-1-02-000002

ลงชื่อ

ตำแหน่ง (นางสาวณิชา ระกินะ)

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณห์หลังตราสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแถมปีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01424/68

วันที่ 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูตากรการโยธา

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21 เป็นเงินสด	147,500.00	สัญญาเลขที่ CNTR-00473/68
รวมเงิน		147,500.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางสาวนิรุติหิษาน สะแลแม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา
เลขที่บัญชี 909-1-00521-1 วันที่ 30 กันยายน 2568

: 147,500.00 บาท

รวม : 147,500.00 บาท

ที่ ยล. 000290



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953555000413

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติการการโยธา

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายวิระ พรหมจินดา

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

1,800,000.00 บาท

2. นางสาวจันทร์เพ็ญ สังขรัตน์พันธุ์

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

200,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายวิระ พรหมจินดา/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 10 ซอย 8 (ถนนเวฬุวัน) ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 23 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมี
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางนงะ สีแก้ว)

(ลงชื่อ).....

นายทะเบียน

(นายวิระ พรหมจินดา)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

พยานกรรมการ

(นางสาวภริณทร ทองเทศ)

กรรมการ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

(ลงชื่อ).....พยาน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

(นางสาววิมลพร ปานเกิด)
Leading Business
Transformation



ที่ ยล. 000290



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ยล. 000290

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริณีย์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณิพัทธ์ ปานเกิด) Leading Business Transformation



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ว.2 (ว.พิเศษ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์



วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
 - (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
 - (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
 - (4) คุ้มเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้คุ้มเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น
- โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหนี้สิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีกวิธีอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 - (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กิตติาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับคำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการคำประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรม (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

วิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

- (17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักผ่อนอาบอากาศ สวนน้ำ สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง

- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

- (19) ประกอบกิจการซักผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

- (22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(ลงชื่อ).....พยาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce(นางสาววิมลพร ปานเกิด)
Leading Business
Transformation

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....23.....ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมียาสี
เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และ
อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ).....กรรมการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินต).....

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่เศรษฐกิจ
(นางสาวอินพร ปานเกิด)
Leading Business
Transformation





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 19500684000390 วันที่ออกเอกสาร : 1 เมษายน 2568 เวลา 10.31 น.

สำเนาถูกต้อง

แบบ ทส. 2

รายการจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วน จำกัด ฐานภาษีเงินได้

ทะเบียนเลขที่ 0953555000413

(นางนพาสี สืบแก้ว)



ข้อ 1. ชื่อห้างหุ้นส่วน "ห้างหุ้นส่วน" นายทะเบียน
เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา

ข้อ 2. ห้างนี้เป็นห้างหุ้นส่วน ตามชนิดนิติบุคคลจำกัด วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้ ข้อ ดังปรากฏใน แบบ 2. ที่แนบ

ข้อ 3. สำนักงานของห้างหุ้นส่วน มี _____ แห่ง คือ

สำนักงานใหญ่ เลขรหัสประจำบ้าน [] [] [] [] [] [] [] [] ตั้งอยู่ที่ _____ อาคาร _____
ห้องเลขที่ _____ ชั้นที่ _____ หมู่บ้าน _____ หมู่ที่ _____ ตรอก/ซอย _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หมายเลขโทรศัพท์ _____
หมายเลขโทรสาร _____ E-mail _____
ชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มีดังนี้
1. _____ 2. _____

สำนักงานสาขา (1) เลขรหัสประจำบ้าน [] [] [] [] [] [] [] [] ตั้งอยู่ที่ _____ อาคาร _____
ห้องเลขที่ _____ ชั้นที่ _____ หมู่บ้าน _____ หมู่ที่ _____ ตรอก/ซอย _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หมายเลขโทรศัพท์ _____
หมายเลขโทรสาร _____ E-mail _____

ข้อ 4. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนมีจำนวน 2 คน ดังนี้

(ก) ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และสิ่งที่นำมาลงหุ้นของหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด จำนวน 1 คน มีดังนี้

ข้าพเจ้าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ยินยอมให้จดทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ในรายการจดทะเบียนนี้ เพื่อให้ประโยชน์ของทางราชการ

(1) นายวิระ พรหมจินดา อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย

☒ ถีอบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-915199-0-0137-60-1

☐ ถีอบัตรอื่น ๆ (ระบุ) _____ เลขที่ _____

อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ _____ ถนน _____ แขวง _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ เมืองยะลา จังหวัด _____ เขต _____ หมายเลขโทรศัพท์ 099-3598263

อาชีพ นักธุรกิจ ชื่อ _____ ลงหุ้นด้วย เงิน จำนวนทั้งสิ้น 1,800,000 บาท

(ส่วนลงหุ้นเดิมจำนวน 300,000 บาท เพิ่ม / ลด จำนวน 1,500,000 บาท)

(ลงลายมือชื่อ) วิระ พรหมจินดา

(2) _____ (ลงชื่อ) _____ ปี สัญชาติ _____ ผู้ว่าจ้าง

☐ ถีอบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ [] [] [] [] [] [] [] []

☐ ถีอบัตรอื่น ๆ (ระบุ) _____ เลขที่ _____ (นายระเด่น สมะแอ)

อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์ _____

อาชีพ _____ ชื่อ _____ ลงหุ้นด้วย _____

(ส่วนลงหุ้นเดิมจำนวน _____ บาท เพิ่ม / ลด จำนวน _____ บาท)

(ลงลายมือชื่อ) _____

(ลงลายมือชื่อ) วิระ พรหมจินดา (ลงชื่อ) _____

_____ (นางวิระ พรหมจินดา)

หน้า _____ ของจำนวน _____ หน้า (ลงลายมือชื่อ) _____ นายทะเบียน

เอกสารประกอบคำขอที่ 95-0-02-6-6-0-8-1-1-00 (ลงชื่อ) _____ (นางนพาสี สืบแก้ว) พยาน


* E-mail ที่ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารและติดต่อกับนิติบุคคลอีกทางหนึ่ง และในกรณีที่มีการระบุชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) จะต้องระบุ E-mail นี้ด้วย (นางสาวกรรณิกร ทองเทศ)

(ลงชื่อ) _____ (นางสาวกรรณิกร ทองเทศ)

(นางสาวกรรณิกร ทองเทศ)

พยาน





สำเนาถูกต้อง



แบบ พส. 2

(ข) ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และสิ่งที่นำมาลงหุ้นของหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ จำนวน.....คน มีดังนี้
ข้าพเจ้าเป็นหุ้นส่วนทุกคนจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ที่นี้ยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ในรายการจดทะเบียนนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

(1) นางสาวจันทร์เพ็ญ สังขรัตน์พันธุ์

นายทะเบียน

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-95999-00063-88-7

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ).....

อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ - ถนน เวฬุวัน ตำบล/แขวง สะเตง

อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 082-5653519

อาชีพ นักธุรกิจ ชื่อ - ลงหุ้นด้วย เงิน จำนวนทั้งสิ้น 200,000 บาท

(ส่วนลงหุ้นเดิมจำนวน.....บาท เพิ่ม / ลด จำนวน.....บาท)

(ลงลายมือชื่อ) จันทิมาพร ปานเกิด

(2)อายุ.....ปี สัญชาติ.....

☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ []

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ).....

อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์.....

อาชีพ.....ชื่อ.....ลงหุ้นด้วย.....จำนวนทั้งสิ้น.....บาท

(ส่วนลงหุ้นเดิมจำนวน.....บาท เพิ่ม / ลด จำนวน.....บาท)

(ลงลายมือชื่อ).....

(3)อายุ.....ปี สัญชาติ.....

☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ []

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ).....

อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์.....

อาชีพ.....ชื่อ.....ลงหุ้นด้วย.....จำนวนทั้งสิ้น.....บาท

(ส่วนลงหุ้นเดิมจำนวน.....บาท เพิ่ม / ลด จำนวน.....บาท)

(ลงลายมือชื่อ).....

(4)อายุ.....ปี สัญชาติ.....

☐ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ []

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ).....

อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์.....

อาชีพ.....ชื่อ.....ลงหุ้นด้วย.....จำนวนทั้งสิ้น.....บาท

(ส่วนลงหุ้นเดิมจำนวน.....บาท เพิ่ม / ลด จำนวน.....บาท)

(ลงลายมือชื่อ).....

(ลงลายมือชื่อ) ธีระ พรหมจินดา

(.....นายธีระ พรหมจินดา

(นายธีระ พรหมจินดา) ข จังหวัดยะลา

หน้า.....2.....ของจำนวน.....2.....หน้า ห้างหุ้นส่วน.....จำกัด.....

เอกสารประกอบคำขอที่.....950025508110.....(ลงลายมือชื่อ).....นายทะเบียน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....นายทะเบียน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)





ข้อ 5. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน มี 1 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นายวิระ พรหมจินดา (2)
(3) (นางนพาสี แก้ว)
(5) นายทะเบียน
(6) สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา

ข้อ 6. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้

- ไม่มี -

ข้อ 7. ตราของห้างหุ้นส่วน มีดังที่ประทับไว้



ข้อ 8. รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ มีดังนี้

- ไม่มี -

รายการจดทะเบียนนี้ทำขึ้นโดยความตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงลายมือชื่อ) วิระ พรหมจินดาหุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....นายวิระ พรหมจินดา.....)

(ลงชื่อ).....

หน้า.....3.....ของจำนวน.....3.....หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 297 / 2568

ห้างหุ้นส่วน จำกัด ศึกษารายงาน

(ลงลายมือชื่อ)นายทะเบียน

(ลงชื่อ) (นางสาวกัญญาพร จาวาสุม)พยาน

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/02_hs/form_hs2.pdf (นางสาวกัญญาพร จาวาสุม)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)





บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 9599 00137 60 1
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย วีระ พรหมจินดา

Name Mr. Wira

Last name Phromchinda

เกิดวันที่ 3 ก.ค. 2511

Date of Birth 3 Jul. 1968

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 10 ซ.8 (ถนนเวฬุวัน) อ.เวฬุวัน

ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

9 ธ.ค. 2564

วันออกบัตร

9-Dec-2021

Date of Issue

(นายธานี ศรีจ๊ะ)
เจ้าพนักงานออกบัตร

2 ก.ค. 2573

วันบัตรหมดอายุ

2 Jul. 2030

Date of Expiry



9599-05-12091109

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

BORA-10.8-07-2563

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



THAILAND

ME3-1513665-56

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวีระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9599-027520-0

สำนักทะเบียน

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายการที่อยู่ 10 ซอย 8 (ถนนเวฬุวน) ถนนเวฬุวน

ตำบลละเตาะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน ทั่วไป

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 13 สิงหาคม 2556

ลงชื่อ

[Signature]

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน

1

[Signature]

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

9599-027520-0

ลำดับที่ 2

ชื่อ นายวีระ พรหมจินดา

สัญชาติ

[Signature]

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-9599-00137-60-1 สถานภาพ

(ลงชื่อ)

ผู้อาศัย

เกิดเมื่อ

ผู้ว่าจ้าง

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ทา

(นายระเด่น สะมะแอ)

สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ อรุณ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

3-9599-00137-57-1

สัญชาติ ไทย

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

* มาจาก 7 ซ. จินากุล (จันทร์ เกษมอุทิศ) อ. อุทามะ

ต. สะเตง อ. เมืองยะลา จ. ยะลา

เมื่อ 9 ธ.ค. 2564

(ลงชื่อ)



นายทะเบียน

(นายวีระ พรหมจินดา)

นายทะเบียน

(ลงชื่อ)

[Signature]

พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

3

(ลงชื่อ)

[Signature]

พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ทะเบียนเลขที่ 0953555000413



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตาการโยธา

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ออกให้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พรหมจินต)

(นางสาวกัญญา พงษ์อภิลักข)

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

๕๗๗

พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

สำนักงาน รหัสสาขา 909
Office

บัญชีเลขที่ 909-0-75930-1
Account No.

สาขา ยะลา

ชื่อบัญชี
Account Name

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิตาการกรโยธา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 6269771

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

วันที่อนุมัติ 16/12/2559

ลำดับการลงทะเบียน M-2559-053655

วันที่เริ่มใช้งาน 16/12/2559

สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

1.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0953555000413) ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล

2.ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการโยธา

ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) THITAKORN KARNYOTA LIMITED PARTNERSHIP

3.ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 10

หมู่ที่

ตรอก/ซอย ซอย8 (ถนนเวฬุวัน)

ถนน เวฬุวัน

ตำบล/แขวง สะเตง

อำเภอ/เขต เมืองยะลา

จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95000

โทรศัพท์ 0892946071

อีเมล thitakorn6071@gmail.com

4.กรณีบุคคลธรรมดา

(เลขประจำตัวประชาชน -)

วัน/เดือน/ปีเกิด

สัญชาติ ไทย

5.กรณีนิติบุคคล

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953555000413

วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/08/2555

จดทะเบียนที่ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

ทุน

(1) เงินทุนจดทะเบียน

500000.00 (บาท)

6.ประเภทของการประกอบกิจการ

ประเภทกิจการ

ประเภทสินค้าและหรือบริการ

☐ ผลิต☐ วัสดุครุภัณฑ์☐ ส่งออก☐ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง☐ ขายส่ง☒ จำหน่าย☐ ขายปลีก☒ จำหน่าย☒ ให้บริการ☐ เช่า ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สมงาม) จ้างที่ปรึกษา

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

☒ กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกลงโทษเป็นผู้ใช้งาน☒ กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดๆอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบ

หมายเหตุ : แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสารการเสนอราคา กับหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการ (แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP) และแก้ไข

เพิ่มเติมที่กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าเป็นผู้ดำเนินการกับหน่วยงานภาครัฐที่สัญญาที่มีมูลค่าตามจำนวนเงินดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP

(ลงชื่อ)

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ที่ 18457/2568

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (TMS-GP-SME)สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา (อาคารซี)
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า
นาย วีระ พรหมจินดา
ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตตาการการโยธา
ภาคธุรกิจ: ภาคบริการ ขนาดธุรกิจ: ขนาดย่อม (SMALL)

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0953555000413
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันที่ยื่น	1 กรกฎาคม 2568

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2569 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายวีระ แก้วก่อ

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(นายวีระ พรหมจินดา)

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562

และตามรายได้ที่ระบุไว้ในการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2567

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

สสว.

สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME



ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

0-9535-55000-41-3

ชื่อผู้ประกอบการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรการโยธา

ชื่อสถานประกอบการ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรการโยธา

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 10

หมู่ที่ 8 (ถนนเวฬุวัน)

เลขที่ 10

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตำบล/แขวง สะเตง

อำเภอ/เขต เมืองยะลา

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95000

โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 21 สิงหาคม 2560

(ลงชื่อ) นายวิมล ธรรมจินดา

ออกให้เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 61

ผู้ออกทะเบียน

(ลงชื่อ) นายวิมล ธรรมจินดา

ตำแหน่ง

(นายสมชาย ธรรมจินดา)

(นางสาวกิริณี ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) นายวิมล ธรรมจินดา

พยาน

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ
เป็นรายสถานประกอบการ ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษทางอาญา
คำเตือน
12950010-25650118-1-02-0000110-09-12950010-12950010-1-02-25650118-0-0-0034-04 12950000

ผนวก.....1.....มีหน้า.....1.....ถึง.....20.....

ป้ายประชาสัมพันธ์

จำนวน.....1.....ฉบับ

ผนวก.....1.....มีหน้า.....1.....ถึง.....20.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ตรวจตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ ๒๕ ชม. สีขาว

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2.40 เมตร



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

งานจ้างก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

ปริมาณงาน : จ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21 (ตามแบบอบจ. ที่กำหนด) (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตตาการโยธา ที่อยู่ 10 ซอย 8 (ถนนเวฬุวัน) ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (นายวิระ พรหมจินดา)

โทร. 082-565-3519

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

ระยะเวลา : เริ่มต้นสัญญา 1 ตุลาคม 2568 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 27 มิถุนายน 2569 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน

ค่าก่อสร้าง : 2,950,000 บาท

(ลงชื่อ).....
(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

(ลงชื่อ).....
(นางสาวธนพร ปานเกิด)



หมายเหตุ : 1. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่มั่นคงแข็งแรงป้องกันแผ่นป้ายล้ม ให้เหมาะสมกับสภาพสถานที่ ที่ติดตั้งป้าย 2. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ และลูกจ้างประจำ อบจ.ยะลา

บ้านเลขที่ 2/7 , 2/8 , 2/11 , 2/12 , 2/13 , 2/14 , 2/15 , 2/16 , 2/17 , 2/18 , 2/19 , 2/20 , 2/21
บริเวณ ถ.เอกราช ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น ต๊ะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ทองเทศ)

ผู้ช่วยสาราณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ผนวก.....1 มีหน้า.....3 ถึง 20



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ อบจ. ยะลา เลขที่
2/7 2/8 2/11 2/12 2/13
2/14 2/15 2/16 2/17 2/18
2/19 2/20 2/21

แบบแสดง
ผังบริเวณ

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 29/7/2568

แผ่นที่ 1/18 จำนวน
A-01 18 แผ่น

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

ประธาน

นายเอกราช ชื่น
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

กรรมการ

นายสุพริ้งค์ รอดคอม
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
กรรมการ

นายคมกริช เขียวแก้ว
ผู้อำนวยการช่างโยธา

นายสุพริ้งค์ รอดคอม
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

นายสุพริ้งค์ รอดคอม
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

นายสุพริ้งค์ รอดคอม
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

นายสุพริ้งค์ รอดคอม
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

นายสุพริ้งค์ รอดคอม
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

นายสุพริ้งค์ รอดคอม
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

นายสุพริ้งค์ รอดคอม
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

นายสุพริ้งค์ รอดคอม
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน


นายสุพริ้งค์ รอดคอม
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

นายสุพริ้งค์ รอดคอม
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

นายสุพริ้งค์ รอดคอม
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

นายสุพริ้งค์ รอดคอม
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

นายสุพริ้งค์ รอดคอม
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

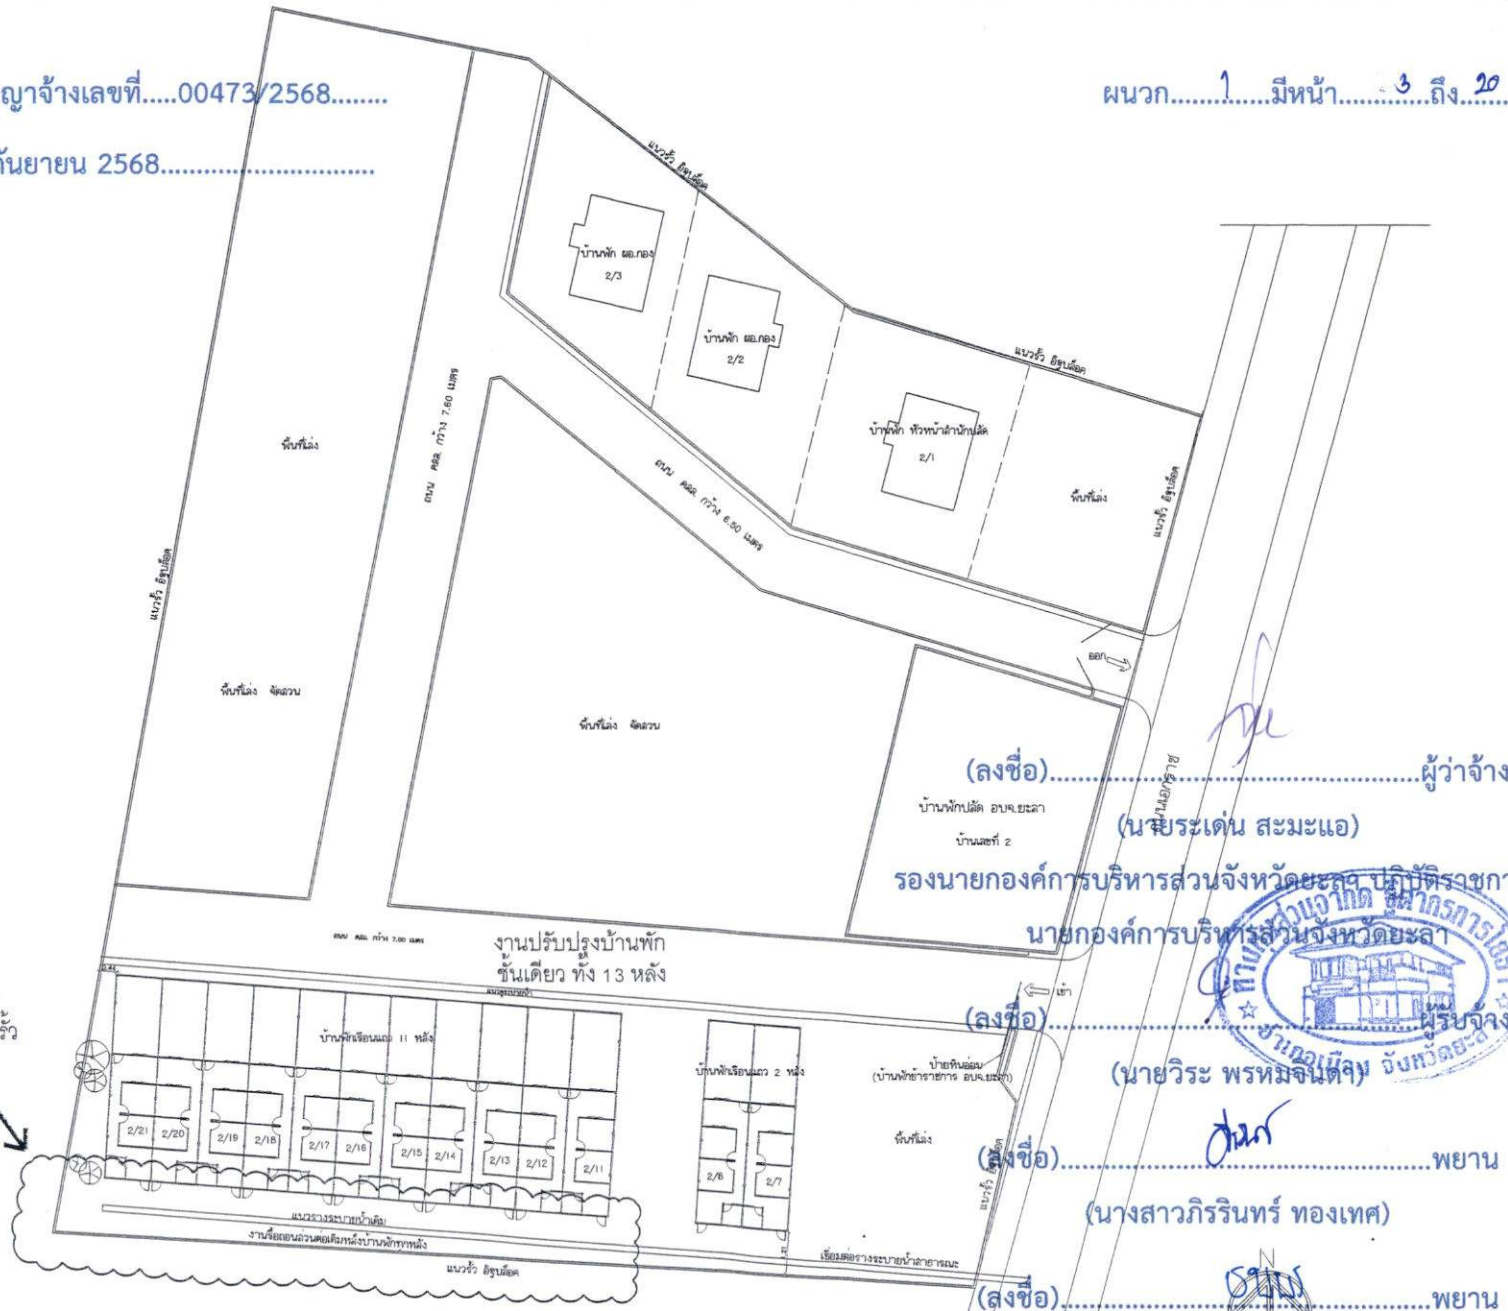

รื้อถอนส่วนต่อเติม
ด้านหลังของบ้านพักทั้ง 11 หลัง
เทพื้นคอนกรีต ด้านหลังอาคารถึงรั้ว

ผังบริเวณ บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ อบจ. ยะลา บริเวณถนนเอกราช

SCALE

NON

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....


ผนวก.....1.....มีหน้า.....4.....ถึง 20

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....บ้านพักเรือนแถว 11 หลัง

บ้านพักเรือนแถว 2 หลัง

2/21 2/20 2/19 2/18 2/17 2/16 2/15 2/14 2/13 2/12 2/11

2/8 2/7

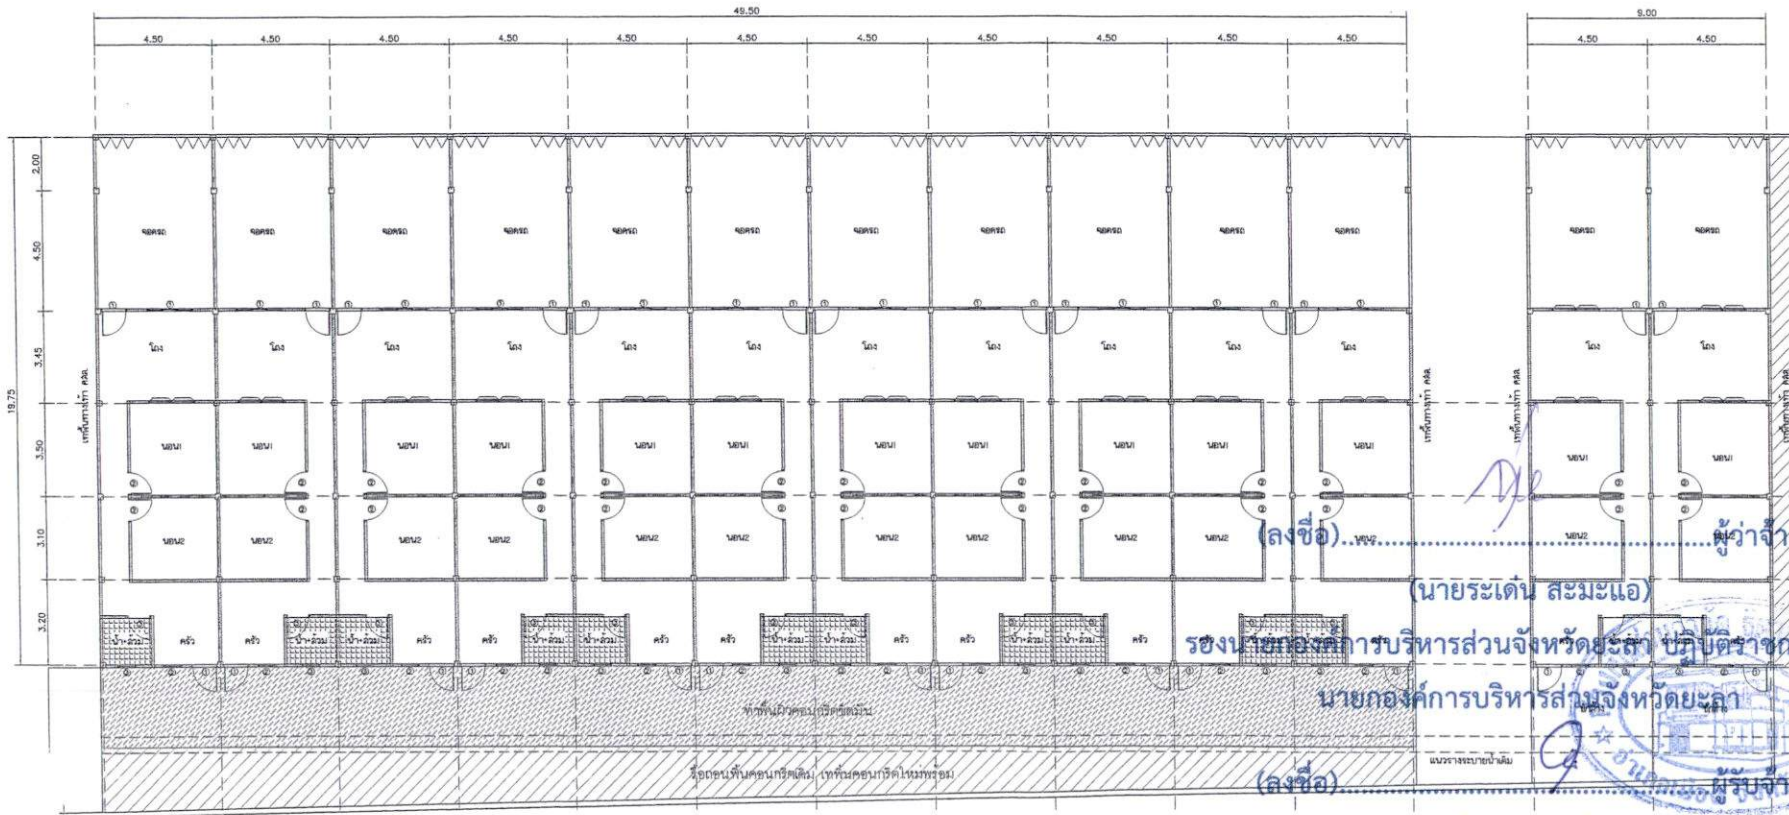

ขอบเขตงานซ่อมแซม บ้านพักเรือนแถว 11 หลัง

1. ผนังภายนอกและภายใน สู้ดโป๊วรอยแตกร้าวและฉีกที่ความสูงอาคาร แล้วทาสีขาวรองพื้นปูนเก่า แล้วจึงทาสีทับด้วยสีน้ำอะคริลิก สำหรับภายนอกและภายใน
2. วงกบประตูหน้าต่างที่ไม้เนื้ออ่อน สู้ดโป๊ว และขัด ทำความสะอาดทาสีน้ำมันในทั้งวงกบ
3. ฝ้าเพดานภายใน ฝ้าแบบฝ้าเพดานออกทั้งหมด และติดตั้งใหม่ทดแทนของเดิม และติดตั้งฝ้าเพดาน โครงสร้าง T-BAR ขุดกันขึ้นในห้องน้ำ
4. รื้อถอน ประตูไม้พร้อมวงกบเดิมออก พร้อมติดตั้งประตู UPVC พร้อมวงกบใหม่
5. ขัดทำความสะอาดพร้อม ยาสีฟันและเช็ดเงา ห้องน้ำ โถง
6. ติดตั้งสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด ตามแบบ ขยายห้องน้ำ
7. ฉาบซ่อมผนังที่แตกร้าว ทาสีรองพื้นปูนเก่า ทาสีน้ำอะคริลิกและผนังภายนอก ทาสีน้ำอะคริลิกและผนังภายใน
8. รื้อถอนโครงสร้าง (ส่วนคาน้ำหลังบ้าน) ออกทั้งหมด เพื่อก่อสร้างคาน้ำใหม่ พร้อมเชื่อมระบบระบายน้ำ
9. ติดตั้งชุดโคมไฟพร้อม หลอดไฟ แอลอีดีตัวบี ขนาด 18 วัตต์และแสงสีอบอุ่น พร้อมสายและปลั๊กสาย พร้อมสวิตช์ และตัวรับใหม่
10. ติดตั้งมุ้งลวดตามผนังห้องเดิมที่ชำรุดเสียหาย
11. รื้อถอน และติดตั้ง ประตู ป.1, ป.2 และ ป.3 ใหม่ทดแทนบานเดิมที่ชำรุด
12. รื้อถอน และติดตั้ง หน้าต่าง น.1, น.2 และ น.3 ใหม่ทดแทนบานเดิมที่ชำรุด
13. รื้อถอน และติดตั้ง หน้าต่าง น.1, น.2 และ น.3 ใหม่ทดแทนบานเดิมที่ชำรุด

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ อบจ. ยะลา เลขที่
2/7 2/8 2/11 2/12 2/13
2/14 2/15 2/16 2/17 2/18
2/19 2/20 2/21

แบบแสดง
แปลนพื้นอาคาร

มาตรฐาน 1 : 100

วันที่ 29/7/2568

แผนที่ 2/18 จำนวน
A-02 18 แผ่น

คณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียด

ประธาน

นายเอกราช ยี่สิบ
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

กรรมการ

นายไพโรจน์ รอดขอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

กรรมการ

นายคมกริช เขียวแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายไพโรจน์ รอดขอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

วิศวกร

นายณัฏฐพงศ์ คุณาธิษฐานกุล
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

พิจารณา

นายณัฏฐพงศ์ คุณาธิษฐานกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ

1. ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เปิดใช้
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งให้ทราบ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งให้ทราบ
4. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งให้ทราบ
5. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งให้ทราบ
6. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งให้ทราบ
7. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งให้ทราบ
8. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งให้ทราบ
9. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งให้ทราบ
10. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งให้ทราบ
11. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งให้ทราบ
12. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งให้ทราบ
13. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งให้ทราบ

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568..

12
18.00

⑪

10

50.  1 มีหน้า 5 ถึง 20



แบบแปลนพื้นอาคาร	
Scale	1: 100

- ① ถ้า T-bar (ติดลงภายในตัว) **นางสาวธนพร ปานเกิด**
 ② ถ้าไม่รวมชนิดตัวเชื่อมที่ติดอยู่
 ③ ถ้า T-bar ติดกันขึ้น (ติดกันที่หัวท่อน้ำ)
 ④ ขึ้นภายใน ตัวเชื่อมขาขวา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 ⑤ กระเบื้องพื้นห้องน้ำ ติดกันขึ้น ขนาด 8" x 8"
 ⑥ ขึ้นภายใน ตัวเชื่อมขาขวา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ อบจ. ยะลา เขตที่ 1
2/7 2/8 2/11 2/12 2/13
2/14 2/15 2/16 2/17 2/18
2/19 2/20 2/21

แบบแสดง

แปดพันห้า

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 29/7/2568

แผ่นที่	3/18	จำนวน
---------	------	-------

A-03	18
------	----

คณะกรรมาการจัดทำแบบนรปรายการ

ประธาน

นายเอกราช ยี่ตัน
หัวหน้าฝ่ายตำรวจและออกแบบ

0334073

นายทวิช วัฒนชอบ
นายกฯเขียนแบบปฏิทิน

กรรมการ

นายคมกริช เทียนแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นาย

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

นายณัฏฐณนท์ คุณาวิชยานุกุล
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

นายมันต์ เพ็ชรการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
อนุวัติ


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้อยู่
คือระยะเป็นหลัก
2. หากมีการปรับรูปร่างแก้ไขแบบให้อยู่
คุณยี่สิบของส่วนตมงาน ผ่านคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างแนบหลักฐานเป็นต้น

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ผนวก 1 มีหน้า 6 ถึง 20

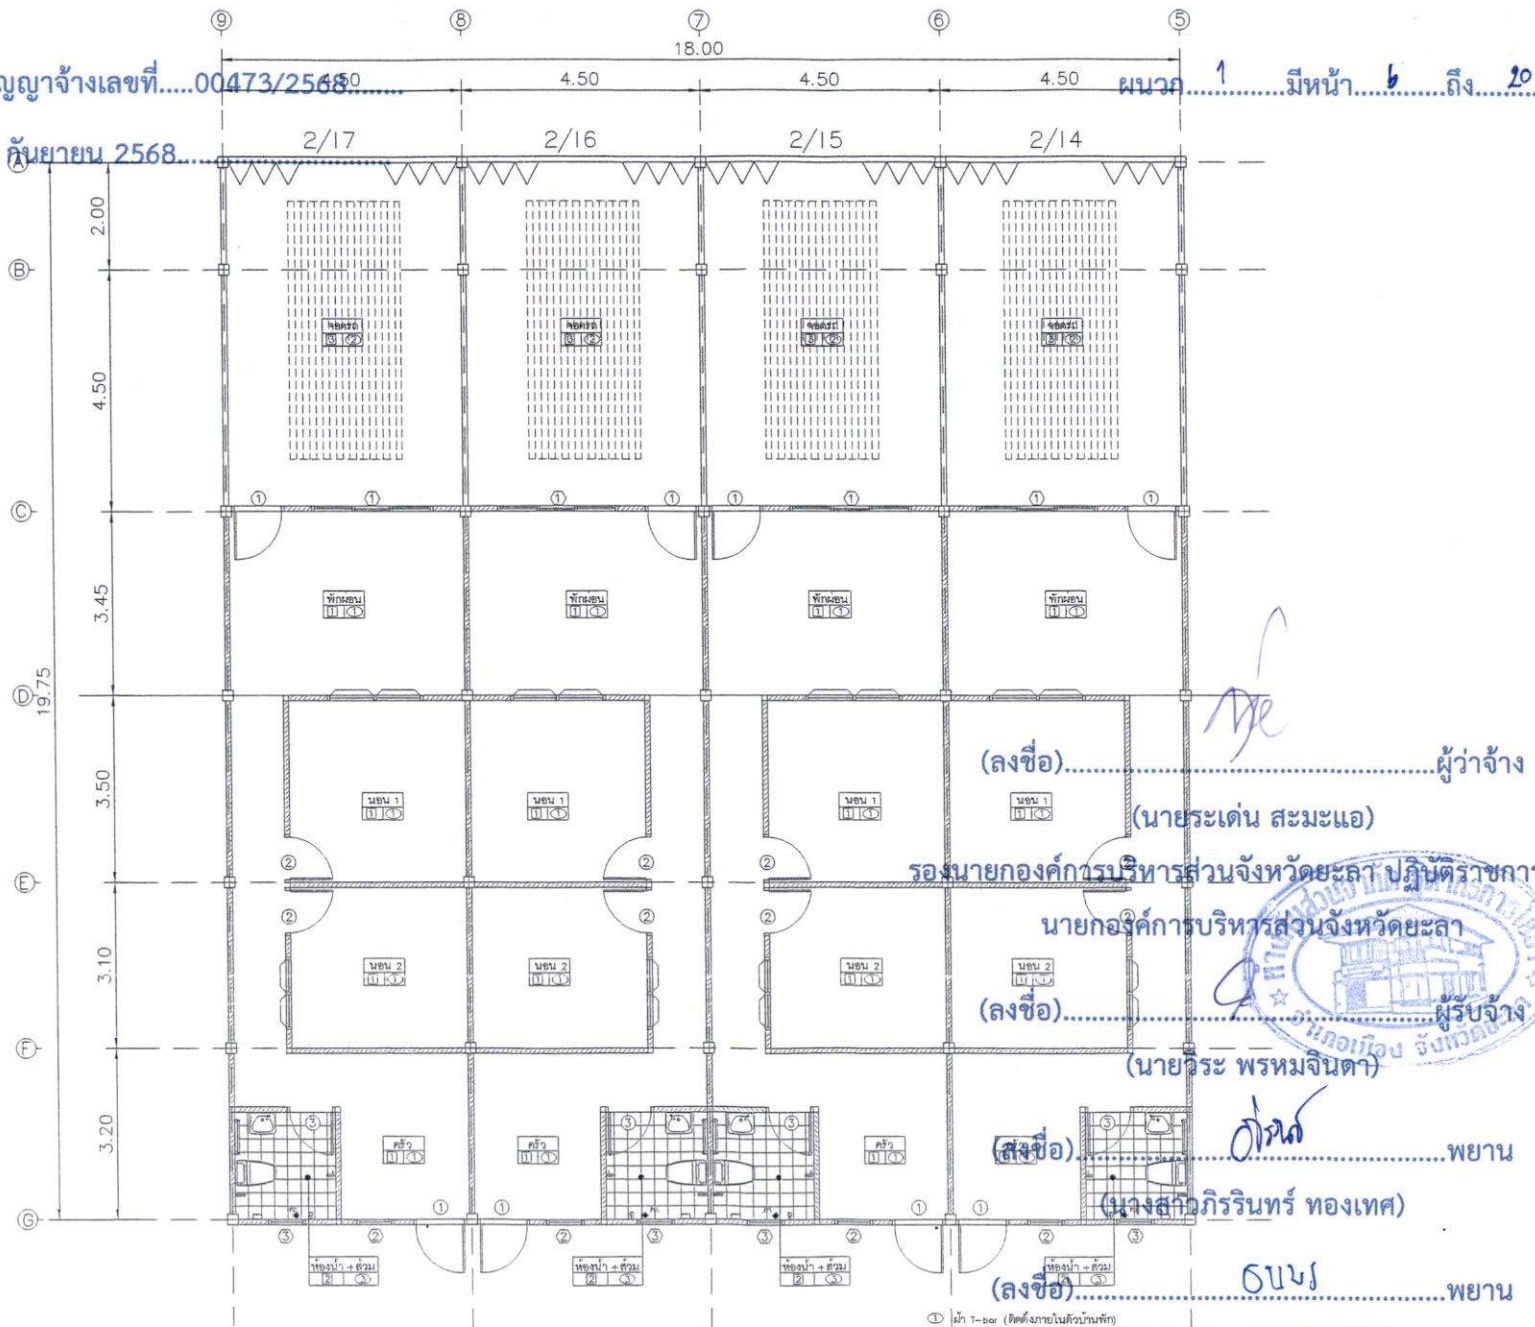

แบบแปลนพื้นอาคาร
Scale 1:100
บ้านพักข้าราชการบริเวณถนนเอกราช

- ① ถ้า T-๐๐ (ปิด) ภายในตัวบ้านพัก
- ② ถ้า T-๐๐๐ (ปิด) ภายในตัวบ้านพัก
- ③ ถ้า T-๐๐๐ (ปิด) ภายในตัวบ้านพัก
- ④ พื้นภายใน ตัวของอาคาร ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ
- ⑤ กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ ชนิดกึ่งมัน ขนาด ๘"๖"
- ⑥ พื้นภายนอก ตัวของอาคาร ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ อบจ. ยะลา เลขที่
2/7 2/8 2/11 2/12 2/13
2/14 2/15 2/16 2/17 2/18
2/19 2/20 2/21

แบบแสดง
แปลนพื้นอาคาร

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 29/7/2568

แผ่นที่ 4/18 จำนวน
A-04 18 แผ่น

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ

ประธาน
นายอรรถพร ยี่สิบ
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

กรรมการ
นายสุวิทย์ รอดคอม
นายช่างเขียนแบบภูมิปัญญา

กรรมการ
นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอรรถพร ยี่สิบ
นายช่างเขียนแบบภูมิปัญญา

นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอรรถพร ยี่สิบ
นายช่างเขียนแบบภูมิปัญญา

นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอรรถพร ยี่สิบ
นายช่างเขียนแบบภูมิปัญญา

นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอรรถพร ยี่สิบ
นายช่างเขียนแบบภูมิปัญญา

นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอรรถพร ยี่สิบ
นายช่างเขียนแบบภูมิปัญญา

นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอรรถพร ยี่สิบ
นายช่างเขียนแบบภูมิปัญญา

นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายอรรถพร ยี่สิบ
นายช่างเขียนแบบภูมิปัญญา

นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอรรถพร ยี่สิบ
นายช่างเขียนแบบภูมิปัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

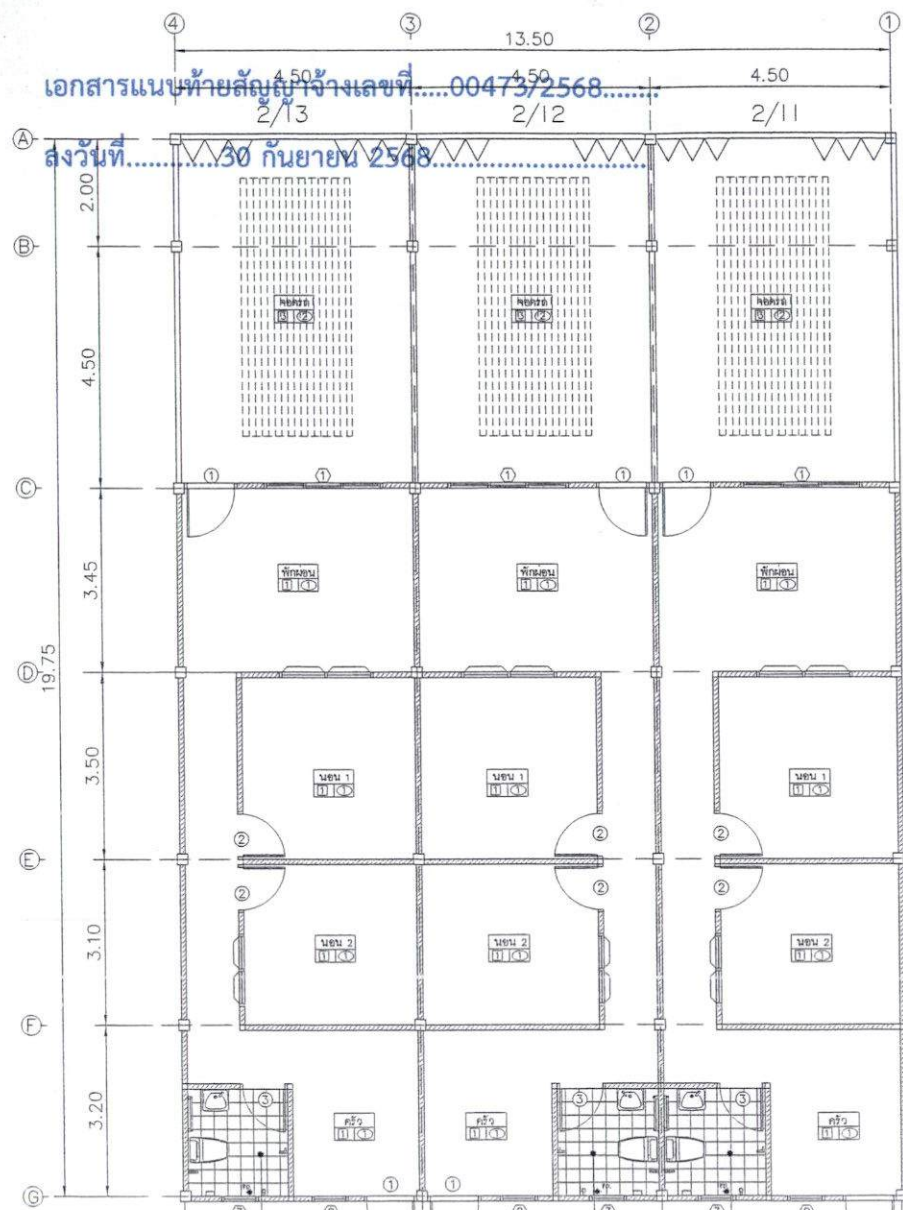

- ① ถ้า T-ber (ติดตั้งภายในตัวบ้านพัก)
- ② ถ้าไม่ระบุติดตั้งบริเวณที่พัก
- ③ ถ้า T-ber ชนิดกับยื่น (ติดตั้งในท้องน้ำ)
- ④ พื้นภายใน ห้องของอาคารไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ
- ⑤ กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด ๓๐x๓๐
- ⑥ พื้นภายนอก ห้องของอาคาร ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ

แบบแปลนพื้นอาคาร
Scale 1:100
บ้านพักข้าราชการบริเวณถนนเอกราช

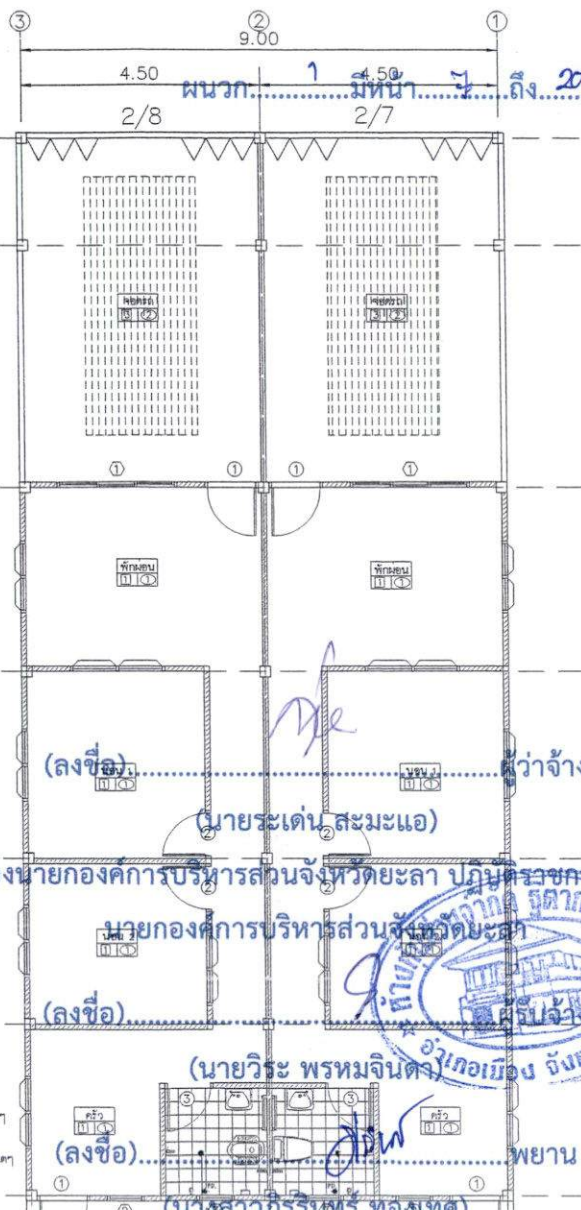

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายวิระ พรหมจินต)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิริณี เจริญสุข)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ อบจ. ยะลา เลขที่
2/7 2/8 2/11 2/12 2/13
2/14 2/15 2/16 2/17 2/18
2/19 2/20 2/21

แบบแสดง
แปลนพื้นอาคาร

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 29/7/2568

แผ่นที่ 5/18 จำนวน 18 แผ่น

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

ประธาน

นายกเทศมนตรี อบจ. ยะลา
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

กรรมการ

นายสุทธิรงค์ รอบคอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

กรรมการ

นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสุทธิรงค์ รอบคอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ตรวจ

นายณัฏฐ์ นนทน์ คุณวิธานกุล
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

พิจารณา

นายนิรันดร์ เพ็ชรการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ

1. ระยะเวลา: จัดทำแบบในแบบให้เรียบร้อย
คืนแบบเป็นปกติ
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ออกแบบ
ชุดที่ ๑ ของชุดแบบรวมงาน ผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบและอนุมัติว่าเป็นปกติ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....4.50

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....


18.00

4.50

4.50

4.50

ผนวก.....1.....มีหน้า.....6.....ถึง.....20

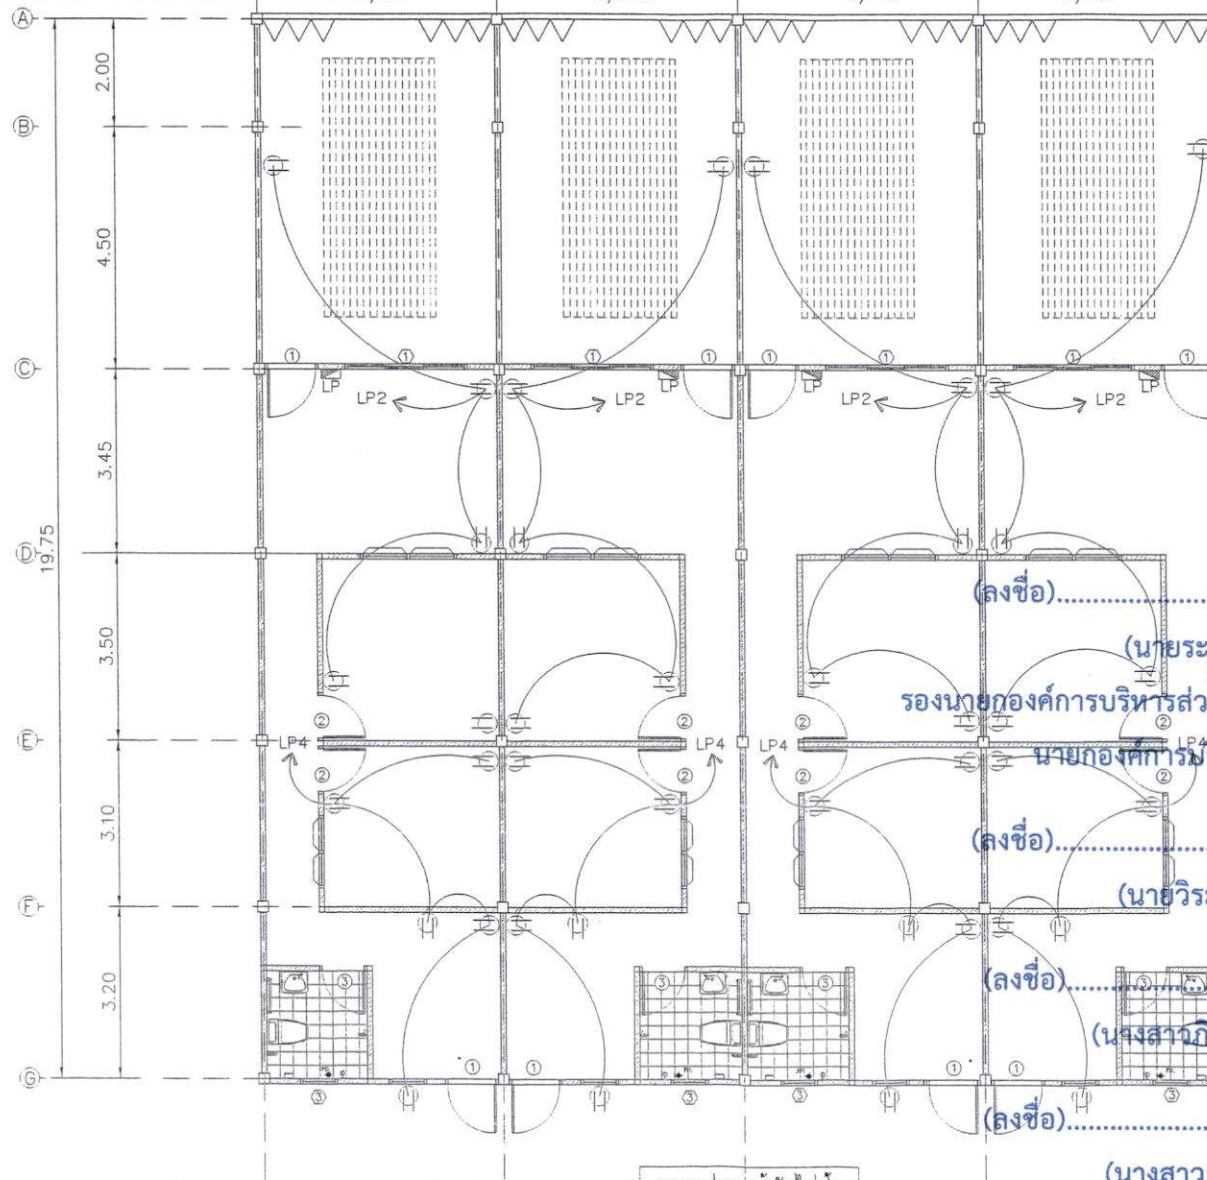

แบบแปลน ครัวรับไฟฟ้า
Scale 1:100

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ อบจ. ยะลา เลขที่
2/7 2/8 2/11 2/12 2/13
2/14 2/15 2/16 2/17 2/18
2/19 2/20 2/21

แบบแสดง
แปลนครัวรับไฟฟ้า

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 29/7/2568

แผ่นที่ 6/18 จำนวน
A-06 18 แผ่น

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ

ประธาน

นายเอกราช ยี่ตัน
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

กรรมการ

นายสุกฤษฎิ์ รอดคน
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

กรรมการ

นายสุกฤษฎิ์ รอดคน
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

แบบ

นายสุกฤษฎิ์ รอดคน
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ตรวจ

นายณัฐดนันท์ คุณาธิษฐานกุล
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

พิจารณา

นายณัฐดนันท์ เกียรติการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ

1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ

ด้วยความเป็นหลัก

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน


รายละเอียดของแบบดังกล่าว ฝ่ายคณะกรรมการ

ตรวจสอบและอนุมัติให้เป็นที่สุด

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ผนวก..... 1 มีหน้า..... 4 ถึง..... 20

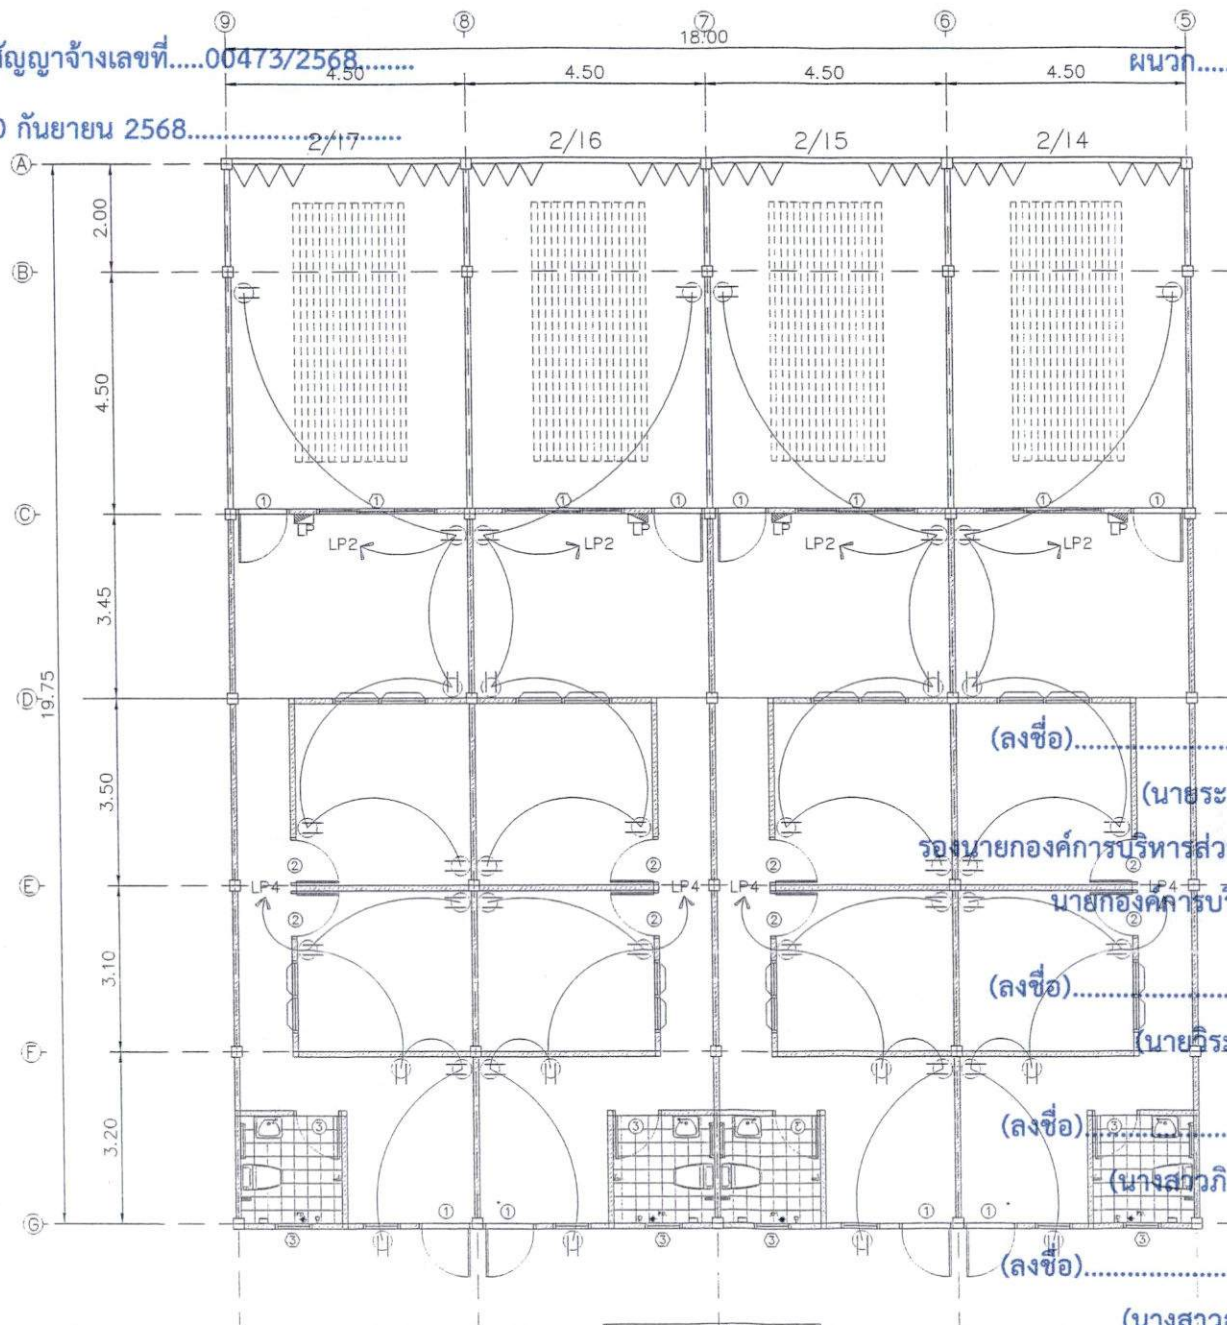

แบบแปลน เตารับไฟฟ้า
Scale 1:100



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ อป.ยะลา เลวที่
2/7 2/8 2/11 2/12 2/13
2/14 2/15 2/16 2/17 2/18
2/19 2/20 2/21

แบบแสดง
แปลนเตารับไฟฟ้า

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 29/7/2568

แผ่นที่ 7/18 จำนวน
A-07 18 แผ่น

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

ประธาน
นายอรรถราช ชื่น
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

กรรมการ
นายสุธีรศักดิ์ รอดคอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

กรรมการ
นายคมกริช เรียงแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสุธีรศักดิ์ รอดคอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

นายณัฏฐณนท์ คุณธิษานุกุล
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

นายบัณฑิต เพ็ชรการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ปดิพงศ์การช่างบริหารส่วนจังหวัดยะลา


นายกองการช่างบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ
1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ
ตลอดเป็นหลัก
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ยึดถือ
คำสั่งหรือของผู้อนุมัติเท่านั้น




เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00473/2568

ลงวันที่ 30 กันยายน 2568

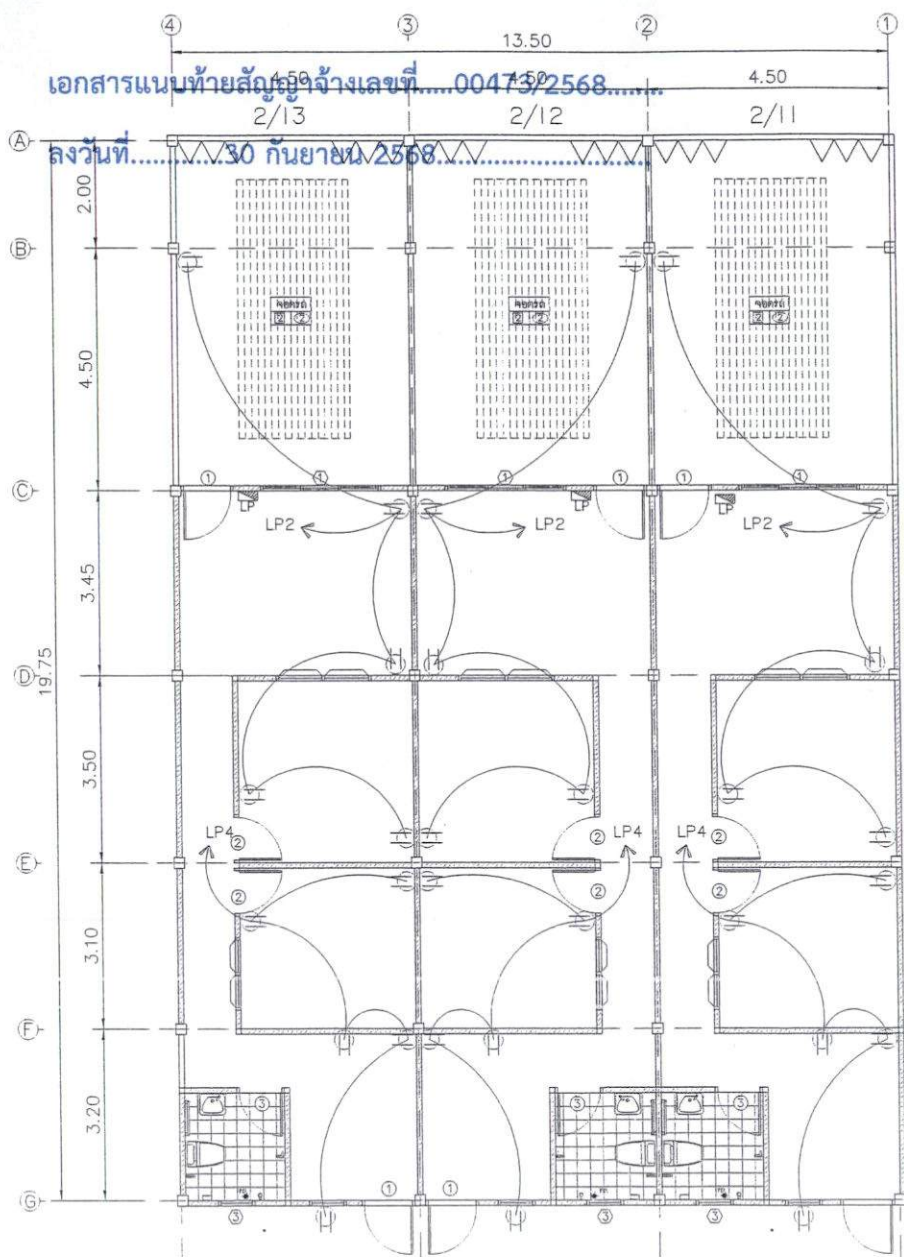

แบบแปลน ฝ้ารับไฟฟ้า
Scale 1:100

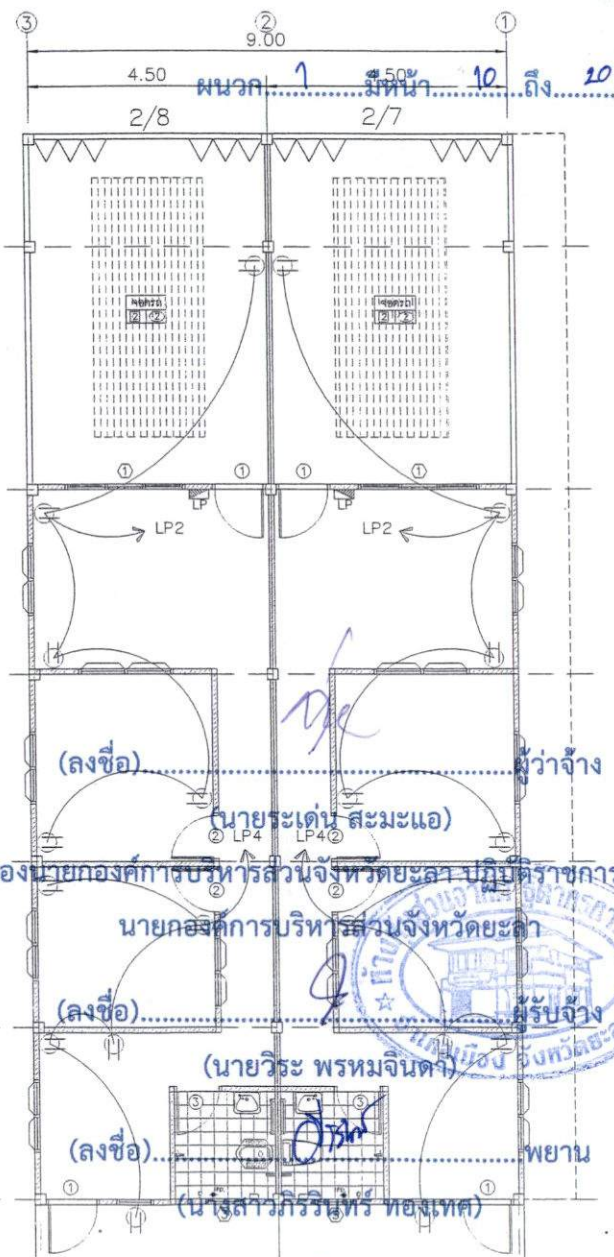

แบบแปลน ฝ้ารับไฟฟ้า
Scale 1:100



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ อาคาร เลขที่
2/7 2/8 2/11 2/12 2/13
2/14 2/15 2/16 2/17 2/18
2/19 2/20 2/21

แบบแสดง
แปลนฝ้ารับไฟฟ้า

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 29/7/2568

แผ่นที่ 8/18 จำนวน
A-08 18 แผ่น

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ

ประธาน

นายเอกธัช อธิ์สัน
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

กรรมการ

นายฤทธิรงค์ ครอบครอง
นายช่างเขียนแบบภูมิสถาปัตย์

กรรมการ

นายคมกริช เขียวแก้ว
ผู้อำนวยการช่างโยธา

นายธีรพัฒน์ คุ้มศิริชานกุล
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

พิจารณา

นายธีรพัฒน์ คุ้มศิริชานกุล
ผู้อำนวยการช่างโยธา

เห็นชอบ

นายธีรพัฒน์ คุ้มศิริชานกุล
ผู้อำนวยการช่างโยธา

อนุมัติ

นายธีรพัฒน์ คุ้มศิริชานกุล
ผู้อำนวยการช่างโยธา

นายธีรพัฒน์ คุ้มศิริชานกุล
ผู้อำนวยการช่างโยธา

นายธีรพัฒน์ คุ้มศิริชานกุล
ผู้อำนวยการช่างโยธา

นายธีรพัฒน์ คุ้มศิริชานกุล
ผู้อำนวยการช่างโยธา

นายธีรพัฒน์ คุ้มศิริชานกุล
ผู้อำนวยการช่างโยธา

นายธีรพัฒน์ คุ้มศิริชานกุล
ผู้อำนวยการช่างโยธา

นายธีรพัฒน์ คุ้มศิริชานกุล
ผู้อำนวยการช่างโยธา


นายธีรพัฒน์ คุ้มศิริชานกุล
ผู้อำนวยการช่างโยธา

นายธีรพัฒน์ คุ้มศิริชานกุล
ผู้อำนวยการช่างโยธา

นายธีรพัฒน์ คุ้มศิริชานกุล
ผู้อำนวยการช่างโยธา

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568..

4.50 ฉบับ 1 มีหน้า 11 ถึง 20

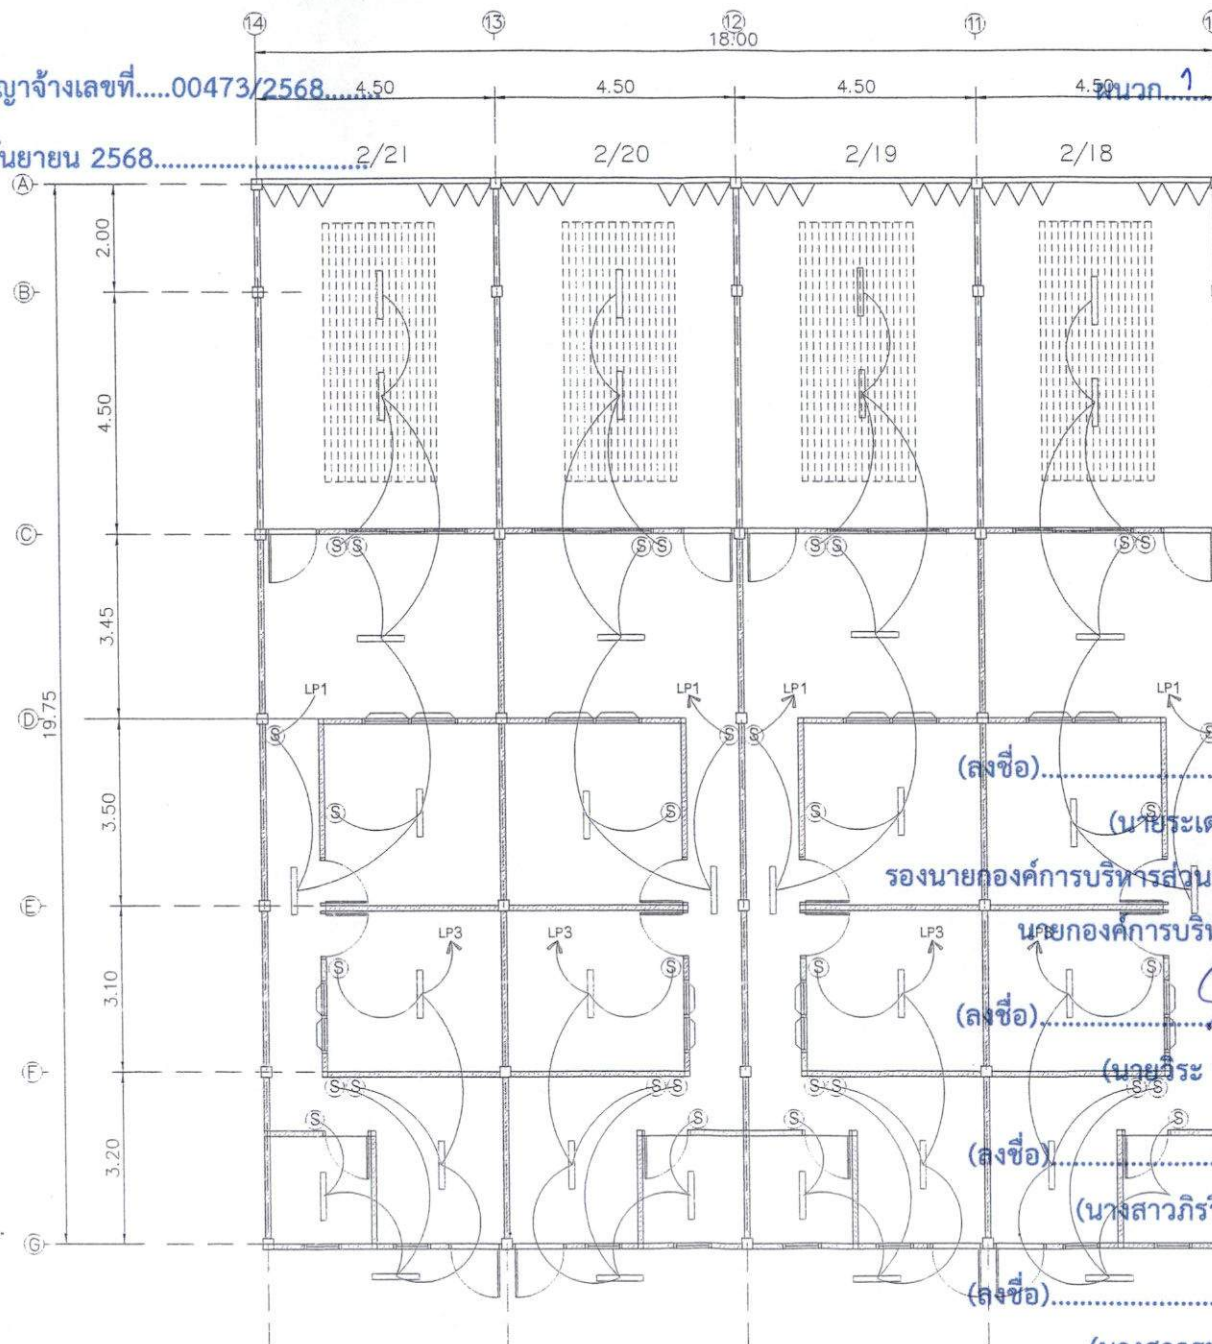

แบบแปลน คิวบิกฟุตสองตัว



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ อบจ.ยะลา เขตที่

2/7	2/8	2/11	2/12	2/13
2/14	2/15	2/16	2/17	2/18
2/19	2/20	2/21		

แบบฝังโคมไฟส่องสว่าง

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 29/7/2568

แผ่นที่ 9/18	จำนวน
--------------	-------

A-09	18	มพพ
------	----	-----

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

ประธาน

นายเอกราช นิติน
หัวหน้าฝ่ายตำรวจและออกแบบ

กรรมการ
นายฤทธิรงค์ ครอบครอง
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

กรรมการ
นายคมกฤษ เขียวแก้ว
ผู้ช่วยนายก อบจ.อ.

นายฤทธิรงค์ ครอบครอง
นายทรงเขียนแบบปฏิบัติงาน

ตรวจ
นายณัฏฐณนท์ คุณาธิยานุกูล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

พิจารณา 
นายมนต์ เพ็ชรการ
นายก อบจ. อุดรธานี

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดย


หมายเหตุ

1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้อยู่ตัวและเป็นหลัก
2. หากมีการรับจ้างแก้ไขแบบให้อยู่ตัวและเป็นหลัก

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ผนวก.....1.....มีหน้า.....11.....ถึง 20

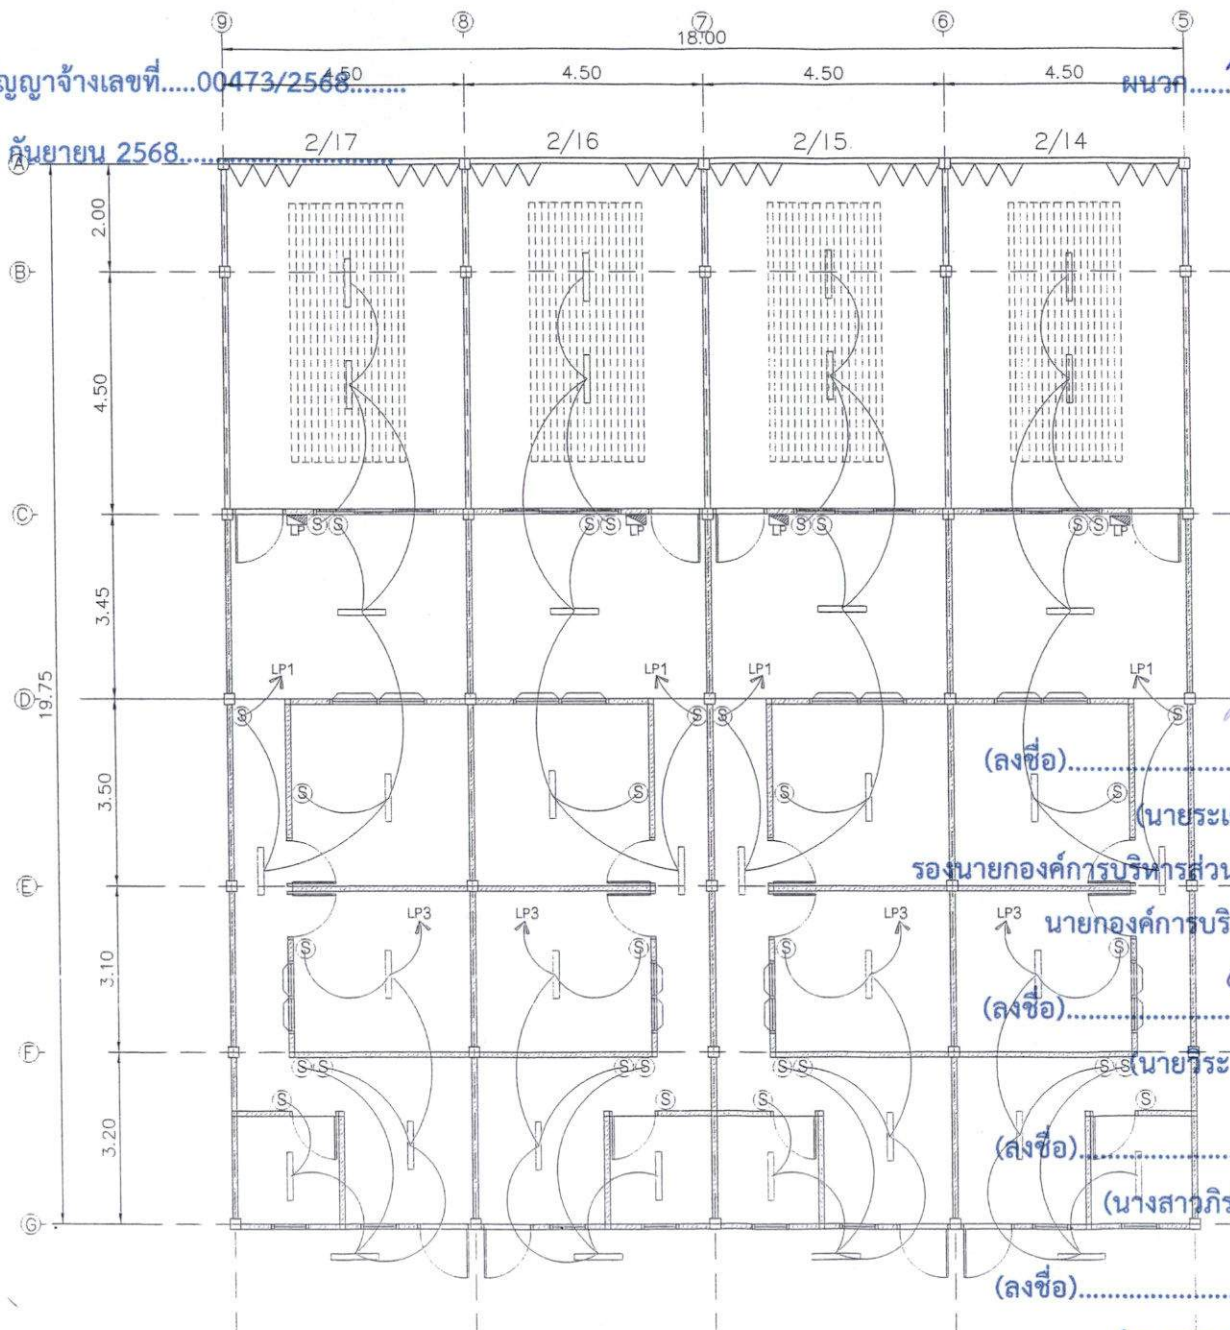

แบบผังโคมไฟส่องสว่าง
Scale 1:100



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ อบจ. ยะลา เลขที่
2/7 2/8 2/11 2/12 2/13
2/14 2/15 2/16 2/17 2/18
2/19 2/20 2/21

แบบแสดง
แบบผังโคมไฟส่องสว่าง

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 29/7/2568

แผ่นที่ 10/18 จำนวน 18 แผ่น

คณะกรรมการจัดทำแบบปรายการ

ประธาน

นายเอกธราช ยี่สิบ
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

กรรมการ

นายฤทธิรงค์ รอบคอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

กรรมการ

นายคณกร ชื่นแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายฤทธิรงค์ รอบคอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

นายณัฐชนน คุนธิยานุกูล
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

พิจารณา

นายณัฐชนน คุนธิยานุกูล
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

เห็นชอบ

นายณัฐชนน คุนธิยานุกูล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อนุมัติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


หมายเหตุ

1. ระบุตำแหน่ง ที่กำหนดในแบบให้ชัดเจน
ด้วยวงเล็บ

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้เขียน
ด้วยสีปากกาสีน้ำเงิน และผ่านการอนุมัติ
จากเจ้าพนักงานผู้ว่าจ้างเป็นต้น


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ลงวันที่..... 30 กันยายน 2568

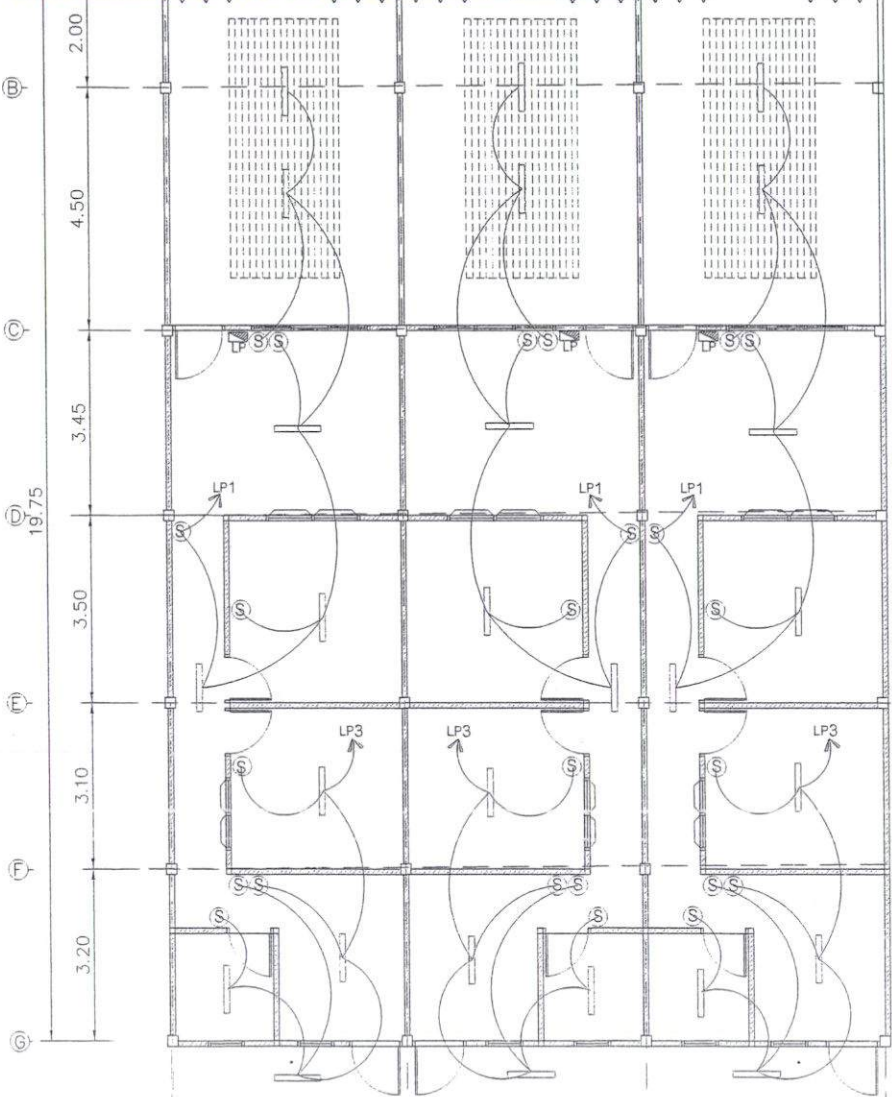

แบบผังโคมไฟส่องสว่าง
Scale 1: 100

ผนวก..... 1 มีหน้า 13 ถึง 20

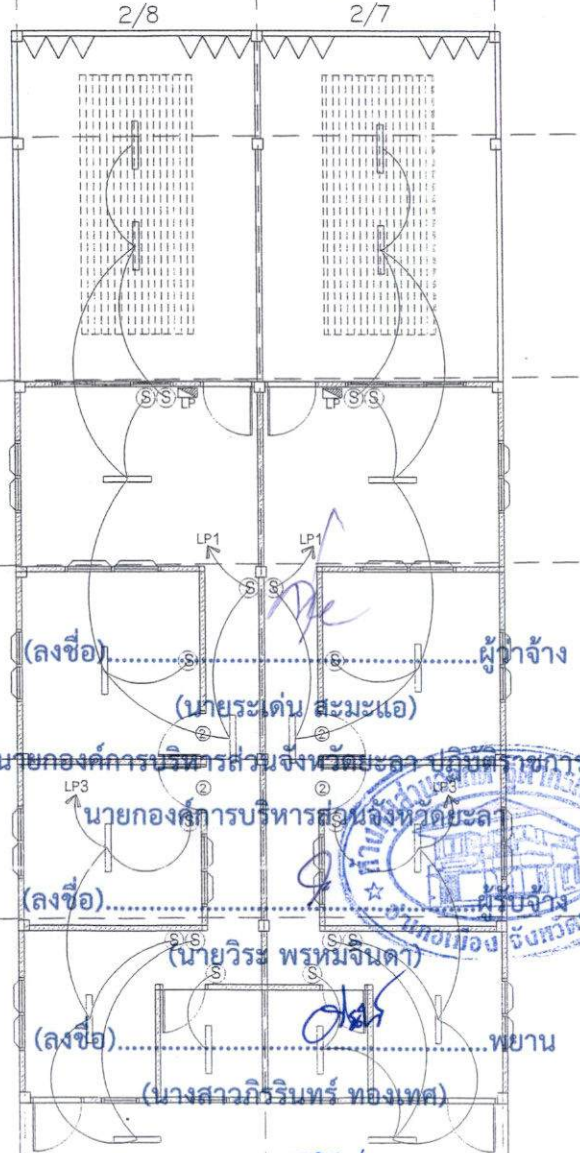

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ อบจ. ยะลา เลขที่
2/7 2/8 2/11 2/12 2/13
2/14 2/15 2/16 2/17 2/18
2/19 2/20 2/21

แบบแสดง
แบบผังโคมไฟส่องสว่าง

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 29/7/2568

แผ่นที่ 11/18 จำนวน 18 แผ่น

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ

ประธาน

นายเอกราช ชื่น
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กรรมการ

นายสุทธิรงค์ รอนดอน
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

กรรมการ

นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายกองดีการนบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายสุทธิรงค์ รอนดอน
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ

นายณัฐดนัย คุณณิชากุล
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

พิจารณา

นายณัฐดนัย เพ็ชรवार
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ




1. ระยะต่างๆ ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ
ด้วยความเป็นหลัก

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงแบบให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ฝ่ายคณะกรรมการ
ตรวจสอบและอนุมัติผู้จ้างเป็นต้นตอ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ผนวก.....1.....มีหน้า.....14.....ถึง.....20.....

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

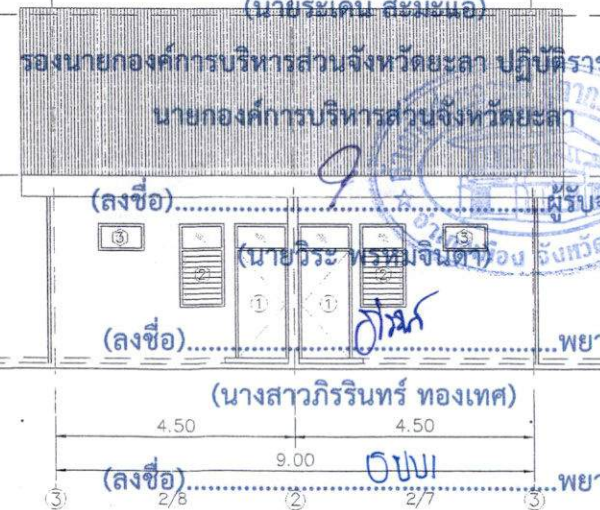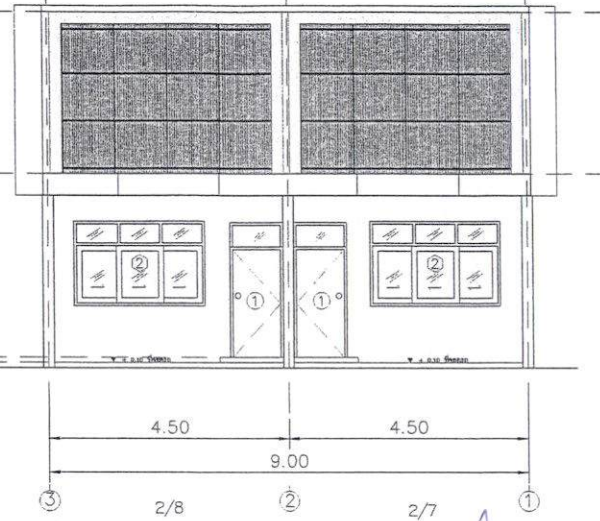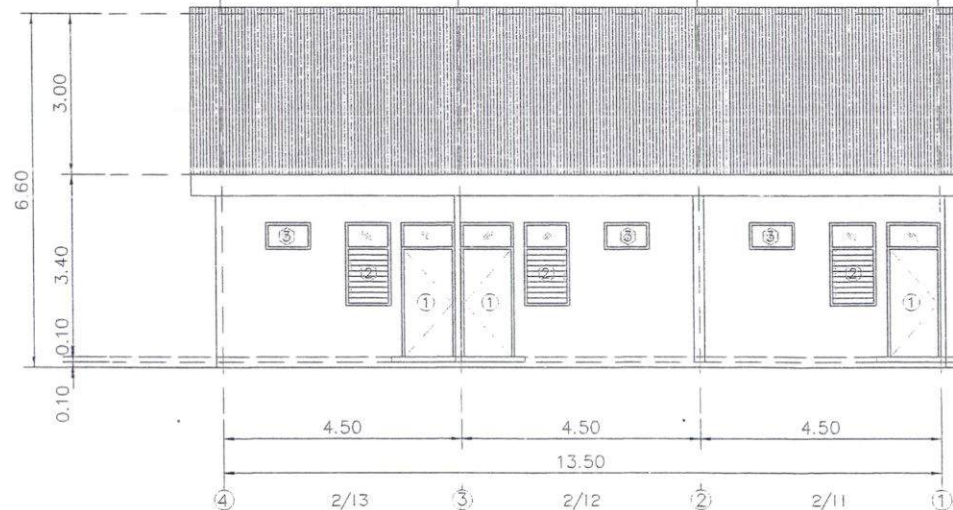

ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ อายะลา เลขที่
2/7 2/8 2/11 2/12 2/13
2/14 2/15 2/16 2/17 2/18
2/19 2/20 2/21

แบบแสดง
รูปด้านหน้า - ด้านหลัง อาคาร

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 29/7/2568

แผ่นที่ 12/18 จำนวน
A-12 18 แผ่น

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

ประธาน

นายเอกธรา ชื่นสัน
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและออกแบบ

กรรมการ

นายสุธีระ รอดชอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

กรรมการ

นายสมเกียรติ เรียวแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รองประธาน

นายสุธีระ รอดชอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ

นายนิรันดร์ คุณาธิษานกุล
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

พิจารณา

นายบัณฑิต เพ็ชรการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ

1. ระบุตำแหน่ง ที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ
คือตามแบบหลัก
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งอยู่ใน
คู่มือของวิศวกรรมการ ผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบงานและผู้ว่าจ้างเป็นต้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมพะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจันทา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ผนวก.....1 มีหน้า 15 ถึง 20



รูปด้านซ้าย
Scale 1:100
บ้านพักเรือนแถว 2 คูหา

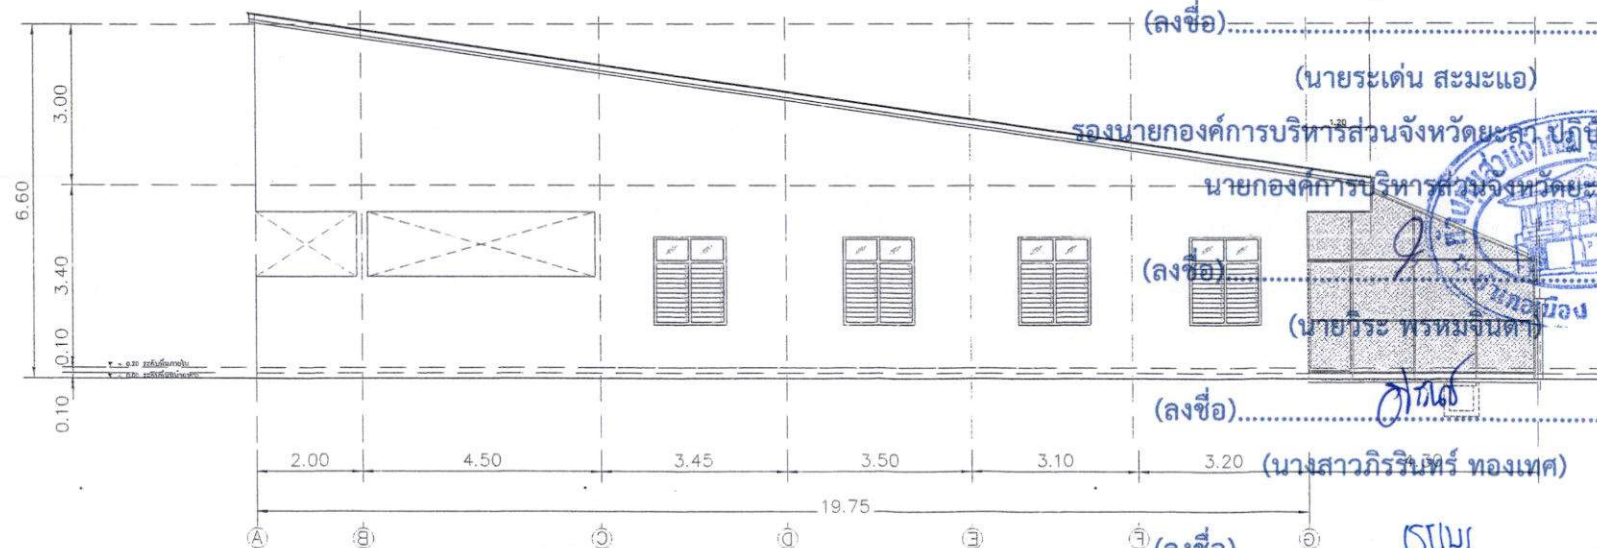

รูปด้านขวา
Scale 1:100
บ้านพักเรือนแถว 2 คูหา



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ อบจ.ยะลา เลขที่
2/7 2/8 2/11 2/12 2/13
2/14 2/15 2/16 2/17 2/18
2/19 2/20 2/21

แบบแสดง
รูปด้านซ้าย - ขวา

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 29/7/2568

แผ่นที่ 13/18 จำนวน
A-13 18 แผ่น

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

ประธาน
นายเอกราช ชื่น
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและออกแบบ

กรรมการ
นายฤทธิรงค์ รอมคอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
กรรมการ
นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายฤทธิรงค์ รอมคอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

พิจารณา
นายณัฏฐ์ เทียมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


หมายเหตุ

1. ระยะเวลาที่ผู้ทำแบบนั้นแบบให้ถือถือ
ใช้เฉพาะในครั้ง
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ผู้นั้น
ผู้รับผิดชอบผู้ควบคุมงาน ผ่านคณะกรรมการ
พิจารณาว่าสมควรให้ผู้จ้างเป็นผู้ทำ


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ผนวก.....1.....มีหน้า.....11.....ถึง.....20.....

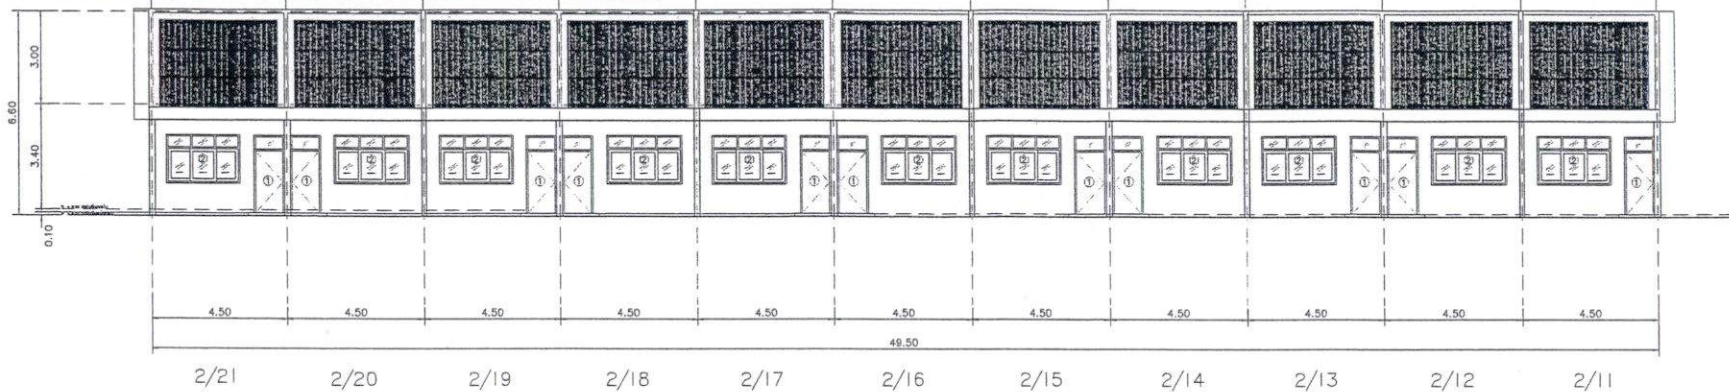

รูปด้านหน้า
Scale 1:175
บ้านพักเรือนแถว 11 ตูหา

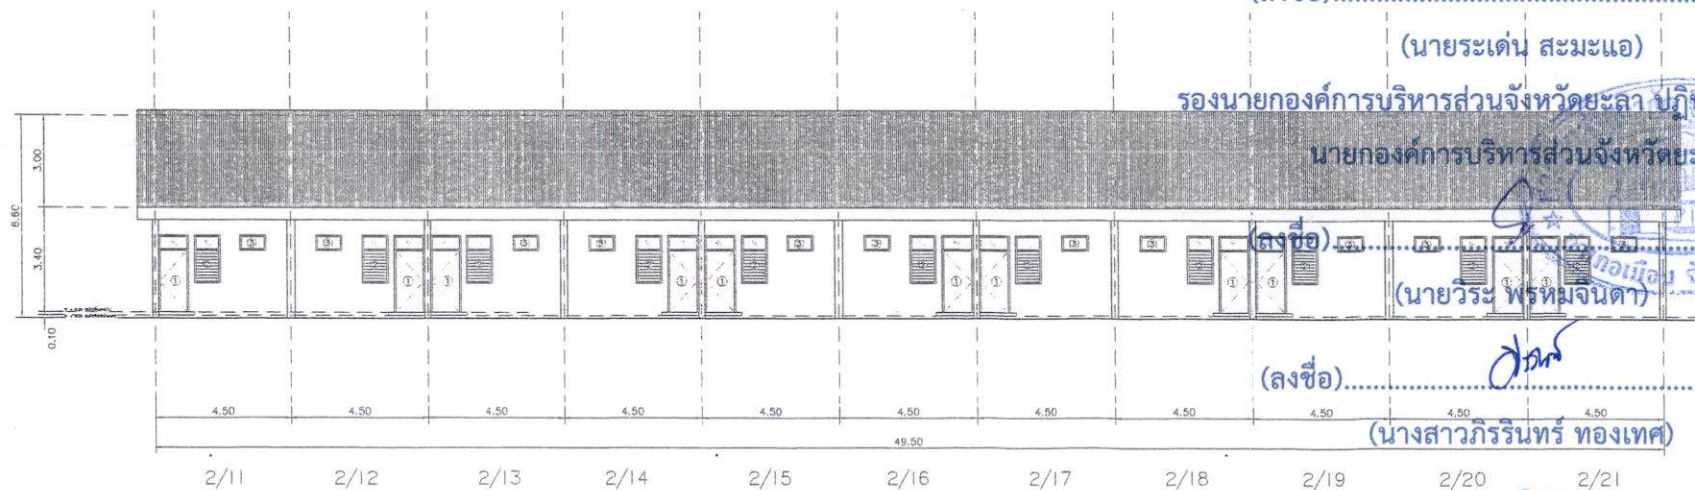

รูปด้านหลัง
Scale 1:175
บ้านพักเรือนแถว 11 ตูหา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ อาศัย งบฯ เลขที่
2/7 2/8 2/11 2/12 2/13
2/14 2/15 2/16 2/17 2/18
2/19 2/20 2/21

แบบแสดง
รูปด้านหน้า - รูปด้านหลัง

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 29/7/2568

แผ่นที่ 15/18 จำนวน
A-15 18 แผ่น

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

ประธาน
นายเอกวิทย์ ชื่นสืบ
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

กรรมการ
นายสุกฤษดิ์ รอนคอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

กรรมการ
นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสุกฤษดิ์ รอนคอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ตรวจ
นายเนติธร นนท์ คุณาธิษฐานกุล
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

พิจารณา
นายเนติธร นนท์ คุณาธิษฐานกุล
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

เห็นชอบ
นายเนติธร นนท์ คุณาธิษฐานกุล
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ
1. ระยะเวลาที่กำหนดในแบบให้ยึดถือ
คือฉบับนี้

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ยึดถือ
คือฉบับนี้ของฝ่ายช่างโยธา

การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับงาน
โยธา


การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับงาน
โยธา

การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับงาน
โยธา


การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับงาน
โยธา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

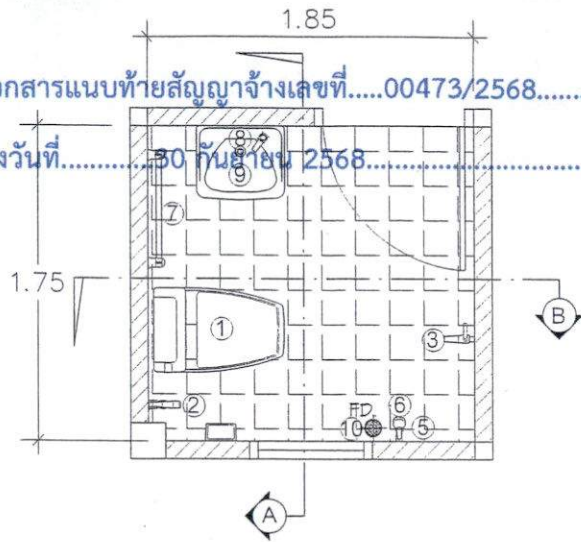

แปลน
Scale 1:100
แบบขยายห้องน้ำ

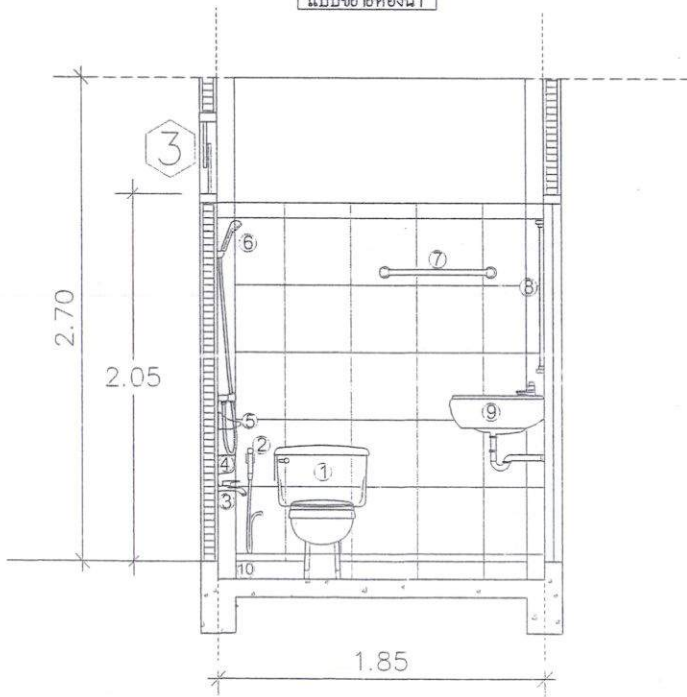


รูปตัด A
Scale 1:100
แบบขยายห้องน้ำ

รายการปรับปรุงซ่อมแซม

ผนวก.....1.....มีหน้า.....17.....ถึง.....20.....

- ** รื้อถอนผ้าเตาดเดิมในห้องน้ำออกทั้งหมด
- ** ติดตั้งผ้าเตาดแบบ T-bar ชนิดกันชื้น
- ** รื้อถอนกระเบื้องพร้อมสุขภัณฑ์
- ** ติดตั้งกระเบื้องเซรามิค ปูพื้นขนาด 8"x8" ชนิดกันลื่น
- ** ติดตั้งกระเบื้อง ผนัง ขนาด 16"x16"
- ① โถสุขภัณฑ์เซรามิคเคลือบขาวแบบมีหม้อพักน้ำระบบฟรีชาวลว
- ② สายชำระ
- ③ ก๊อกน้ำล้างพื้น
- ④ ที่ใส่กระดาษชำระ
- ⑤ ที่ใส่สบู่เซรามิคเคลือบขาวแบบฝังผนัง
- ⑥ ผักบัวชนิดสายอ่อน
- ⑦ รวบรวมผ้าแบบยืดผนัง
- ⑧ กระเบื้องติดเหนืออ่างล้างหน้า ขนาด 80 x 60 ซม.หนา 0.4 มม.
- ⑨ อ่างล้างหน้าเซรามิคชนิดเคลือบขาว แบบแขวนผนังพร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์
- ⑩ ตะแกรงระบายน้ำทิ้ง

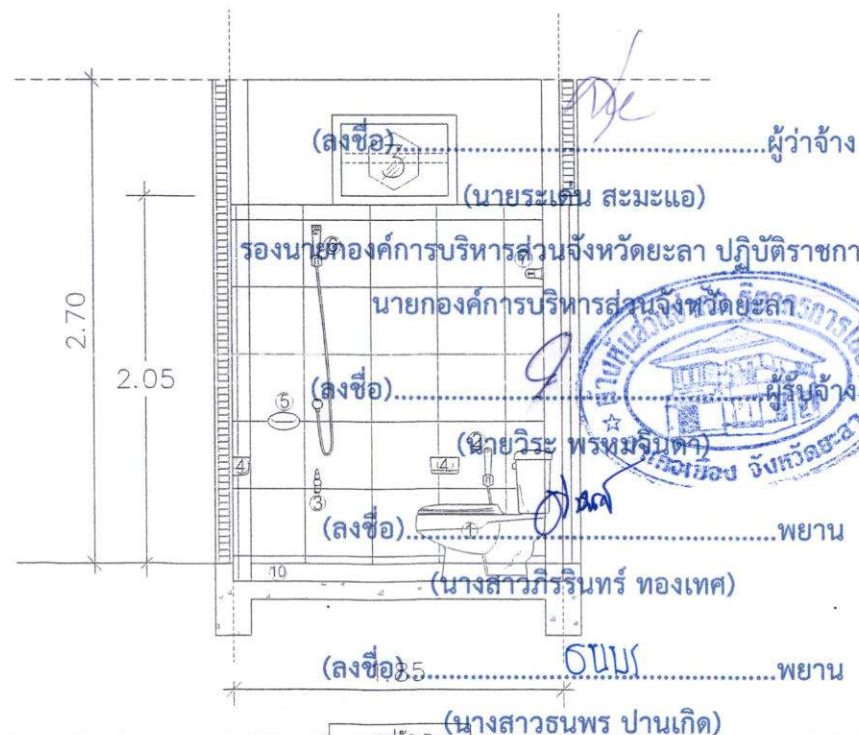

รูปตัด B
Scale 1:100
แบบขยายห้องน้ำ



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ อบ.ย.ยะลา เลขที่
2/7 2/8 2/11 2/12 2/13
2/14 2/15 2/16 2/17 2/18
2/19 2/20 2/21

แบบแสดง
แบบขยายห้องน้ำ

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 29/7/2568

แผ่นที่ 16/18 จำนวน
A-16 18 แผ่น

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

ประธาน

นายอภิศร ชื่น
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

กรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ รอบคอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

กรรมการ

นายคมกริช เรือแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายเกรียงศักดิ์ รอบคอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ตรวจ

นายฉัตรนันทน์ คุณาธิษฐานกุล
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

พิจารณา

นายบัณฑิต เพ็ชรการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ


1. ระบุต่างๆ ดังที่แนบในแบบให้ยึดถือ
ดำเนินการเป็นหลัก

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งอยู่ใน
คำสั่งหรือของฝ่ายช่างโยธา ฝ่ายคณะกรรมการ
ตรวจสอบงานแบบผู้ว่าจ้างเป็นต้น


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่....00473/2568.....

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ผนวก.....1.....มีหน้า.....๙.....ถึง.....20.....

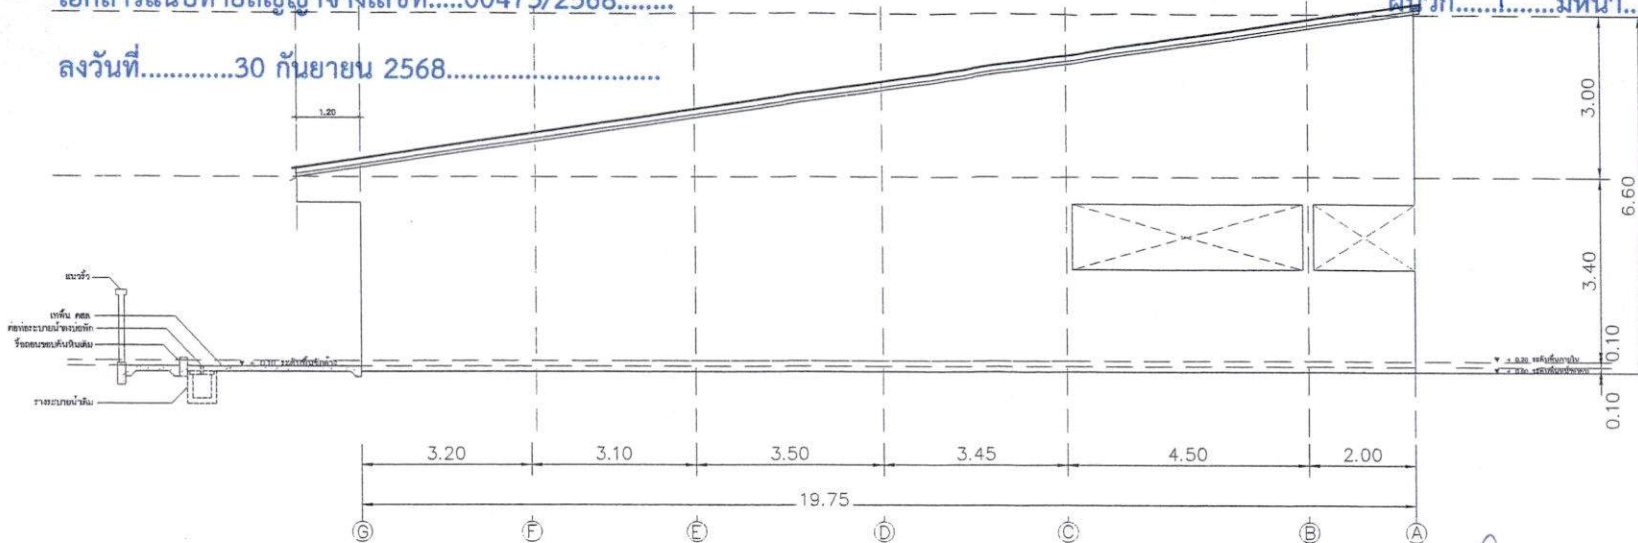

รูปคานชาย
Scale 1:100
บ้านพักเรือนแถว 11 คูหา

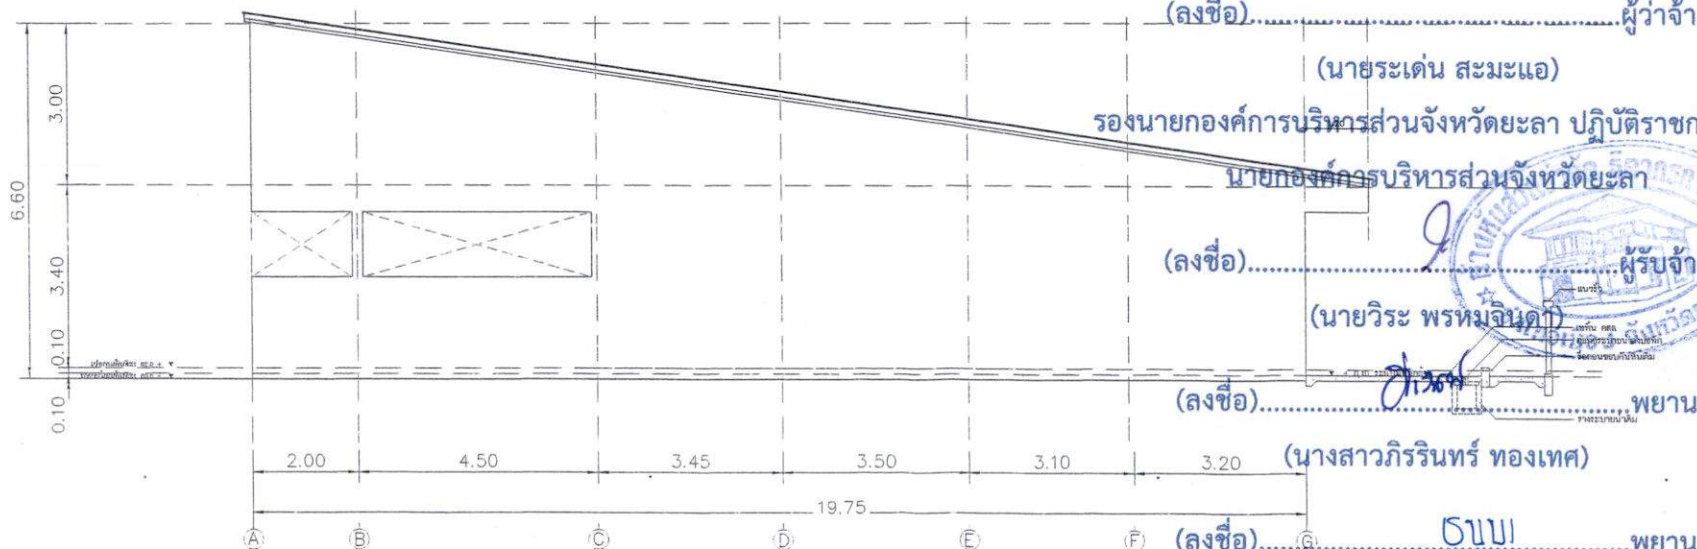

รูปคานขวา
Scale 1:100
บ้านพักเรือนแถว 11 คูหา



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ อบจ.ยะลา เดชที่
2/7 2/8 2/11 2/12 2/13
2/14 2/15 2/16 2/17 2/18
2/19 2/20 2/21

แบบแสดง
รูปคานซ้าย - ขวา

มาตรฐาน 1 : 100

วันที่ 29/7/2568

แผ่นที่ 16/18 จำนวน
A-16 18 แผ่น

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

ประธาน
นายอภิศร ชื่น
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและออกแบบ

กรรมการ
นายสุเชษฐา รอดชอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

กรรมการ
นายสมเกียรติ เขียวแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสุเชษฐา รอดชอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ตรวจ
นายณัฐชนนท์ คุณวิชาญกุล
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

พิจารณา
นายณัฐ ธีระการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ
1. ระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้มอบ
คำสั่งเป็นต้น
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงแบบให้แจ้ง
โดยที่เจ้าของโครงการทราบ ถ้าไม่แจ้ง
ของทางจ้างแล้วจะดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิระ พรหมจินดา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....



แบบขยายประตู 1 : 50

ผนวก.....1 มีหน้า.....19 ถึง.....20



ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....



▽ + ระดับพื้นภายใน



▽ + ระดับพื้นภายใน



▽ + ระดับพื้นภายใน

1 ประตูบานเปิดเดี่ยว มีช่องแสงกระจกติดตาย

2 ประตูบานเปิดเดี่ยว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

3 ประตูบานเปิดเดี่ยว (นายระเด่น สมะแอ)

วงกบ	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง (ตามท้องตลาด)
บาน	- กรอบบาน UPVC สีธรรมชาติ
อุปกรณ์	- บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต - ลูกบิดประตู - กลอน 1 ชุด - อุปกรณ์บานกระจกติดตาย (ช่องแสง) หนา 6 มม ครบชุด
จำนวน	- 1 ชุด (บ้านเลขที่ 29/22)

วงกบ	- วงกบประตู UPVC สีเขียว (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)
บาน	- ประตู UPVC บานทึบ ชนิดภายนอก (ลดรอยปรับเปลี่ยนได้)
อุปกรณ์	- ประตูเจาะรูลูกบิดมาสำเร็จ สะดวกในการติดตั้ง - บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต - ลูกบิดประตู
จำนวน	- 1 ชุด (บ้านเลขที่ 29/25)
จำนวน	- 1 ชุด (บ้านเลขที่ 29/24)

วงกบ	- วงกบประตูอลูมิเนียมสีธรรมชาติ (ตามท้องตลาด)
บาน	- กรอบบาน UPVC สีธรรมชาติ
อุปกรณ์	- บานพับอลูมิเนียมสีธรรมชาติ - บานพับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต - มีลูกบิดประตู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ครบชุด
จำนวน	- 1 ชุด (บ้านเลขที่ 29/25)
จำนวน	- 1 ชุด (บ้านเลขที่ 29/24)

งานมุงหลังคา และงานเหล็กดัด

งานมุงหลังคา และงานเหล็กดัด

(ลงชื่อ).....พยาน

มุงหลังคา	-
จำนวน	-
เหล็กดัด	-
จำนวน	-

มุงหลังคา	-
จำนวน	-
เหล็กดัด	-
จำนวน	-

มุงหลังคา	-
จำนวน	-
เหล็กดัด	-
จำนวน	-



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ อ.ปะเหลียน จ.ยะลา
2/7 2/8 2/11 2/12 2/13
2/14 2/15 2/16 2/17 2/18
2/19 2/20 2/21

แบบแสดง
แบบขยายประตู

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 29/7/2568

แผ่นที่ 17/18 จำนวน
A-17 18 แผ่น

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

ประธาน

นายอรรถกร ชื่น
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

กรรมการ

นายสุวิทย์ ครอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

กรรมการ

นายสมชาย ธีระ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจ

นายสุวิทย์ ครอบ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจ

นายสุวิทย์ ครอบ
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

พิจารณา

นายสุวิทย์ ครอบ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

อนุมัติ




นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ

1. ระบุค่าจ้าง ค่าตอบแทนแบบให้ยึดถือ
คำนวณเป็นปกติ

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ระบุ
รายละเอียดของงานที่เปลี่ยนแปลง
ส่งมอบงานให้แล้วเสร็จ

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

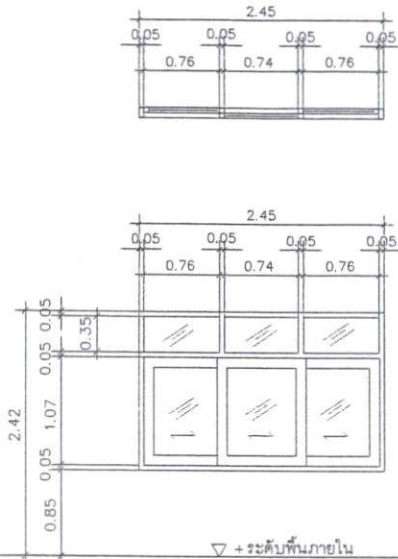

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

ข้อ 6.7 1 หน้าต่างบ้านเลขที่ 3 บ้าน มีช่องแสงกระจกติดตาย

วงกบ	- วงกบประตูอลูมิเนียมสีธรรมชาติ (ตามท้องตลาด)
บาน	- บานกระจกหนา 6 มม
อุปกรณ์	- อุปกรณ์บานอลูมิเนียม ครบชุด
	- อุปกรณ์บานกระจกติดตาย (ช่องแสง) หนา 6 มม ครบชุด
จำนวน	- 10 ชุด (บ้านเลขที่ 29/17 , 29/18)

งานมุงลวด และงานเหล็กติด

มุงลวด	-
จำนวน	-
เหล็กติด	-
จำนวน	-

ข้อ 6.8 2 หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมเดียว มีช่องแสงกระจกติดตาย

วงกบ	- วงกบประตูอลูมิเนียมสีธรรมชาติ (ตามท้องตลาด)
บาน	- บานกระจกหนา 6 มม
อุปกรณ์	- อุปกรณ์บานอลูมิเนียม ครบชุด
	- อุปกรณ์บานกระจกติดตาย (ช่องแสง) หนา 6 มม ครบชุด
จำนวน	- 2 ชุด (บ้านเลขที่ 29/17 , 29/18)

งานมุงลวด และงานเหล็กติด

มุงลวด	-
จำนวน	-
เหล็กติด	-
จำนวน	-

ข้อ 6.9 3 (นายระเด่น สะมะแอ) หน้าต่างบานเกล็ดซ้อนคู่

วงกบ	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง (ตามท้องตลาด)
บาน	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง หนา 10 มม
อุปกรณ์	- อุปกรณ์บานไม้เนื้อแข็ง ครบชุด
จำนวน	- 2 ชุด (บ้านเลขที่ 29/17 , 29/18)

งานมุงลวด และงานเหล็กติด

มุงลวด	-
จำนวน	-
เหล็กติด	-
จำนวน	-

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ อบจ.ยะลา เลขที่
2/7 2/8 2/11 2/12 2/13
2/14 2/15 2/16 2/17 2/18
2/19 2/20 2/21

แบบแสดง
แบบขยายหน้าต่าง

มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 29/7/2568

แผ่นที่ 18/18 จำนวน

A-18 18 แผ่น

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

ประธาน

นายอรรถกร ชื่น
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ

กรรมการ

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

กรรมการ

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ รอดชอบ
นายราชธิเบศร์แบบปฏิบัติงาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 00473/2568..... รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหาร
 ลงวันที่..... ส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ ๒/๗, ๒/๘, ๒/๑๑, ๒/๑๒, ๒/๑๓, ๒/๑๔, ๒/๑๕, ๒/๑๖, ๒/๑๗, ๒/๑๘,
 ๒/๑๙, ๒/๒๐ และ ๒/๒๑

สำหรับงานซ่อมแซมบ้านพัก เลขที่ ๒/๑๑, ๒/๑๒, ๒/๑๔, ๒/๑๗, ๒/๑๘ และ ๒/๑๙

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๒.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
 เป็นจำนวนเงิน ๖๔๙,๐๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานรื้อถอนจำนวน ๖ หลัง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน T - bar ภายใน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานชายคาซ้าย - ขวา แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าไม้ระแนงที่จอดรถ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตด้านหลังอาคารพร้อมขัดมัน แล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง
 และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๗.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
 เป็นจำนวนเงิน ๗๙๖,๕๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง
 ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งประตูหน้าต่างทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงห้องน้ำทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายนอก-ภายในและสีน้ำมัน แล้วเสร็จ
- งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาดพื้นที่ขนย้ายเศษวัสดุทั้งหมด แล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้าง
 และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



/ งวดที่ ๓ ...

ลงวันที่.....30 กันยายน ๒๕๖๘

สำหรับงานซ่อมแซมบ้านพัก เลขที่ ๒/๗, ๒/๘, ๒/๑๓, ๒/๑๕, ๒/๑๖, ๒/๒๐ และ ๒/๒๑

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๓.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๖๗๘,๕๐๐.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานรื้อถอนจำนวน ๗ หลัง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน T - bar ภายใน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานชายคาซ้าย - ขวา แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าไม้ระแนงที่จอดรถ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตด้านหลังอาคารพร้อมขัดมัน แล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๕ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๙

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๘.๐๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๘๒๖,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งประตูหน้าต่างทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงห้องน้ำทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายนอก-ภายในและสีน้ำมัน แล้วเสร็จ
- งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาดพื้นที่ขนย้ายเศษวัสดุทั้งหมด แล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....
 ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17,
 ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

จำนวน.....1.....ฉบับ
 หมวด.....3.....มีหน้า.....1.....ถึง.....82.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุตากรการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/7	1	หลัง		173,338.73		38,144.60	211,483.34	
2	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/8	1	หลัง		170,137.97		38,797.15	208,935.12	
3	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/11	1	หลัง		189,594.64		46,982.82	236,577.45	
4	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/12	1	หลัง		179,380.11		44,343.11	223,723.22	
5	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/13	1	หลัง		179,380.11		44,343.11	223,723.22	
6	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/14	1	หลัง		179,380.11	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	44,343.11	223,723.22	
7	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/15	1	หลัง		179,380.11	(นายระเด่น สะมะแอ)	44,343.11	223,723.22	
8	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/16	1	หลัง		179,380.11	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	44,343.11	223,723.22	
9	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/17	1	หลัง		179,380.11	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	44,343.11	223,723.22	
10	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/18	1	หลัง		179,380.11	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง	44,343.11	223,723.22	
11	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/19	1	หลัง		179,380.11	(นายวิระ พรหมจันทร์)	44,343.11	223,723.22	
12	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/20	1	หลัง		179,380.11	(ลงชื่อ).....พยาน	44,343.11	223,723.22	
13	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/21	1	หลัง		189,594.64	(นางสาวกวีรินทร์ ทองเทศ)	46,982.82	236,577.45	
14	งานติดตั้งมุงลวด (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)	85	ตรม.	450	38,250.00	(ลงชื่อ).....	2,677.50	40,927.50	***
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน					(นางสาวธนพร ปานเกิด)		2,950,000.00	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....มีหน้า.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติการกรโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/7								
1.1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนผ้าเพดาน T-bar	54.000	ตร.ม.	-	-	34.1577	1,844.52	1,844.52	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น (รื้อชนทั้ง)	3.000	ตร.ม.	-	-	54.6523	163.96	163.96	
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดียว)	4.000	ชุด	-	(ลงชื่อ).....	109.3047	437.22	ผู้ว่าจ้าง	437.22
	- รื้อถอนหน้าต่างวงกบไม้ พร้อมเหล็กดัด	3.000	ชุด	-	-	54.6523	163.96	163.96	
	- รื้อถอนผ้าเพดาน พร้อมโครงคร่าวไม้ (ผ้าหลังบ้าน) (รื้อชนทั้ง)	3.400	ตร.ม.	-	-	40.9893	139.36	139.36	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	- ติดตั้ง ก๊อกล้ำ 3/4"	1.000	ชุด	211.7778	211.78	34.1577	117.34	245.94	
	- ติดตั้งฝักบัวชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	1.000	ชุด	793.8253	793.83	(ลงชื่อ).....	95.6416	พยาน	889.47
	- ติดตั้งก๊อกล้ำพื้น 1/2 "	1.000	ชุด	163.9570	163.96	(ลงชื่อ).....	34.1577	พยาน	198.11
	- ติดตั้งตะแกรงน้ำทิ้งพื้นห้องน้ำ	1.000	ชุด	457.7134	457.71	34.1577	34.16	491.87	
	- ทาสีรองพื้นปูนเก่า	204.000	ชุด	40.9893	8,361.81	(ลงชื่อ).....	-	พยาน	8,361.81
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายนอก	8.000	ตร.ม.	54.6523	437.22	46.4545	371.64	808.85	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3 มีหน้า.....3 ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายใน	196.000	ตร.ม.	47.8208	9,372.88	40.9893	8,033.89	17,406.77	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D1 พร้อมลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.000	ชุด	5,465.2344	10,930.47	136.6309	273.26	11,203.73	
	- ทาสีน้ำมัน	20.000	ตร.ม.	51.9197	1,038.39	51.9197	1,038.39	2,076.79	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D2 พร้อมวงกบ UPVC และลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.000	ชุด	5,738.4961	11,476.99	136.6309	273.26	11,750.25	
	- ติดตั้งวงกบประตูไม้เนื้อแข็ง บานประตู D1 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	2.000	ชุด	4,372.1875	8,744.38	136.6309	273.26	9,017.64	
	- ติดตั้งบานประตูอะลูมิเนียม D3 พร้อมวงกบและอุปกรณ์ปิดล็อก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	ชุด	3,415.7715	3,415.77	136.6309	136.63	3,552.40	
	- ติดตั้งหน้าต่างบาน SLIDE อะลูมิเนียมขอบขาว W1	1.000	ชุด	11,750.2539	11,750.25	136.6309	136.63	11,886.88	
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W2 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	1.000	ชุด	2,459.3555	2,459.36	136.6309	136.63	2,595.99	
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W3 บานเกร็ดซ้อนคู่ติดตายพร้อมกระจกฝ้า หนา 6 มม.	1.000	ชุด	2,186.0938	2,186.09	136.6309	136.63	2,322.72	

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิริยะ พรหมจรรย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....มีหน้า.....4.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิธิตการกรโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งกระจกติดตายช่องแสงบนบานเกล็ด ขนาด 0.90x0.40 หน้า 6 มม.	28.000	ตร.ฟ.	24.5936	688.62	34.1577	956.42	1,645.04	
	- ติดตั้งกระจกบานเกล็ดผ้า หน้า 6 มม.	12.000	แผ่น	40.9893	491.87	-	-	491.87	
	- ติดตั้งชุดบานเกล็ดปรับมุมระบบแบบมือหมุน	1.000	ชุด	956.4160	956.42	13.6631	13.66	970.08	
	- คอนกรีต ค.2 240 ksc. (คานเอ็นส่วนที่ร้อยถอบรอบวงกบประตูหน้าต่าง)	1.000	ลบ.ม.	2,492.1469	2,492.15	(ลงชื่อ).....	-	ผู้ว่าจ้าง 2,492.15	
	- ฉาบเก็บปูนส่วนที่ร้อยถอบวงกบ ปูนทรายฉาบผิวเรียบ หน้า 1.5 ซม.เพื่อสูญเสียแล้ว	6.000	ตร.ม.	79.2459	475.48	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	475.48	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
	- ติดตั้งฝ้าชายคา ไฟเบอร์ซีเมนต์แบบระบายอากาศพร้อม โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	21.000	ตร.ม.	486.4059	10,214.52	125.7004	2,639.71	12,854.23	
	- ติดตั้งฝ้าเพดาน T-bar พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	54.000	ตร.ม.	583.4138	31,504.34	71.0480	5,036.59	35,340.94	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	10.000	ตร.ม.	486.4059	4,864.06	128.4330	1,284.33	6,148.39	
	- พื้น คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	2.000	ตร.ม.	4,071.5996	8,143.20	(ลงชื่อ).....	572.4833	พยาน 9,288.17	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๖.....มีหน้า.....๕.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติการกรโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งตะแกรงเหล็ก WIRE MESH เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	20.000	ตร.ม.	47.8208	956.42	6.8315	136.63	1,093.05	
1.3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 6 ช่อง (แบบป้องกันไฟดูดและไฟฟ้าลัดวงจร)	1.000	ชุด	3,005.8789	3,005.88	-	-	3,005.88	
	- ติดตั้งชุดเซอร์กิต 15A 1.5kA	6.000	ชุด	161.2244	967.35	-	-	967.35	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x2.5 Sq.mm.	600.000	เมตร	17.8713	10,722.79	9.5642	5,738.50	16,461.29	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x1.5 Sq.mm.	540.000	เมตร	11.7229	6,330.38	6.8315	3,689.03	10,019.41	
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 20 mm. สีขาว	100.000	เมตร	18.8414	1,884.14	16.3957	1,639.57	3,523.71	
	- ติดตั้งท่ออ่อนสายไฟลายลูกฟูก 20 มม. ขนาด 5 เมตร สี	50.000	เมตร	25.4133	1,270.67	7.6240	381.20	1,651.87	
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 2 x 4 นิ้ว	11.000	ชุด	31.4251	345.68	3.6890	40.58	386.26	
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	58.7513	58.75	12.7067	12.71	71.46	
	- ติดตั้งบล็อกลอยไฟฟ้า ขนาด 2 x 4 นิ้ว	13.000	ชุด	12.2968	159.86	3.6890	47.96	207.82	
	- ติดตั้งบล็อกลอยไฟฟ้า ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	24.5936	24.59	5.3286	5.33	29.92	
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 3 ช่อง	13.000	ชุด	38.2566	497.34			497.34	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๖.....มีหน้า.....๖.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิฑิตการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อคลอยไฟฟ้า 5 ช่อง	1.000	ชุด	62.8502	62.85	-	-	62.85	
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อคลอยไฟฟ้า 1 ช่อง	1.000	ชุด	30.0588	30.06	-	-	30.06	
	- ติดตั้งเต้ารับกรวดคู่ 16A, 250V	9.000	ชุด	222.7083	2,004.37	23.2272	209.05	2,213.42	
	- ติดตั้งสวิตช์ทางเดียว ขนาด1ช่อง	9.000	ชุด	28.6925	258.23	12.2968	110.67	368.90	
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 18W แสง Cool Daylight	8.000	ชุด	393.4969	3,147.98	150.2939	1,202.35	4,350.33	
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 9W แสง Cool Daylight	1.000	ชุด	215.8768	215.88	150.2939	150.29	366.17	
	- ติดตั้งแผ่น PVC ขนาดขนาด 10x12 นิ้ว	1.000	ชุด	91.5427	91.54			91.54	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x16 Sq.mm.	30.000	เมตร	112.4199	3,372.60	27.3262	849.78	4,192.38	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x10 Sq.mm.	15.000	เมตร	72.4144	1,086.22	21.8609	327.91	1,414.13	
	- ติดตั้งแท่งกรวดโหลตบของแดง ขนาด 1.8 เมตร	1.000	ชุด	202.2137	202.21			202.21	
	- วัสดุสิ้นเปลือง	1.000	งาน	5,011.4286	5,011.43	-		5,011.43	
	รวมค่าซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/7				173,338.73		38,144.60	211,483.34	

หมายเหตุ เพิ่มในค่างานมั่งคุด 1990.14 บาท

ลงชื่อ

(นายวิระ พรหมจินดา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิฑิตการโยธา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....2.....มีหน้า.....7.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/8		รวม		170,137.97		38,797.15	208,935.12	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							208,935.12	
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/8								
1.1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนผ้าเพดาน T-bar	54.000	ตร.ม.	-	-	34.1577	1,844.52	1,844.52	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น (รื้อชนทั้ง)	3.000	ตร.ม.	-	-	54.6523	163.96	163.96	
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดียว)	4.000	ชุด	-	-	109.3047	437.22	437.22	
	- รื้อถอนหน้าต่างวงกบไม้ พร้อมเหล็กดัด	3.000	ชุด	-	-	54.6523	163.96	163.96	
	- รื้อถอนผ้าเพดาน พร้อมโครงคร่าวไม้ (ผ้าหลังบ้าน) (รื้อชนทั้ง)	3.400	ตร.ม.	-	-	40.9893	139.36	139.36	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	-							
	- ติดตั้ง ก๊อกน้ำ 3/4"	1.000	ชุด	211.7778	211.78	54.5777	245.94	245.94	
	- ติดตั้งฝักบัวชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	1.000	ชุด	793.8253	793.83	95.6416	95.64	889.47	
	- ติดตั้งโถสุขภัณฑ์แบบนั่งยองมีฐาน	1.000	ชุด	1,639.5703	1,639.57	204.9463	204.95	1,844.52	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....มีหน้า.....๘.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าเซรามิค พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและชุดก๊อกอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	2,322.7246	2,322.72	614.8389	614.84	2,937.56	
	- ติดตั้งก๊อกน้ำล้างพื้น 1/2 "	1.000	ชุด	163.9570	163.96	34.1577	34.16	198.11	
	- ติดตั้งตะแกรงน้ำทิ้งพื้นห้องน้ำ	1.000	ชุด	457.7134	457.71	34.1577	34.16	491.87	
	- ติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด 0.60 ม.	1.000	ชุด	379.8338	379.83	95.6416	95.64	475.48	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้งที่ใส่สบู่เซรามิคเคลือบขาวแบบฝังผนัง	1.000	ชุด	434.1582	434.16	163.9570	163.96	598.12	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
	- ติดตั้งที่ใส่ทิชชูสแตนเลสแบบเจาะยึดผนัง	1.000	ชุด	256.8660	256.87	163.9570	163.96	420.82	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	- งานติดตั้งกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 8"x8"	3.200	ตร.ม.	270.5291	865.69	215.8768	690.81	1,556.50	
	- ทาสีรองพื้นปูนเก่า	204.000	ตร.ม.	40.9893	8,361.81			8,361.81	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายนอก	8.000	ตร.ม.	54.6523	437.22	46.4545	371.64	808.85	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายใน	196.000	ตร.ม.	47.8208	9,372.88	40.9893	8,033.89	17,406.77	
	- ทาสีน้ำมันสีจริง	20.000	ตร.ม.	51.9197	1,038.39	51.9197	1,038.39	2,076.79	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D1 พร้อมลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หน้าบ้าน	2.000	ชุด	5,465.2344	10,930.47	136.6309	273.26	11,203.73	พยาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๒.....มีหน้า.....๑.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D2 พร้อมวงกบ UPVC และ ลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.000	ชุด	5,738.4961	11,476.99	136.6309	273.26	11,750.25	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง บานประตู D1 พร้อมช่องแสงบน ติดตาย	2.000	ชุด	4,372.1875	8,744.38	136.6309	273.26	9,017.64	
	- ติดตั้งบานประตูอะลูมิเนียม D3 พร้อมวงกบและอุปกรณ์ ปิดล็อก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	ชุด	3,415.7715	3,415.77	136.6309	136.63	3,552.40	
	- ติดตั้งหน้าต่างบาน SLIDE อะลูมิเนียมขอบขาว (หน้าบ้าน) W1	1.000	ชุด	11,750.2539	11,750.25	136.6309	136.63	11,886.88	
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W2 พร้อมช่องแสงบน ติดตาย	1.000	ชุด	2,459.3555	2,459.36	136.6309	136.63	2,595.99	
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W3 บานเกร็ดซ้อนคู่ติด ตายพร้อมกระจกฝ้า หนา 6 มม.	1.000	ชุด	2,186.0938	2,186.09	136.6309	136.63	2,322.72	
	- ติดตั้งกระจกติดตายช่องแสงบนบานเกล็ด ขนาด 0.90x0.40 หนา 6 มม.	28.000	ตร.ฟ.	24.5936	688.62	136.6309	136.63	1,645.04	
	- ติดตั้งกระจกบานเกล็ดฝ้า หนา 6 มม.	12.000	แผ่น	40.9893	491.87	136.6309	136.63	491.87	
	- ติดตั้งชุดบานเกล็ดปรับมุมระบบแบบมือหมุน	1.000	ชุด	956.4160	956.42	13.6631	13.66	970.08	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๒.....มีหน้า.....10.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- คอนกรีต ค.2 240 ksc. (คานเอ็นส่วนที่รื้อถอนรอบขวง กบประตูหน้าต่าง)	1.000	ลบ.ม.	2,492.1469	2,492.15	-	-	2,492.15	
	- ปูนฉาบเก็บส่วนที่รื้อถอนวงกบ ปูนทรายฉาบผิวเรียบ หนา 1.5 ซม.เพื่อสูญเสียแล้ว	6.000	ตร.ม.	79.2459	475.48	-	-	475.48	
	- ติดตั้งฝ้าชายคา ไฟเบอร์ซีเมนต์แบบระบายอากาศพร้อม โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	21.000	ตร.ม.	486.4059	10,214.52	(ลงชื่อ).....125.7004.....	2,639.71	ผู้ว่าจ้าง 12,854.23	
	- ติดตั้งฝ้าเพดาน T-bar พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	54.000	ตร.ม.	583.4138	31,504.34	(นายระเด่น สะมะแอ)	3,836.59	35,340.94	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าวเหล็ก ชุบสังกะสี	10.000	ตร.ม.	486.4059	4,864.06	(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)	1,284.33	6,148.39	
1.3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-				(นายวิระ พรหมจินดา)			
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 6 ช่อง (แบบป้องกันไฟดูดและไฟฟ้า ลัดวงจร)	1.000	ชุด	3,005.8789	3,005.88	(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)	-	3,005.88	
	- ชุดเซอร์กิต 15A 1.5kA	6.000	ชุด	161.2244	967.35	(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)	-	967.35	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x2.5 Sq.mm.	600.000	เมตร	17.8713	10,722.79	(นางสาวธนพร บ้านเกิด)	5,738.50	16,461.29	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x1.5 Sq.mm.	540.000	เมตร	11.7229	6,330.38		3,689.03	10,019.41	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....มีหน้า.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 20 mm. สีขาว	100.000	เมตร	18.8414	1,884.14	16.3957	1,639.57	3,523.71	
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟลายลูกฟูก 20 มม. ขนาด 5 เมตร สีขาว	50.000	เมตร	25.4133	1,270.67	7.6240	381.20	1,651.87	
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 2 x 4 นิ้ว	11.000	ชุด	31.4251	345.68	3.6890	40.58	386.26	
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	58.7513	58.75	(ลงชื่อ).....12.7067.....	12.71	71.46	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้งบล็อกลอยไฟฟ้า ขนาด 2 x 4 นิ้ว	13.000	ชุด	12.2968	159.86	(นายระเด่น สะมะแอ) 3.6890	47.96	207.82	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
	- ติดตั้งบล็อกลอยไฟฟ้า ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	24.5936	24.59	5.3286	5.33	29.92	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 3 ช่อง	13.000	ชุด	38.2566	497.34	-	-	497.34	
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 5 ช่อง	1.000	ชุด	62.8502	62.85	(ลงชื่อ).....	-	62.85	ผู้รับจ้าง
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 1 ช่อง	1.000	ชุด	30.0588	30.06	(นายวิระ พรหมจันท)	-	30.06	
	- ติดตั้งเต้ารับกราวด์คู่ 16A, 250V	9.000	ชุด	222.7083	2,004.37	(ลงชื่อ).....23.2272.....	209.05	2,213.42	พยาน
	- ติดตั้งสวิทช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง	9.000	ชุด	28.6925	258.23	12.2968	110.67	368.90	
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 18W แสง Cool Daylight	8.000	ชุด	393.4969	3,147.98	(ลงชื่อ).....150.2939.....	1,202.35	4,350.33	พยาน
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 9W แสง Cool Daylight	1.000	ชุด	215.8768	215.88	(นางสาวธนพร ปานเกิด) 150.2939	150.29	366.17	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก...๖.....มีหน้า.....12.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติการการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งแผ่น PVC ขนาดขนาด 10x12 นิ้ว	1.000	ชุด	91.5427	91.54	-	-	91.54	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x16 Sq.mm.	30.000	เมตร	112.4199	3,372.60	27.3262	819.79	4,192.38	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x10 Sq.mm.	15.000	เมตร	72.4144	1,086.22	21.8609	327.91	1,414.13	
	- ติดตั้งกรวดโหลตบของแดง ขนาด 1.8 เมตร	1.000	ชุด	202.2137	202.21	-	-	202.21	
	- วัสดุสิ้นเปลือง	1.000	งาน	5,011.4286	5,011.43	(นายระเด่น สะมะแอ)		5,011.43	
	รวมค่าซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/8				170,137.97	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	38,797.15	208,935.12	

ลงชื่อ

(นายวิระ พรหมจินดา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติการการโยธา

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....มีหน้า.....13.....ถึง.....

ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิฑิตการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/11		รวม		189,594.64		46,982.82	236,577.45	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							236,577.45	
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/11								
1.1	งานรื้อถอน	-							
	- รื้อถอนผ้าเพดาน T-bar (รื้อชนทั้ง)	54.000	ตร.ม.	-	-	34.1577	1,844.52	1,844.52	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น (รื้อชนทั้ง)	3.000	ตร.ม.	-	-	54.6523	163.96	163.96	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดียว)	4.000	ชุด	-	-	109.3047	437.22	437.22	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างวงกบไม้ พร้อมเหล็กตัด	3.000	ชุด	-	-	54.6523	163.96	163.96	
	- รื้อถอนผ้าเพดาน พร้อมโครงคร่าวไม้ (ผ้าหลังบ้าน) (รื้อชนทั้ง)	3.400	ตร.ม.	-	-	40.9893	139.36	139.36	
	- งานรื้อพื้นอาคาร คสล.วางบนดิน หนา 10 ซม. (รื้อชนทั้ง)	20.700	ตร.ม.	-	-	95.6416	1,979.78	1,979.78	
	- รื้อถอนมุ้งลวด (ช่องระบายอากาศห้องนอน 6.5 ตร.ม.)	1.000	งาน	-	-	136.6309	136.63	136.63	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	-							
	- ทาสีรองพื้นปูนเก่า	204.000	ตร.ม.	40.9893	8,361.81			8,361.81	
	- ทาสีน้ำอะคริลิคผนังภายนอก	8.000	ตร.ม.	54.6523	437.22	46.4545	371.64	808.85	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....มีหน้า.....14.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิฑิตการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายใน	196.000	ตร.ม.	47.8208	9,372.88	40.9893	8,033.89	17,406.77	
	- ทาสีน้ำมันสีจริง 2 รอบ	20.000	ตร.ม.	51.9197	1,038.39	51.9197	1,038.39	2,076.79	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D1 พร้อมลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หน้าบ้าน	2.000	ชุด	5,465.2344	10,930.47	136.6309	273.26	11,203.73	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D2 พร้อมวงกบ UPVC และลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.000	ชุด	5,738.4961	11,476.99	136.6309	273.26	11,750.25	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้งวงกบประตูไม้เนื้อแข็ง บานประตู D1 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	2.000	ชุด	4,372.1875	8,744.38	136.6309	273.26	9,017.64	(นายระเด่น สมะแอ)
	- ติดตั้งบานประตูอะลูมิเนียม D3 พร้อมวงกบและอุปกรณ์ปิดล็อก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	ชุด	3,415.7715	3,415.77	136.6309	136.63	3,552.40	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	- ติดตั้งหน้าต่างบาน SLIDE อะลูมิเนียมขอบขาว (หน้าบ้าน) W1	1.000	ชุด	11,750.2539	11,750.25	136.6309	136.63	11,886.88	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W2 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	1.000	ชุด	2,459.3555	2,459.36	136.6309	136.63	2,595.99	(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....มีหน้า.....15.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิฑิตการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W3 บานเกร็ดซ้อนคู่ติดตายพร้อมกระจกฝ้า หนา 6 มม.	1.000	ชุด	2,186.0938	2,186.09	136.6309	136.63	2,322.72	
	- ติดตั้งกระจกติดตายช่องแสงบนบานเกล็ด ขนาด 0.90x0.40 หนา 6 มม.	28.000	ตร.ฟ.	24.5936	688.62	34.1577	956.42	1,645.04	
	- ติดตั้งกระจกบานเกล็ดฝ้า หนา 6 มม.	12.000	แผ่น	40.9893	491.87	(ลงชื่อ).....	-	ผู้ว่าจ้าง 491.87	
	- ติดตั้งชุดบานเกล็ดปรับมุมระบบแบบมือหมุน	1.000	ชุด	956.4160	956.42	13.66	136.63	970.08	
	- ติดตั้งคอนกรีต ค.2 240 ksc. (คานเอ็นส่วนที่ร้อยถอนรอบๆวงกบประตูหน้าต่าง)	1.000	ลบ.ม.	2,492.1469	2,492.15	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
	- ฉาบเก็บปูนส่วนที่ร้อยถอนวงกบ ปูนทรายฉาบผิวเรียบ หนา 1.5 ซม.เพื่อสูญเสียแล้ว	6.000	ตร.ม.	79.2459	475.48	(ลงชื่อ).....	-	ผู้รับจ้าง 475.48	
	- งานติดตั้ง ก๊อกล้ำ 3/4"	1.000	ชุด	211.7778	211.78	(ลงชื่อ).....	34.1577	245.94	
	- ติดตั้งฝักบัวชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	1.000	ชุด	793.8253	793.83	956.4160	956.42	889.47	
	- ติดตั้งโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ เซรามิคเคลือบขาว	1.000	ชุด	4,097.5595	4,097.56	(ลงชื่อ).....	14.8389	4,112.40	

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....มีหน้า.....16.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิธิตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าเซรามิค พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและชุดก๊อกอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	2,322.7246	2,322.72	614.8389	614.84	2,937.56	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง ล้างพื้น 1/2"	1.000	อัน	163.9570	163.96	34.1577	34.16	198.11	
	- ติดตั้งตะแกรงน้ำทิ้งพื้นห้องน้ำ	1.000	ชุด	457.7134	457.71	34.1577	34.16	491.87	
	- ติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด 0.60 ม.	1.000	ชุด	379.8338	379.83	95.6416	95.64	475.48	
	- ติดตั้งที่ใส่สบู่เซรามิคเคลือบขาวแบบฝังผนัง	1.000	ชุด	434.1582	434.16	163.9570	163.96	598.12	
1.2	- ติดตั้งที่ใส่ทิชชูสแตนเลสแบบเจาะยึดผนัง	1.000	ชุด	256.8660	256.87	163.9570	163.96	420.82	
	- ติดตั้งงานติดตั้งกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 8"x8"	3.200	ตร.ม.	270.5291	865.69	215.8768	690.81	1,556.50	
	- ติดตั้งกระเบื้องปูผนังห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 16"x16"	14.000	ตร.ม.	321.0825	4,495.16	215.8768	3,022.27	7,517.43	
	- ติดตั้งผ้าชายคา ไฟเบอร์ซีเมนต์แบบระบายอากาศพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	21.000	ตร.ม.	486.4059	10,214.52	125.7004	2,639.71	12,854.23	
	- ติดตั้งผ้าเพดาน T-bar พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	54.000	ตร.ม.	583.4138	31,504.34	71.0480	3,836.59	35,340.94	

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....มีหน้า.....17.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิฑิตการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งผ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	10.000	ตร.ม.	486.4059	4,864.06	128.4330	1,284.33	6,148.39	
	- พื้น คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	2.220	ลบ.ม.	4,071.5996	9,038.95	572.4833	1,270.91	10,309.86	
	- ติดตั้งตะแกรงเหล็ก WIRE MESH เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	22.220	ตร.ม.	47.8208	1,062.58	6.8315	151.80	1,214.38	ผู้ว่าจ้าง
	- เทปูนทรายทำพื้นผิวขัดมัน	22.220	ตร.ม.	103.8395	2,307.31	54.6523	1,214.38	3,521.69	ปฏิบัติราชการแทน
1.3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-				นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
	- ติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 6 ช่อง (แบบป้องกันไฟดูดและไฟฟ้าลัดวงจร)	1.000	ชุด	3,005.8789	3,005.88	(ลงชื่อ).....	-	3,005.88	ผู้รับจ้าง
	- ติดตั้งชุดเซอร์กิต 15A 1.5kA	6.000	ชุด	161.2244	967.35	(ลงชื่อ).....	-	967.35	พยาน
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x2.5 Sq.mm.	600.000	เมตร	17.8713	10,722.79	9.5642	5,738.50	16,461.29	(นางสาวภริณทร ทองเทศ)
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x1.5 Sq.mm.	540.000	เมตร	11.7229	6,330.38	6.8315	3,689.03	10,019.41	พยาน
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 20 mm. สีขาว	100.000	เมตร	18.8414	1,884.14	16.3957	1,639.57	3,523.71	(นางสาวธนพร บำรุงกิจ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....มีหน้า.....18.....ถึง.....

ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งท่ออ่อนสายไฟลายลูกฟูก 20 มม. ขนาด 5 เมตร สีขาว	50.000	เมตร	25.4133	1,270.67	7.6240	381.20	1,651.87	
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 2 x 4 นิ้ว	11.000	ชุด	31.4251	345.68	3.6890	40.58	386.26	
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	58.7513	58.75	12.7067	12.71	71.46	
	- ติดตั้งบล็อกลอยไฟฟ้า ขนาด 2 x 4 นิ้ว	13.000	ชุด	12.2968	159.86	3.6890	47.96	207.82	
	- ติดตั้งบล็อกลอยไฟฟ้า ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	24.5936	24.59	5.3286	5.33	29.92	
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 3 ช่อง	13.000	ชุด	38.2566	497.34			497.34	รณนุกององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 5 ช่อง	1.000	ชุด	62.8502	62.85			62.85	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 1 ช่อง	1.000	ชุด	30.0588	30.06			30.06	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
	- ติดตั้งเต้ารับกราวด์คู่ 16A, 250V	9.000	ชุด	222.7083	2,004.37	23.2072	208.86	2,213.42	(นางวิระ พรหมอินทร์)
	- ติดตั้งสวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง	9.000	ชุด	28.6925	258.23	12.2968	110.67	368.90	(ลงชื่อ).....พยาน
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 18W แสง Cool Daylight	8.000	ชุด	393.4969	3,147.98	150.2939	1,202.35	4,350.33	(นางสาวกรินทร์ หอมพศ)
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 9W แสง Cool Daylight	1.000	ชุด	215.8768	215.88	150.2939	150.29	366.17	(ลงชื่อ).....พยาน
	- ติดตั้งแผ่น PVC ขนาดขนาด 10x12 นิ้ว	1.000	ชุด	91.5427	91.54			91.54	(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๖.....มีหน้า.....1๙.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัฐาการการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x16 Sq.mm.	30.000	เมตร	112.4199	3,372.60	27.3262	819.79	4,192.38	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x10 Sq.mm.	15.000	เมตร	72.4144	1,086.22	21.8609	327.91	1,414.13	
	- ติดตั้งแท่งกรวดดีโหลดรูปทองแดง ขนาด 1.8 เมตร	1.000	ชุด	202.2137	202.21	-	-	202.21	
	- ติดตั้งยูแคลมป์ทองเหลือง สำหรับล๊อคแท่งกรวด ขนาด 50-70 มม.	1.000	ชุด	86.0774	86.08	-	-	86.08	
	- วัสดุสิ้นเปลือง	1.000	งาน	5,020.0364	5,020.04	-	-	5,020.04	
	รวมค่าซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/11				189,594.64		46,982.82	236,577.45	

ลงชื่อ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัฐาการการโยธา

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....มีหน้า.....20.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุติการกรโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/12		รวม		179,380.11		44,343.11	223,723.22	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							223,723.22	
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/12								
1.1	งานรื้อถอน	-							
	- รื้อถอนผ้าเพดาน T-bar (รื้อชนทั้ง)	54.000	ตร.ม.	-	-	34.1577	1,844.52	1,844.52	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น (รื้อชนทั้ง)	3.000	ตร.ม.	-	-	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	54.6523 163.96	163.96	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดียว)	4.000	ชุด	-	-	(นายระเด่น สะมะแอ)	109.3047 437.22	437.22	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างวงกบไม้ พร้อมเหล็กคัต	3.000	ชุด	-	-	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	54.6523 163.96	163.96	
	- รื้อถอนผ้าเพดาน พร้อมโครงคร่าวไม้ (ผ้าหลังบ้าน) (รื้อชนทั้ง)	3.400	ตร.ม.	-	-	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง	40.9893 139.36	139.36	
	- งานรื้อพื้นอาคาร คสล.วางบนดิน หนา 10 ซม. (รื้อชนทั้ง)	20.700	ตร.ม.	-	-	(นายวิรัช พรหมจินดา)	95.6416 1,979.78	1,979.78	
	- รื้อถอนมุ้งลวด (ช่องระบายอากาศห้องนอน 6.5 ตร.ม.)	1.000	งาน	-	-	(ลงชื่อ).....พยาน	136.6309 136.63	136.63	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	-							
	- ทาสีรองพื้นปูนเก่า	204.000	ตร.ม.	40.9893	8,361.81	(นางสาวธนพร ปานเกิด)	46.4545 371.64	8,361.81	
	- ทาสีน้ำอะคริลิคผนังภายนอก	8.000	ตร.ม.	54.6523	437.22			808.85	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก...3.....มีหน้า...21.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ทาสีน้ำอะคริลิกผนังภายใน	196.000	ตร.ม.	47.8208	9,372.88	40.9893	8,033.89	17,406.77	
	- ทาสีน้ำมัน	20.000	ตร.ม.	51.9197	1,038.39	51.9197	1,038.39	2,076.79	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D1 พร้อมลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หน้าบ้าน	2.000	ชุด	5,465.2344	10,930.47	136.6309	273.26	11,203.73	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D2 พร้อมวงกบ UPVC และลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.000	ชุด	5,738.4961	11,476.99	136.6309	273.26	11,750.25	ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ)
	- ติดตั้งวงกบประตูไม้เนื้อแข็ง บานประตู D1 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	2.000	ชุด	4,372.1875	8,744.38	136.6309	273.26	9,017.64	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	- ติดตั้งบานประตูอะลูมิเนียม D3 พร้อมวงกบและอุปกรณ์ปิดล็อก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	ชุด	3,415.7715	3,415.77	136.6309	136.63	3,552.40	ผู้รับจ้าง (นายวิรัช พรหมจินดา)
	- ติดตั้งหน้าต่างบาน SLIDE อะลูมิเนียมขอบขาว (หน้าบ้าน) W1	1.000	ชุด	11,750.2539	11,750.25	136.6309	136.63	11,886.88	พยาน (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W2 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	1.000	ชุด	2,459.3555	2,459.36	136.6309	136.63	2,595.99	พยาน (นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....มีหน้า.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติการการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W3 บานเกร็ดซ้อนคู่ติดตายพร้อมกระจกฝ้า หนา 6 มม.	1.000	ชุด	2,186.0938	2,186.09	136.6309	136.63	2,322.72	
	- ติดตั้งกระจกติดตายช่องแสงบนบานเกล็ด ขนาด 0.90x0.40 หนา 6 มม. 22 ชุด	28.000	ตร.ฟ.	24.5936	688.62	34.1577	956.42	1,645.04	
	- กระจกบานเกล็ดฝ้า หนา 6 มม.	12.000	แผ่น	40.9893	491.87	(นายระเด่น สะมะแอ)		491.87	
	- ติดตั้งชุดบานเกล็ดปรับมุมระบบแบบมือหมุน	1.000	ชุด	956.4160	956.42	รองนายก อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		956.42	
	- เทคอนกรีต ค.2 240 ksc. (คานเอ็นส่วนที่ร้อยถอนรอบวงกบประตูหน้าต่าง)	1.000	ลบ.ม.	2,492.1469	2,492.15	(นางสาวกรรณิการ์ งามเทศ)		2,492.15	
	- ติดตั้งงานฉาบเก็บปูนส่วนที่ร้อยถอนวงกบ ปูนทรายฉาบผิวเรียบ หนา 1.5 ซม.เพื่อสูญเสียแล้ว	6.000	ตร.ม.	79.2459	475.48	(นายวิระ พรหมจินดา)		475.48	
	- งานติดตั้ง ก๊อกล้ำ 3/4"	1.000	ชุด	211.7778	211.78	(นางสาวกรรณิการ์ งามเทศ)		211.78	
	- งานติดตั้งฝักบัวชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	1.000	ชุด	793.8253	793.83	95.6416	95.64	889.47	
	- ติดตั้งโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ เซรามิคเคลือบขาว	1.000	ชุด	4,097.5595	4,097.56	(นางสาวกรรณิการ์ งามเทศ)		4,097.56	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....มีหน้า 22.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติการกรรโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าเซรามิค พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและชุดก๊อกอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	2,322.7246	2,322.72	614.8389	614.84	2,937.56	
	- ติดตั้งก๊อกน้ำล้างพื้น ทองเหลือง 1/2"	1.000	ชุด	163.9570	163.96	34.1577	34.16	198.11	
	- ติดตั้งตะแกรงน้ำทิ้งพื้นห้องน้ำ	1.000	ชุด	457.7134	457.71	34.1577	34.16	491.87	
	- ติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด 0.60 ม.	1.000	ชุด	379.8338	379.83	95.6416	95.64	475.48	
	- ติดตั้งที่ใส่สบู่เซรามิคเคลือบขาวแบบฝังผนัง	1.000	ชุด	434.1582	434.16	163.9570	163.96	598.12	
	- ติดตั้งที่ใส่ทิชชูสแตนเลสแบบเจาะยึดผนัง	1.000	ชุด	256.8660	256.87	163.9570	163.96	420.82	
	- ติดตั้งกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 8"x8"	3.200	ตร.ม.	270.5291	865.69	215.8768	215.88	1,556.50	
	- ติดตั้งกระเบื้องปูผนังห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 16"x16"	14.000	ตร.ม.	321.0825	4,495.15	215.8768	3,022.27	7,517.43	
	- ติดตั้งผ้าเพดาน T-bar พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	54.000	ตร.ม.	583.4138	31,504.34	71.0480	3,836.59	35,340.94	
	- ติดตั้งผ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	10.000	ตร.ม.	486.4059	4,864.06	128.4330	1,284.33	6,148.39	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก...3.....มีหน้า...24.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ตำแหน่งส่วนจำกัด วิศวกรการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- เทพิน คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	2.220	ลบ.ม.	4,071.5996	9,038.95	572.4833	1,270.91	10,309.86	
	- ติดตั้งตะแกรงเหล็ก WIRE MESH เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	22.220	ตร.ม.	47.8208	1,062.58	6.8315	151.80	1,214.38	
	- ปูนทรายทำพื้นผิวขัดมัน	22.220	ตร.ม.	103.8395	2,307.84	54.6523	1,214.38	3,521.69	ผู้ว่าจ้าง
1.3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-				(นายระเด่น สะมะแอ)			
	- ติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 6 ช่อง (แบบป้องกันไฟดูดและไฟฟ้าลัดวงจร)	1.000	ชุด	3,005.8789	3,005.88	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		3,005.88	
	- ติดตั้งชุดเซอร์กิต 15A 1.5kA	6.000	ชุด	161.2244	967.35	(ลงชื่อ).....	-	967.35	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x2.5 Sq.mm.	600.000	เมตร	17.8713	10,722.79	9.5642	5,738.50	16,461.29	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x1.5 Sq.mm.	540.000	เมตร	11.7229	6,330.57	(ลงชื่อ).....	6.8315	3,689.03	พยาน
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 20 mm. สีขาว	100.000	เมตร	18.8414	1,884.14	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	16.3957	1,639.57	
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟลายลูกฟูก 20 มม. ขนาด 5 เมตร สีขาว	50.000	เมตร	25.4133	1,270.67	(ลงชื่อ).....	7.6240	381.20	พยาน
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 2 x 4 นิ้ว	11.000	ชุด	31.4251	345.68	(นางสาวรณพร ปานเกิด)	3.6890	40.58	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก...๖.....มีหน้า...๒๕.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิตาการกรโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	58.7513	58.75	12.7067	12.71	71.46	
	- ติดตั้งบล็อกลอยไฟฟ้า ขนาด 2 x 4 นิ้ว	13.000	ชุด	12.2968	159.86	3.6890	47.96	207.82	
	- ติดตั้งบล็อกลอยไฟฟ้า ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	24.5936	24.59	5.3286	5.33	29.92	
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 3 ช่อง	13.000	ชุด	38.2566	497.34	-	-	497.34	
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 5 ช่อง	1.000	ชุด	62.8502	62.85	-	-	62.85	
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 1 ช่อง	1.000	ชุด	30.0588	30.06	-	-	30.06	
	- ติดตั้ง เต้ารับกราวด์คู่ 16A, 250V	9.000	ชุด	222.7083	2,004.37	-	-	2,213.42	
	- ติดตั้งสวิทช์ทางเดียว ขนาด1ช่อง	9.000	ชุด	28.6925	258.23	12.2968	110.67	368.90	
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 18W แสง Cool Daylight	8.000	ชุด	393.4969	3,147.98	150.2939	22,523.51	4,350.33	
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 9W แสง Cool Daylight	1.000	ชุด	215.8768	215.88	150.2939	150.29	366.17	
	- ติดตั้งแผ่น PVC ขนาดขนาด 10x12 นิ้ว	1.000	ชุด	91.5427	91.54	-	-	91.54	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x16 Sq.mm.	30.000	เมตร	112.4199	3,372.60	27.3262	819.79	4,192.38	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x10 Sq.mm.	15.000	เมตร	72.4144	1,086.22	-	-	1,414.13	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....มีหน้า.....26.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งแท่งกรวดโหลดรูปทองแดง ขนาด 1.8 เมตร	1.000	ชุด	202.2137	202.21	-	-	202.21	
	- ติดตั้งยูแคลมป์ทองเหลือง สำหรับล๊อคแท่งกรวด ขนาด 50-70 มม.	1.000	ชุด	86.0774	86.08	-	-	86.08	
	- วัสดุสิ้นเปลือง	1.000	งาน	5,020.0364	5,020.04	-	-	5,020.04	
	รวมค่าซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/12				(ลงชื่อ)..... 179,380.11		ผู้ว่าจ้าง 44,343.11 (นายระเด่น สะมะแอ)	223,723.22	

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจโยธา

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๒.....มีหน้า.....๒๗.....ถึง.....

ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติการการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/13		รวม		179,380.11		44,343.11	223,723.22	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							223,723.22	
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/13								
1.1	งานรื้อถอน	-							
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน T-bar (รื้อชนทั้ง)	54.000	ตร.ม.	-	-	34.1577	1,844.52	1,844.52	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น (รื้อชนทั้ง)	3.000	ตร.ม.	-	-	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	163.96	163.96	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดียว)	4.000	ชุด	-	-	(นายระเด่น สะมะแอ)	437.22	437.22	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างวงกบไม้ พร้อมเหล็กดัด	3.000	ชุด	-	-	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	163.96	163.96	
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงคร่าวไม้ (ฝ้าหลังบ้าน) (รื้อชนทั้ง)	3.400	ตร.ม.	-	-	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	139.36	139.36	
	- งานรื้อพื้นอาคาร คสล.วางบนดิน หน้า 10 ซม. (รื้อชนทั้ง)	20.700	ตร.ม.	-	-	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง	1,979.78	1,979.78	
	- รื้อถอนมุ้งลวด (ช่องระบายอากาศห้องนอน 6.5 ตร.ม.)	1.000	งาน	-	-	(นายวิระ พรหมจินดา)	136.63	136.63	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	-							
	- ทาสีรองพื้นปูนเก่า	204.000	ตร.ม.	40.9893	8,361.81	(ลงชื่อ).....พยาน	-	8,361.81	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายนอก	8.000	ตร.ม.	54.6523	437.22	(นางสาวกรรณพร ปานเกิด)	371.64	808.85	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๖.....มีหน้า.....๒๘.....ถึง.....

ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธาทกรการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายใน	196.000	ตร.ม.	47.8208	9,372.88	40.9893	8,033.89	17,406.77	
	- ทาสีน้ำมันสีจริง 2 รอบ	20.000	ตร.ม.	51.9197	1,038.39	51.9197	1,038.39	2,076.79	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D1 พร้อมลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หน้าบ้าน	2.000	ชุด	5,465.2344	10,930.47	136.6309	273.26	11,203.73	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D2 พร้อมวงกบ UPVC และลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.000	ชุด	5,738.4961	11,476.99	(ลงชื่อ).....136.6309.....	273.26	11,750.25	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้งวงกบประตูไม้เนื้อแข็ง บานประตู D1 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	2.000	ชุด	4,372.1875	8,744.38	136.6309	273.26	9,017.64	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	- ติดตั้งบานประตูอะลูมิเนียม D3 พร้อมวงกบและอุปกรณ์ปิดล็อก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	ชุด	3,415.7715	3,415.77	(ลงชื่อ).....136.6309.....	136.63	3,552.40	ผู้รับจ้าง
	- ติดตั้งหน้าต่างบาน SLIDE อะลูมิเนียมขอบขาว (หน้าบ้าน) W1	1.000	ชุด	11,750.2539	11,750.25	(ลงชื่อ).....136.6309.....	136.63	11,886.88	พยาน
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W2 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	1.000	ชุด	2,459.3555	2,459.36	(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ).....136.6309.....	136.63	2,595.99	
					(ลงชื่อ).....	อนัน		พยาน	

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....มีหน้า.....๒๑.....ถึง.....

ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติดาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W3 บานเกร็ดซ้อนคู่ติดตายพร้อมกระจกฝ้า หน้า 6 มม.	1.000	ชุด	2,186.0938	2,186.09	136.6309	136.63	2,322.72	
	- ติดตั้งกระจกติดตายช่องแสงบนบานเกล็ด ขนาด 0.90x0.40 หน้า 6 มม.	28.000	ตร.ฟ.	24.5936	688.62	34.1577	956.42	1,645.04	
	- ติดตั้งกระจกบานเกล็ดฝ้า หน้า 6 มม.	12.000	แผ่น	40.9893	491.87	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	491.87		
	- ติดตั้งชุดบานเกล็ดปรับมุมระบบแบบมือหมุน	1.000	ชุด	956.4160	956.42	(นายระเด่น สะมะแอ)			
	- เทคอนกรีต ค.2 240 ksc. (คานเอ็นส่วนที่เรือถอนรอบๆวงกบประตูหน้าต่าง)	1.000	ลบ.ม.	2,492.1469	2,492.15	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน			
	- งานฉาบเก็บปูนส่วนที่เรือถอนวงกบ ปูนทรายฉาบผิวเรียบ หน้า 1.5 ซม.เพื่อสูญเสียแล้ว	6.000	ตร.ม.	79.2459	475.48	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
	- งานติดตั้ง ก๊อกล้ำ 3/4"	1.000	ชุด	211.7778	211.78	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง			
	- งานติดตั้ง ฝักบัวชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	1.000	ชุด	793.8253	793.83	(นายวิระ พรหมจินดา)	475.48		
	- ติดตั้งฝักบัวชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	1.000	ชุด	793.8253	793.83	(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)	245.94		
	- ติดตั้งโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ เซรามิคเคลือบขาว	1.000	ชุด	4,097.5595	4,097.56	(ลงชื่อ).....พยาน			
						(นางสาวธนพร บอนเฒ่า)	889.47		
							4,712.40		

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓.....มีหน้า.....๓๐.....ถึง.....

ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิธิตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าเซรามิค พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและชุดก๊อกอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	2,322.7246	2,322.72	614.8389	614.84	2,937.56	
	- งานติดตั้งก๊อกน้ำ 1/2"	1.000	ชุด	163.9570	163.96	34.1577	34.16	198.11	
	- ติดตั้งตะแกรงน้ำทิ้งพื้นห้องน้ำ	1.000	ชุด	457.7134	457.71	34.1577	34.16	491.87	
	- ติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด 0.60 ม.	1.000	ชุด	379.8338	379.83	(ลงชื่อ).....95.6416	95.64	475.48	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้งที่ใส่สบู่เซรามิคเคลือบขาวแบบฝังผนัง	1.000	ชุด	434.1582	434.16	(นายระเด่น สะมะแอ) 163.9570	163.96	598.12	
	- ติดตั้งที่ใส่ทิชชูสแตนเลสแบบเจาะยึดผนัง	1.000	ชุด	256.8660	256.87	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน 163.9570	163.96	420.82	
	- ติดตั้งกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 8"x8"	3.200	ตร.ม.	270.5291	865.69	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 215.8768	696.81	1,556.50	
	- ติดตั้งกระเบื้องปูผนังห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 16"x16"	14.000	ตร.ม.	321.0825	4,495.16	(ลงชื่อ).....215.8768	3,022.27	7,517.43	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้งฝ้าเพดาน T-bar พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	54.000	ตร.ม.	583.4138	31,504.34	(นายระเด่น สะมะแอ) 71.0480	3,856.59	35,340.94	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	10.000	ตร.ม.	486.4059	4,864.06	(ลงชื่อ).....128.4330	1,284.33	6,148.39	พยาน
	- เทคอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.	2.220	ลบ.ม.	4,071.5996	9,038.95	(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ) 572.4833	1,270.91	10,309.86	
	- ติดตั้งตะแกรงเหล็ก WIRE MESH เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	22.220	ตร.ม.	47.8208	1,062.58	(นางสาวธนพร ปานเกิด) 6,8315	151.80	1,214.38	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก...๒.....มีหน้า...๒1.....ถึง.....

ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิตาการการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ปูนทรายทำพื้นผิวขัดมัน	22.220	ตร.ม.	103.8395	2,307.31	54.6523	1,214.38	3,521.69	
1.3	งานระบบไฟฟ้า	-							
	- ติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง (แบบป้องกันไฟดูดและไฟฟ้าลัดวงจร)	1.000	ชุด	3,005.8789	3,005.88	-	-	3,005.88	
	- ติดตั้งชุดเซอร์กิต 15A 1.5kA	6.000	ชุด	161.2244	967.35	(ลงชื่อ).....	-	967.35	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x2.5 Sq.mm.	600.000	เมตร	17.8713	10,722.79	9.5642	5,738.50	16,461.29	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x1.5 Sq.mm.	540.000	เมตร	11.7229	6,330.38	6.3303	3,789.03	10,119.41	รองนายก อบจ. ยะลา
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 20 mm. สีขาว	100.000	เมตร	18.8414	1,884.14	16.3357	1,633.57	3,523.71	นายก อบจ. ยะลา
	- ติดตั้งท่ออ่อนสายไฟลายลูกฟูก 20 มม. ขนาด 5 เมตร สี	50.000	เมตร	25.4133	1,270.67	7.6240	381.20	1,651.87	
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 2 x 4 นิ้ว	11.000	ชุด	31.4251	345.68	3.6890	40.58	386.26	(นายวิระ พรหมจินดา)
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	58.7513	58.75	12.7067	12.71	71.46	(ลงชื่อ).....
	- ติดตั้งบล็อกลอยไฟฟ้า ขนาด 2 x 4 นิ้ว	13.000	ชุด	12.2968	159.86	3.6890	47.96	207.82	(นางสาวกริรินทร์ ทองเท)
	- ติดตั้งบล็อกลอยไฟฟ้า ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	24.5936	24.59	5.3286	5.33	29.92	
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 3 ช่อง	13.000	ชุด	38.2566	497.34	(ลงชื่อ).....	-	497.34	พยาน
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 5 ช่อง	1.000	ชุด	62.8502	62.85	(นางสาวธนพร ปานเกิด)	-	62.85	
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 1 ช่อง	1.000	ชุด	30.0588	30.06	-	-	30.06	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....มีหน้า.....32.....ถึง.....

ชื่อโครงการงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีตารการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งเต้ารับกราวด์คู่ 16A, 250V	9.000	ชุด	222.7083	2,004.37	23.2272	209.05	2,213.42	
	- ติดตั้งสวิทช์ทางเดียว ขนาด1ช่อง	9.000	ชุด	28.6925	258.23	12.2968	110.67	368.90	
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 18W แสง Cool Daylight	8.000	ชุด	393.4969	3,147.98	150.2939	1,202.35	4,350.33	
	- ติดตั้งแผ่น PVC ขนาดขนาด 10x12 นิ้ว	1.000	ชุด	91.5427	91.54	-	-	91.54	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x16 Sq.mm.	30.000	เมตร	112.4199	3,372.60	27.3262	819.79	4,192.38	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x10 Sq.mm.	15.000	เมตร	72.4144	1,086.22	21.8669	478.00	1,414.13	
	- ติดตั้งแท่งกราวด์ไหลดรูปทองแดง ขนาด 1.8 เมตร	1.000	ชุด	202.2137	202.21			202.21	
	- ติดตั้งยูแคลมป์ทองเหลือง สำหรับล๊อคแท่งกราวด์ ขนาด 50-70 มม.	1.000	ชุด	86.0774	86.08			86.08	
	- วัสดุสิ้นเปลือง	1.000	งาน	5,020.0364	5,020.04			5,020.04	
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 9W แสง Cool Daylight	1.000	ชุด	215.8768	215.88	150.2939	225.35	366.17	
	รวมค่าซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/13				179,380.11		44,343.11	223,723.22	

ลงชื่อผู้เสนอราคา

(นายวิระ พรหมจินดา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีตารการโยธา

(ลงชื่อ).....ธนพร.....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....มีหน้า.....๖๖.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติดาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/14		รวม		179,380.11		44,343.11	223,723.22	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							223,723.22	
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/14								
1.1	งานรื้อถอน	-							
	- รื้อถอนผ้าเพดาน T-bar (รื้อชนทั้ง)	54.000	ตร.ม.	-	-	34.1577	1,844.52	1,844.52	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น (รื้อชนทั้ง)	3.000	ตร.ม.	-	(ลงชื่อ).....54.6523.....	163.96	ผู้ว่าจ้าง	163.96	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดียว)	4.000	ชุด	-	-	109.3047	437.22	437.22	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างวงกบไม้ พร้อมเหล็กดัด	3.000	ชุด	-	-	54.6523	163.96	163.96	
	- รื้อถอนผ้าเพดาน พร้อมโครงคร่าวไม้ (ผ้าหลังบ้าน) (รื้อชนทั้ง)	3.400	ตร.ม.	-	-	40.9893	139.36	139.36	
	- งานรื้อพื้นอาคาร คสล.วางบนดิน หนา 10 ซม. (รื้อชนทั้ง)	20.700	ตร.ม.	-	-	95.6413	1,979.78	1,979.78	
	- รื้อถอนมุ้งลวด (ช่องระบายอากาศห้องนอน 6.5 ตร.ม.)	1.000	งาน	-	-	136.6309	136.63	136.63	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	-							
	- ทาสีรองพื้นปูนเก่า	204.000	ตร.ม.	40.9893	8,361.81	-	-	8,361.81	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายนอก	8.000	ตร.ม.	54.6523	437.22	46.4545	371.64	808.85	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายใน	196.000	ตร.ม.	47.8208	9,372.88	40.9893	8,035.89	17,406.77	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3 มีหน้า 38 ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติการการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ทาสีน้ำมัน	20.000	ตร.ม.	51.9197	1,038.39	51.9197	1,038.39	2,076.79	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D1 พร้อมลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หน้าบ้าน	2.000	ชุด	5,465.2344	10,930.47	136.6309	273.26	11,203.73	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D2 พร้อมวงกบ UPVC และลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.000	ชุด	5,738.4961	11,476.99	136.6309	273.26	11,750.25	
	- ติดตั้งวงกบประตูไม้เนื้อแข็ง บานประตู D1 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	2.000	ชุด	4,372.1875	8,744.38	(ลงชื่อ).....136.6309.....ผู้ว่าจ้าง	273.26	9,017.64	
	- ติดตั้งบานประตูอะลูมิเนียม D3 พร้อมวงกบและอุปกรณ์ปิดล็อก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	ชุด	3,415.7715	3,415.77	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	136.6309	3,552.40	
	- ติดตั้งหน้าต่างบาน SLIDE อะลูมิเนียมขอบขาว (หน้าบ้าน) W1	1.000	ชุด	11,750.2539	11,750.25	(ลงชื่อ).....136.6309.....ผู้รับจ้าง	136.63	11,886.88	
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W2 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	1.000	ชุด	2,459.3555	2,459.36	(ลงชื่อ).....136.6309.....พยาน	136.63	2,595.99	
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W3 บานเกร็ดซ้อนคู่ติดตายพร้อมกระจกฝ้า หนา 6 มม	1.000	ชุด	2,186.0938	2,186.09	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเกิด)	136.63	2,322.72	
	- ติดตั้งกระจกติดตายช่องแสงบนบานเกล็ด ขนาด 0.90x0.40 หนา 6 มม.	28.000	ตร.ฟ.	24.5936	688.62	(ลงชื่อ).....5 นม.....พยาน	956.42	1,645.04	
						(นางสาวธนพร ปานเกิด)			

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๓ มีหน้า ๒๕ ถึง.....

ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิฑิตการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งกระชกบานเกล็ดผ้า หนา 6 มม.	12.000	แผ่น	40.9893	491.87	-	-	491.87	
	- ติดตั้งชุดบานเกล็ดปรับมุมระบบแบบมือหมุน	1.000	ชุด	956.4160	956.42	13.6631	13.66	970.08	
	- เทคอนกรีต ค.2 240 ksc. (คานเอ็นส่วนที่รีดรอบวงกบประตูหน้าต่าง)	1.000	ลบ.ม.	2,492.1469	2,492.15	-	-	2,492.15	
	- งานฉาบเก็บปูนส่วนที่รีดรอบวงกบ ปูนทรายฉาบผิวเรียบ หนา 1.5 ซม.เพื่อสูญเสียแล้ว	6.000	ตร.ม.	79.2459	475.48	-	-	475.48	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้ง ก๊อกล้ำ 3/4"	1.000	ชุด	211.7778	211.78	34.1577	34.16	245.94	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
	- ติดตั้งฝักบัวชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	1.000	ชุด	793.8253	793.83	95.6416	95.64	889.47	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	- ติดตั้งโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ เซรามิคเคลือบขาว	1.000	ชุด	4,097.5595	4,097.56	614.8389	614.84	4,712.40	(ลงชื่อ)..... (นายวิระ พรหมจินดา)
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าเซรามิค พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและชุดก๊อกอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	2,322.7246	2,322.72	614.8389	614.84	2,937.56	(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)
	- ติดตั้งก๊อกล้ำล้างพื้น 1/2 "	1.000	ชุด	163.9570	163.96	-	-	198.11	
	- ติดตั้งตะแกรงน้ำทิ้งพื้นห้องน้ำ	1.000	ชุด	457.7134	457.71	34.1577	34.16	491.87	(ลงชื่อ)..... (นาย)..... พยาน
	- ติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด 0.60 ม.	1.000	ชุด	379.8338	379.83	95.6416	95.64	475.48	(นางสาวธนพร ปานเกิด)
	- ติดตั้งทึ่ใส่สบู่เซรามิคเคลือบขาวแบบฝังผนัง	1.000	ชุด	434.1582	434.16	163.9570	163.96	598.12	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....มีหน้า.....26.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุตากรการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งที่ใส่ที่ซูล์สเดนเลสแบบเจาะยึดผนัง	1.000	ชุด	256.8660	256.87	163.9570	163.96	420.82	
	- ติดตั้งกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 8"x8"	3.200	ตร.ม.	270.5291	865.69	215.8768	690.81	1,556.50	
	- ติดตั้งกระเบื้องปูผนังห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 16"x16"	14.000	ตร.ม.	321.0825	4,495.16	215.8768	3,022.27	7,517.43	
	- ติดตั้งฝ้าเพดาน T-bar พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	54.000	ตร.ม.	583.4138	31,504.34	71.0480	3,836.59	35,340.94	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	10.000	ตร.ม.	486.4059	4,864.06 (ลงชื่อ).....	128.4330	1,284.33	6,148.39	ผู้ว่าจ้าง
						(นายระเด่น สะมะแอ)			
	- เทพื้น คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	2.220	ลบ.ม.	4,071.5996	9,038.95	1,214.38	1,214.38	10,253.33	รองนายก อบจ. ยะลา
						นายก อบจ. ยะลา			
	- ติดตั้งตะแกรงเหล็ก WIRE MESH เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	22.220	ตร.ม.	47.8208	1,062.58	6.8315	151.80	1,214.38	
					(ลงชื่อ).....				
	- ปูนทรายทำพื้นผิวขัดมัน	22.220	ตร.ม.	103.8395	2,307.31	54.6523	1,214.38	3,521.69	
					(ลงชื่อ).....				
1.3	งานระบบไฟฟ้า	-							พยาน
	- ติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 6 ช่อง (แบบป้องกันไฟดูดและไฟฟ้าลัดวงจร)	1.000	ชุด	3,005.8789	3,005.88	(นางสาวกรินทร์ ทองเทศ)		3,005.88	
					(ลงชื่อ).....				
	- ติดตั้งชุดเซอร์กิต 15A 1.5kA	6.000	ชุด	161.2244	967.35	(นางสาวธนพร ปานเกิด)		967.35	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x2.5 Sq.mm.	600.000	เมตร	17.8713	10,722.79	9.5642	5,738.50	16,461.29	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....มีหน้า.....27.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติการการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x1.5 Sq.mm.	540.000	เมตร	11.7229	6,330.38	6.8315	3,689.03	10,019.41	
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 20 mm. สีขาว	100.000	เมตร	18.8414	1,884.14	16.3957	1,639.57	3,523.71	
	- ติดตั้งท่ออ่อนสายไฟลายลูกฟูก 20 มม. ขนาด 5 เมตร สีขาว	50.000	เมตร	25.4133	1,270.67	7.6240	381.20	1,651.87	
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 2 x 4 นิ้ว	11.000	ชุด	31.4251	345.68	3.6890	40.58	386.26	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	58.7513	58.75	12.7067	12.71	71.46	(นายวิระเด่น สะมะแอ)
	- ติดตั้งบล็อกลอยไฟฟ้า ขนาด 2 x 4 นิ้ว	13.000	ชุด	12.2968	159.86	3.6890	47.96	207.82	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
	- ติดตั้งบล็อกลอยไฟฟ้า ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	24.5936	24.59	5.3286	5.33	29.92	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 3 ช่อง	13.000	ชุด	38.2566	497.34	-	-	497.34	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 5 ช่อง	1.000	ชุด	62.8502	62.85	-	-	62.85	(นายวิระ พรหมจินดา)
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 1 ช่อง	1.000	ชุด	30.0588	30.06	-	-	30.06	(ลงชื่อ).....พยาน
	- ติดตั้งเต้ารับกราวด์คู่ 16A, 250V	9.000	ชุด	222.7083	2,004.37	23.2272	209.05	2,213.42	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)
	- ติดตั้งสวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง	9.000	ชุด	28.6925	258.23	12.2968	110.67	368.90	(ลงชื่อ).....พยาน
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 18W แสง Cool Daylight	8.000	ชุด	393.4969	3,147.98	150.2939	1,202.35	4,350.33	(นางสาวธนพร ปานเกิด)
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 9W แสง Cool Daylight	1.000	ชุด	215.8768	215.88	150.2939	150.29	366.17	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๖.....มีหน้า.....๖๙.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติการการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งแผ่น PVC ขนาดขนาด 10x12 นิ้ว	1.000	ชุด	91.5427	91.54	-	-	91.54	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x16 Sq.mm.	30.000	เมตร	112.4199	3,372.60	27.3262	819.79	4,192.38	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x10 Sq.mm.	15.000	เมตร	72.4144	1,086.22	21.8609	327.91	1,414.13	
	- ติดตั้งแท่งกราวด์โหลตรูปทองแดง ขนาด 1.8 เมตร	1.000	ชุด	202.2137	202.21	-	-	202.21	
	- ติดตั้งยูแคลมป์ทองเหลือง สำหรับล๊อคแท่งกราวด์ ขนาด 50-70 มม.	1.000	ชุด	86.0774	86.08	(นายระเด่น สะมะแอ)		86.08	
	- วัสดุสิ้นเปลือง	1.000	งาน	5,020.0364	5,020.04	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน		5,020.04	
	รวมค่าซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/14				179,360.11	(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)	44,343.11	223,723.22	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นายวิระ พรหมจินดา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติการการโยธา

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ หอมเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....มีหน้า.....๒๗.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรการกรโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/15		รวม		3,372.60		819.79	4,192.38	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							4,192.38	
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/15								
1.1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน T-bar (รื้อชนทั้ง)	54.000	ตร.ม.	-	-	34.1577	1,844.52	1,844.52	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น (รื้อชนทั้ง)	3.000	ตร.ม.	-	(ลงชื่อ).....54.6523.....	163.96	ผู้ว่าจ้าง	163.96	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดียว)	4.000	ชุด	-	-	109.3047	437.22	437.22	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างวงกบไม้ พร้อมเหล็กดัด	3.000	ชุด	-	-	54.6523	163.96	163.96	
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงคร่าวไม้ (ฝ้าหลังบ้าน) (รื้อชนทั้ง)	3.400	ตร.ม.	-	-	40.9893	139.36	139.36	
	- งานรื้อพื้นอาคาร คสล.วางบนดิน หน้า 10 ซม. (รื้อชนทั้ง)	20.700	ตร.ม.	-	-	95.6416	1,979.78	1,979.78	
	- รื้อถอนมุ้งลวด (ช่องระบายอากาศห้องนอน 6.5 ตร.ม.)	1.000	งาน	-	(ลงชื่อ).....136.6309.....	136.63	พยาน	136.63	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	- ทาสีรองพื้นปูนเก่า	204.000	ตร.ม.	40.9893	8,361.81	(ลงชื่อ).....	5000	พยาน	8,361.81
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายนอก	8.000	ตร.ม.	54.6523	437.22	46.4545	371.64	808.85	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายใน	196.000	ตร.ม.	47.8208	9,372.88	40.9893	8,033.89	17,406.77	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๑.....มีหน้า 46.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรการกรโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ทาสีน้ำมัน	20.000	ตร.ม.	51.9197	1,038.39	51.9197	1,038.39	2,076.79	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D1 พร้อมลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หน้าบ้าน	2.000	ชุด	5,465.2344	10,930.47	136.6309	273.26	11,203.73	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D2 พร้อมวงกบ UPVC และลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.000	ชุด	5,738.4961	11,476.99	136.6309	273.26	11,750.25	
	- ติดตั้งวงกบประตูไม้เนื้อแข็ง บานประตู D1 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	2.000	ชุด	4,372.1875	8,744.38	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง 136.6309 273.26 (นายระเด่น สะมะแอ)		9,017.64	
	- ติดตั้งบานประตูอะลูมิเนียม D3 พร้อมวงกบและอุปกรณ์ปิดล็อก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	ชุด	3,415.7715	3,415.77	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 136.6309 136.63		3,552.40	
	- ติดตั้งหน้าต่างบาน SLIDE อะลูมิเนียมขอบขาว (หน้าบ้าน)	1.000	ชุด	11,750.2539	11,750.25	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง 136.6309 136.63		11,886.88	
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W2 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	1.000	ชุด	2,459.3555	2,459.36	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง 136.6309 136.63 (นายวิระ พรหมจินดา)		2,595.99	
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W3 บานเกร็ดซ้อนคู่ติดตายพร้อมกระจกฝ้า หน้า 6 มม.	1.000	ชุด	2,186.0938	2,186.09	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง 136.6309 136.63 (นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)		2,322.72	
	- ติดตั้งกระจกติดตายช่องแสงบนบานเกล็ด ขนาด 0.90x0.40 หน้า 6 มม.	28.000	ตร.ฟ.	24.5936	688.62	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง 34.1577 956.42 (นางสาวธนพร ปานเกิด)		1,645.04	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก...3...มีหน้า...41...ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิดาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งกระจากบานเกล็ดผ้า หน้า 6 มม.	12.000	แผ่น	40.9893	491.87	-	-	491.87	
	- ติดตั้งชุดบานเกล็ดปรับมุมระบบแบบมือหมุน	1.000	ชุด	956.4160	956.42	13.6631	13.66	970.08	
	- เทคอนกรีต ค.2 240 ksc. (คานเอ็นส่วนที่รื้อถอนรอบๆวงกบประตูหน้าต่าง)	1.000	ลบ.ม.	2,492.1469	2,492.15	-	-	2,492.15	
	- งานฉาบเก็บปูนส่วนที่รื้อถอนวงกบ ปูนทรายฉาบผิวเรียบ หน้า 1.5 ซม.เมื่อสูญเสียแล้ว	6.000	ตร.ม.	79.2459	475.48	-	-	475.48	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้ง ก๊อกรน้ำ 3/4"	1.000	ชุด	211.7778	211.78	-	-	211.78	(นายระเด่น สะมะแอ)
	- ติดตั้งฝักบัวชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	1.000	ชุด	793.8253	793.83	95.6416	95.64	889.47	รองนายก อบจ.ยล
	- ติดตั้งโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ เซรามิคเคลือบขาว	1.000	ชุด	4,097.5595	4,097.56	614.8389	614.84	4,712.40	นายก อบจ.ยล
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าเซรามิค พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและชุดก๊อกอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	2,322.7246	2,322.72	614.8389	614.84	2,937.56	(นางสาวศิริรินทร์ ทองเทศ)
	- ติดตั้งก๊อกน้ำทองเหลือง 1/2"	1.000	ชุด	163.9570	163.96	34.1577	34.16	198.11	(นางสาวศิริรินทร์ ทองเทศ)
	- ติดตั้งตะแกรงน้ำทิ้งพื้นห้องน้ำ	1.000	ชุด	457.7134	457.71	34.1577	34.16	491.87	(นางสาวศิริรินทร์ ทองเทศ)
	- ติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด 0.60 ม.	1.000	ชุด	379.8338	379.83	95.6416	95.64	475.48	(นางสาวศิริรินทร์ ทองเทศ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....มีหน้า.....42.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งที่ใส่สบูเซรามิคเคลือบขาวแบบฝังผนัง	1.000	ชุด	434.1582	434.16	163.9570	163.96	598.12	
	- ติดตั้งที่ใส่ทิชชูสเตนเลสแบบเจาะยึดผนัง	1.000	ชุด	256.8660	256.87	163.9570	163.96	420.82	
	- ติดตั้งกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 8"x8"	3.200	ตร.ม.	270.5291	865.69	215.8768	690.81	1,556.50	
	- ติดตั้งกระเบื้องปูผนังห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 16"x16"	14.000	ตร.ม.	321.0825	4,495.16	215.8768	3,022.27	7,517.43	
	- ติดตั้งฝ้าเพดาน T-bar พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	54.000	ตร.ม.	583.4138	31,504.34	71.0480	3,836.59	35,340.94	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้งฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	10.000	ตร.ม.	486.4059	4,864.06	128.4330	1,284.33	6,148.39	
	- เทพื้น คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	2.220	ลบ.ม.	4,071.5996	9,038.95	10,309.86		10,309.86	
	- ติดตั้งตะแกรงเหล็ก WIRE MESH เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	22.220	ตร.ม.	47.8208	1,062.58	6.8315	151.80	1,214.38	
	- ปูนทรายทำพื้นผิวขัดมัน	22.220	ตร.ม.	103.8395	2,307.18	54.6523	1,214.38	3,521.69	พยาน
1.3	งานระบบไฟฟ้า					(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)			
	- ติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 6 ช่อง (แบบป้องกันไฟดูดและไฟฟ้าลัดวงจร)	1.000	ชุด	3,005.8789	3,005.88	-	-	3,005.88	
	- ติดตั้งชุดเซอร์กิต 15A 1.5kA	6.000	ชุด	161.2244	967.35	-	-	967.35	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....มีหน้า.....43.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิตาการกรโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x2.5 Sq.mm.	600.000	เมตร	17.8713	10,722.79	9.56	5,738.50	16,461.29	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x1.5 Sq.mm.	540.000	เมตร	11.7229	6,330.38	6.83	3,689.03	10,019.41	
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 20 mm. สีขาว	100.000	เมตร	18.8414	1,884.14	16.40	1,639.57	3,523.71	
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟลายลูกฟูก 20 มม. ขนาด 5 เมตร สีขาว	50.000	เมตร	25.4133	1,270.67	7.62	381.20	1,651.87	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 2 x 4 นิ้ว	11.000	ชุด	31.4251	345.68	(นายระเด่น สะมะนอ)	40.58	386.26	
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	58.7513	58.75	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	12.71	71.46	
	- ติดตั้งบล็อกลอยไฟฟ้า ขนาด 2 x 4 นิ้ว	13.000	ชุด	12.2968	159.86	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	3.69	47.96	
	- ติดตั้งบล็อกลอยไฟฟ้า ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	24.5936	24.59	(นางสาวกมลทิพย์ หอมเย็น)	5.33	29.92	
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อคลอยไฟฟ้า 3 ช่อง	13.000	ชุด	38.2566	497.34	(นายวิระ พรหมจิตตา)	-	497.34	
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อคลอยไฟฟ้า 5 ช่อง	1.000	ชุด	62.8502	62.85	(นางสาวกมลทิพย์ หอมเย็น)	-	62.85	พยาน
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อคลอยไฟฟ้า 1 ช่อง	1.000	ชุด	30.0588	30.06	(นางสาวกมลทิพย์ หอมเย็น)	-	30.06	
	- ติดตั้งเต้ารับกราวด์คู่ 16A, 250V	9.000	ชุด	222.7083	2,004.37	(นางสาวกมลทิพย์ หอมเย็น)	23.23	2,213.42	พยาน
	- ติดตั้งสวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง	9.000	ชุด	28.6925	258.23	(นางสาวกมลทิพย์ หอมเย็น)	-	258.23	
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 18W แสง Cool Daylight	8.000	ชุด	393.4969	3,147.98	150.29	1,202.35	4,350.33	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3.....มีหน้า.....44.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 9W แสง Cool Daylight	1.000	ชุด	215.8768	215.88	150.29	150.29	366.17	
	- ติดตั้งแผ่น PVC ขนาดขนาด 10x12 นิ้ว	1.000	ชุด	91.5427	91.54	-	-	91.54	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x10 Sq.mm.	15.000	เมตร	72.4144	1,086.22	21.86	327.91	1,414.13	
	- ติดตั้งแท่งกราวด์โหลตรูปทองแดง ขนาด 1.8 เมตร	1.000	ชุด	202.2137	202.21	-	-	202.21	
	- ติดตั้งยูแคลมป์ทองเหลือง สำหรับล๊อคแท่งกราวด์ ขนาด 50-70 มม.	1.000	ชุด	86.0774	86.08	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	-	86.08	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x16 Sq.mm.	30.000	เมตร	112.4199	3,372.60	27.33	819.79	4,192.38	
	- วัสดุสิ้นเปลือง	1.000	งาน	5,020.0364	5,020.04	-	-	5,020.04	
	รวมค่าซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/15				179,380.11	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง	44,343.11	223,723.22	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรการโยธา

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ผนวก.....3.....มีหน้า.....45.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิฑิตการกรโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/16		รวม		179,380.11		44,343.11	223,723.22	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							223,723.22	
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/16								
1.1	งานรื้อถอน	-							
	- รื้อถอนผ้าเพดาน T-bar (รื้อชนทั้ง)	54.000	ตร.ม.	-	-	34.1577	1,844.52	1,844.52	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น (รื้อชนทั้ง)	3.000	ตร.ม.	-	-	(ลงชื่อ).....54.6523.....	163.96	163.96	ผู้ว่าจ้าง
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดียว)	4.000	ชุด	-	-	(นายระเด่น สะมะแอ) 109.3047	437.22	437.22	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างวงกบไม้ พร้อมเหล็กตัด	3.000	ชุด	-	-	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดยะลา	163.96	163.96	
	- รื้อถอนผ้าเพดาน พร้อมโครงคร่าวไม้ (ผ้าหลังบ้าน) (รื้อชนทั้ง)	3.400	ตร.ม.	-	-	(ลงชื่อ).....40.9893.....	139.36	139.36	ผู้รับจ้าง
	- งานรื้อพื้นอาคาร คสล.วางบนดิน หน้า 10 ซม. (รื้อชนทั้ง)	20.700	ตร.ม.	-	-	(นายวิระ พรหมจินดา) 95.6416	1,979.78	1,979.78	
	- รื้อถอนมุ้งลวด (ช่องระบายอากาศห้องนอน 6.5 ตร.ม.)	1.000	งาน	-	-	(ลงชื่อ).....	136.63	136.63	พยาน
						(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) 136.6309	136.63	136.63	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	-				(ลงชื่อ).....	0.00	0.00	พยาน
	- ทาสีรองพื้นปูนเก่า	204.000	ตร.ม.	40.9893	8,361.81	(นางสาวธนพร ปานเกิด)		8,361.81	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายนอก	8.000	ตร.ม.	54.6523	437.22	46.4545	371.64	808.85	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก...3.....มีหน้า...4๖.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุติการกรโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายใน	196.000	ตร.ม.	47.8208	9,372.88	40.9893	8,033.89	17,406.77	
	- ทาสีน้ำมัน	20.000	ตร.ม.	51.9197	1,038.39	51.9197	1,038.39	2,076.79	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D1 พร้อมลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หน้าบ้าน	2.000	ชุด	5,465.2344	10,930.47	136.6309	273.26	11,203.73	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D2 พร้อมวงกบ UPVC และลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.000	ชุด	5,738.4961	11,476.99	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง 136.6309 273.26 (นายระเด่น สะมะแอ)		11,750.25	
	- ติดตั้งวงกบประตูไม้เนื้อแข็ง บานประตู D1 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	2.000	ชุด	4,372.1875	8,744.38	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 136.6309 273.26		9,017.64	
	- ติดตั้งบานประตูอะลูมิเนียม D3 พร้อมวงกบและอุปกรณ์ปิดล็อก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	ชุด	3,415.7715	3,415.77	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง 136.6309 136.63 (นายวิระ พรหมจินดา)		3,552.40	
	- ติดตั้งหน้าต่างบาน SLIDE อะลูมิเนียมขอบขาว (หน้าบ้าน) W1	1.000	ชุด	11,750.2539	11,750.25	(ลงชื่อ).....พยาน 136.6309 136.63		11,886.88	
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W2 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	1.000	ชุด	2,459.3555	2,459.36	(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) 136.6309 136.63 (ลงชื่อ).....พยาน		2,595.99	

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ผนวก.....๑.....มีหน้า.....49.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุติการกรโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W3 บานเกร็ดซ้อนคู่ติดตายพร้อมกระจกฝ้า หนา 6 มม.	1.000	ชุด	2,186.0938	2,186.09	136.6309	136.63	2,322.72	
	- ติดตั้งกระจกติดตายช่องแสงบนบานเกล็ด ขนาด 0.90x0.40 หนา 6 มม.	28.000	ตร.ฟ.	24.5936	688.62	34.1577	956.42	1,645.04	
	- ติดตั้งกระจกบานเกล็ดฝ้า หนา 6 มม.	12.000	แผ่น	40.9893	491.87 (ลงชื่อ).....	-	-	ผู้ว่าจ้าง 491.87	
	- ติดตั้งชุดบานเกล็ดปรับมุมระบบแบบมือหมุน	1.000	ชุด	956.4160	956.42	13.6631 (นายระเด่น สะมะแอ)	13.66	970.08	
	- เทคอนกรีต ค.2 240 ksc. (คานเอ็นส่วนที่ร้อยถอนรอบๆวงกบประตูหน้าต่าง)	1.000	ลบ.ม.	2,492.1469	2,492.15	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		2,492.15	
	- ฉาบเก็บปูนส่วนที่ร้อยถอนวงกบ ปูนทรายฉาบผิวเรียบ หนา 1.5 ซม.เพื่อสูญเสียแล้ว	6.000	ตร.ม.	79.2459	475.48 (ลงชื่อ).....	(นายวิระ พุทธิหมจินดา) ผู้รับจ้าง		475.48	
	- ติดตั้ง ก๊อกล้ำ 3/4"	1.000	ชุด	211.7778	211.78 (ลงชื่อ).....	34.1577	34.16	พยาน 245.94	
	- ติดตั้งฝักบัวชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	1.000	ชุด	793.8253	793.83	95.6416 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)	95.64	889.47	
	- ติดตั้งโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ เซรามิคเคลือบขาว	1.000	ชุด	4,097.5595	4,097.56 (ลงชื่อ).....	614.8588 (นางสาวธนพร ปานจิต)	-	4,712.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ผนวก.....๑.....มีหน้า 48.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุติการกรโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าเซรามิค พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและชุดก๊อกอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	2,322.7246	2,322.72	614.8389	614.84	2,937.56	
	- ติดตั้งก๊อกน้ำทองเหลือง 1/2"	1.000	ชุด	163.9570	163.96	34.1577	34.16	198.11	
	- ติดตั้งตะแกรงน้ำทิ้งพื้นห้องน้ำ	1.000	ชุด	457.7134	457.71	34.1577	34.16	491.87	
	- ติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด 0.60 ม.	1.000	ชุด	379.8338	379.83	95.6416	95.64	475.48	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้งที่ใส่ส้วมเซรามิคเคลือบขาวแบบฝังผนัง	1.000	ชุด	434.1582	434.16	163.9570	163.96	598.12	
	- ติดตั้งที่ใส่ชักโครกสแตนเลสแบบเจาะยึดผนัง	1.000	ชุด	256.8660	256.87	163.9570	163.96	420.82	รองนายก อบจ. ยะลา
	- ติดตั้งกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 8"x8"	3.200	ตร.ม.	270.5291	865.69	215.8768	865.69	1,556.50	นายก อบจ. ยะลา
	- ติดตั้งกระเบื้องปูผนังห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 16"x16"	14.000	ตร.ม.	321.0825	4,495.16	215.8768	3,022.27	7,517.43	ผู้รับจ้าง
	- ติดตั้งผ้าเพดาน T-bar พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	54.000	ตร.ม.	583.4138	31,504.34	71.0480	3,836.59	35,340.94	
	- ติดตั้งผ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	10.000	ตร.ม.	486.4059	4,864.06	128.4350	1,284.35	6,148.39	พยาน
	- เทพื้น คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	2.220	ลบ.ม.	4,071.5996	9,038.95	572.4833	1,270.91	10,309.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ผนวก.....๒.....มีหน้า.....4๑.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการกรโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งตะแกรงเหล็ก WIRE MESH เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	22.220	ตร.ม.	47.8208	1,062.58	6.8315	151.80	1,214.38	
	- ปูนทรายทำพื้นผิวขัดมัน	22.220	ตร.ม.	103.8395	2,307.31	54.6523	1,214.38	3,521.69	
1.3	ระบบไฟฟ้า	-							
	- ติดตั้งคอนซูเมอร์ยูนิต์ 6 ช่อง (แบบป้องกันไฟดูดและไฟฟ้าลัดวงจร)	1.000	ชุด	3,005.8789	3,005.88	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ)	3,005.88		
	- ติดตั้งชุดเซอร์กิต 15A 1.5kA	6.000	ชุด	161.2244	967.35	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	967.35		
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x2.5 Sq.mm.	600.000	เมตร	17.8713	10,722.79	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	5,738.50	16,461.29	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x1.5 Sq.mm.	540.000	เมตร	11.7229	6,330.38	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายวิระ พรหมจินดา)	3,689.03	10,019.41	
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 20 mm. สีขาว	100.000	เมตร	18.8414	1,884.14	16.3957	1,639.57	3,523.71	
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟลายลูกฟูก 20 มม. ขนาด 5 เมตร สีขาว	50.000	เมตร	25.4133	1,270.67	(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)	381.20	1,651.87	
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 2 x 4 นิ้ว	11.000	ชุด	31.4251	345.68	(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวธนพร ปานกิต)	40.58	386.26	
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	58.7513	58.75	12.7067	12.71	71.46	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....๕.....มีหน้า.....๕๐.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุติการกรโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งปลั๊กลอยไฟฟ้า ขนาด 2 x 4 นิ้ว	13.000	ชุด	12.2968	159.86	3.6890	47.96	207.82	
	- ติดตั้งปลั๊กลอยไฟฟ้า ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	24.5936	24.59	5.3286	5.33	29.92	
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อคลอยไฟฟ้า 3 ช่อง	13.000	ชุด	38.2566	497.34	-	-	497.34	
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อคลอยไฟฟ้า 5 ช่อง	1.000	ชุด	62.8502	62.85	-	-	62.85	
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อคลอยไฟฟ้า 1 ช่อง	1.000	ชุด	30.0588	30.06	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง		30.06	
	- ติดตั้งเต้ารับกราวด์คู่ 16A, 250V	9.000	ชุด	222.7083	2,004.37	(นายระเด่น สะมะแอ) 23.2272	209.05	2,213.42	
	- ติดตั้งสวิตช์ทางเดียว ขนาด1ช่อง	9.000	ชุด	28.6925	258.23	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน 12.2968	140.67	368.90	
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 18W แสง Cool Daylight	8.000	ชุด	393.4969	3,147.98	150.2939	202.35	4,350.33	
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 9W แสง Cool Daylight	1.000	ชุด	215.8768	215.88	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง 150.2939	150.29	366.17	
	- ติดตั้งแผ่น PVC ขนาดขนาด 10x12 นิ้ว	1.000	ชุด	91.5427	91.54	(นางวิระ พรหมรัตน์) -		91.54	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x16 Sq.mm.	30.000	เมตร	112.4199	3,372.60	(ลงชื่อ).....นางสาวกรินทร์ ทองเกิด 27.3262	819.78	4,192.38	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x10 Sq.mm.	15.000	เมตร	72.4144	1,086.22	(นางสาวกรินทร์ ทองเกิด) 21.8609	327.91	1,414.13	
	- ติดตั้งแท่งกราวด์ไหลลุดทองแดง ขนาด 1.8 เมตร	1.000	ชุด	202.2137	202.21	(นางสาวธนพร ปานเกิด) 6.00		202.21	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ผนวก.....3 มีหน้า 51 ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งยูแคลมป์ทองเหลือง สำหรับล๊อคแท่งกราวด์ ขนาด 50-70 มม.	1.000	ชุด	86.0774	86.08	-	-	86.08	
	- วัสดุสิ้นเปลือง	1.000	งาน	5,020.0364	5,020.04	-	-	5,020.04	
	รวมค่าซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/16				179,380.11		44,343.11	223,723.22	

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นายวิระ พรหมจินดา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตาการโยธา



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....
 ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17,
 ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ผนวก.....3.....มีหน้า.....52.....ถึง.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติการกรโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/17		รวม		86.08		-	86.08	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							86.08	
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/17								
1.1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนผ้าเพดาน T-bar (รื้อชนทั้ง)	54.000	ตร.ม.	-	-	34.1577	1,844.52	1,844.52	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น (รื้อชนทั้ง)	3.000	ตร.ม.	-	(ลงชื่อ).....54.6523.....	163.96	ผู้ว่าจ้าง	163.96	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดียว)	4.000	ชุด	-	-	109.3047	437.22	437.22	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างวงกบไม้ พร้อมเหล็กดัด	3.000	ชุด	-	-	54.6523	163.96	163.96	
	- รื้อถอนผ้าเพดาน พร้อมโครงคร่าวไม้ (ผ้าหลังบ้าน) (รื้อชนทั้ง)	3.400	ตร.ม.	-	(ลงชื่อ).....40.9893.....	139.36	ผู้รับจ้าง	139.36	
	- งานรื้อพื้นอาคาร คสล.วางบนดิน หนา 10 ซม. (รื้อชนทั้ง)	20.700	ตร.ม.	-	-	95.6416	1,979.78	1,979.78	
	- รื้อถอนมุ้งลวด (ช่องระบายอากาศห้องนอน 6.5 ตร.ม.)	1.000	งาน	-	(ลงชื่อ).....136.6309.....	136.63	พยาน	136.63	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	- ทาสีรองพื้นปูนเก่า	204.000	ตร.ม.	40.9893	8,361.81	(ลงชื่อ).....-.....	-	พยาน	8,361.81
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายนอก	8.000	ตร.ม.	54.6523	437.22	(ลงชื่อ).....40.9893.....	139.36	พยาน	437.22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ผนวก.....3.....มีหน้า.....53.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติการกรโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายใน	196.000	ตร.ม.	47.8208	9,372.88	40.9893	8,033.89	17,406.77	
	- ทาสีน้ำมัน	20.000	ตร.ม.	51.9197	1,038.39	51.9197	1,038.39	2,076.79	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D1 พร้อมลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หน้าบ้าน	2.000	ชุด	5,465.2344	10,930.47	136.6309	273.26	11,203.73	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D2 พร้อมวงกบ UPVC และลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.000	ชุด	5,738.4961	11,476.99	136.6309	273.26	11,750.25	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้งวงกบประตูไม้เนื้อแข็ง บานประตู D1 พร้อมช่องแสง	2.000	ชุด	4,372.1875	8,744.38	136.6309	273.26	9,017.64	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
	- ติดตั้งบานประตูอะลูมิเนียม D3 พร้อมวงกบและอุปกรณ์ปิดล็อก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	ชุด	3,415.7715	3,415.77	136.6309	136.63	3,552.40	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	- ติดตั้งหน้าต่างบาน SLIDE อลูมิเนียมขอบขาว (หน้าบ้าน) W1	1.000	ชุด	11,750.2539	11,750.25	136.6309	136.63	11,886.88	ผู้รับจ้าง
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W2 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	1.000	ชุด	2,459.3555	2,459.36	136.6309	136.63	2,595.99	(นางสาวณพร ปานเกิด)
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W3 บานเกร็ดซ้อนคู่ติดตายพร้อมกระจกฝ้า หน้า 6 มม.	1.000	ชุด	2,186.0938	2,186.09	136.6309	136.63	2,322.72	(นางสาวณพร ปานเกิด)
	- ติดตั้งกระจกติดตายช่องแสงบนบานเกล็ด ขนาด 0.90x0.40 หน้า 6 มม.	28.000	ตร.ฟ.	24.5936	688.62	34.1577	956.42	1,645.04	พยาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ผนวก.....3.....มีหน้า.....54.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติการกรโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งกระจกบานเกล็ดผ้า หน้า 6 มม.	12.000	แผ่น	40.9893	491.87	-	-	491.87	
	- ติดตั้งชุดบานเกล็ดปรับมุมระบบแบบมือหมุน	1.000	ชุด	956.4160	956.42	13.6631	13.66	970.08	
	- เทคอนกรีต ค.2 240 ksc. (คานเอ็นส่วนที่รีดรอบๆวงกบประตูหน้าต่าง)	1.000	ลบ.ม.	2,492.1469	2,492.15	-	-	2,492.15	
	- งานฉาบเก็บปูนส่วนที่รีดรอบวงกบ ปูนทรายฉาบผิวเรียบ หน้า 1.5 ซม.เพื่อสูญเสียแล้ว	6.000	ตร.ม.	79.2459	475.48	-	-	475.48	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้ง ก๊อกน้ำ 3/4"	1.000	ชุด	211.7778	211.78	-	-	211.78	
	- งานติดตั้งฝักบัวชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	1.000	ชุด	793.8253	793.83	-	-	793.83	
	- งานติดตั้งโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ เซรามิค เคลือบขาว	1.000	ชุด	4,097.5595	4,097.56	614.8389	614.84	4,712.40	
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าเซรามิค พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและชุด ก๊อกอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	2,322.7246	2,322.72	614.8389	614.84	2,937.56	
	- ติดตั้งก๊อกน้ำทองเหลือง 1/2"	1.000	ชุด	163.9570	163.96	-	-	163.96	
	- ติดตั้งตะแกรงน้ำทิ้งพื้นห้องน้ำ	1.000	ชุด	457.7134	457.71	-	-	457.71	
	- ติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด 0.60 ม.	1.000	ชุด	379.8338	379.83	-	-	379.83	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ผนวก.....3.....มีหน้า.....๕๕.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติการการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งที่ใส่สบูเซรามิคเคลือบขาวแบบฝังผนัง	1.000	ชุด	434.1582	434.16	163.9570	163.96	598.12	
	- ติดตั้งที่ใส่ทิชชูสแตนเลสแบบเจาะยึดผนัง	1.000	ชุด	256.8660	256.87	163.9570	163.96	420.82	
	- ติดตั้งกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 8"x8"	3.200	ตร.ม.	270.5291	865.69	215.8768	690.81	1,556.50	
	- ติดตั้งกระเบื้องปูผนังห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 16"x16"	14.000	ตร.ม.	321.0825	4,495.16	215.8768	3,022.27	7,517.43	
	- ติดตั้งผ้าเพดาน T-bar พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	54.000	ตร.ม.	583.4138	31,506.35	(ลงชื่อ).....71.0480.....	3,836.59	ผู้ว่าจ้าง 5,340.94	
	- ติดตั้งผ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	10.000	ตร.ม.	486.4059	4,864.06	(นายระเด่น สะมะแอ) 128.4350	1,284.33	6,148.39	
	- เทพื้น คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	2.220	ลบ.ม.	4,071.5996	9,038.95	(นางสาวกมลกร บริหารการส่วนจังหวัดยะลา) 572.4833	1,270.91	10,309.86	
	- ติดตั้งตะแกรงเหล็ก WIRE MESH เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	22.220	ตร.ม.	47.8208	1,062.58	(นางสาวกมลกร บริหารการส่วนจังหวัดยะลา) 572.4833	1,270.91	1,214.38	
	- ปูนทรายทำพื้นผิวขัดมัน	22.220	ตร.ม.	103.8395	2,307.31	(ลงชื่อ).....	54.6523	1,214.38	
1.3	งานระบบไฟฟ้า	-				(นางสาวกมลกร บริหารการส่วนจังหวัดยะลา) 572.4833	1,270.91	3,521.69	
	- ติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 6 ช่อง (แบบป้องกันไฟดูดและไฟฟ้าลัดวงจร)	1.000	ชุด	3,005.8789	3,005.88	(ลงชื่อ).....	54.6523	1,214.38	
						(นางสาวกมลกร บริหารการส่วนจังหวัดยะลา) 572.4833	1,270.91	3,005.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ผนวก.....3.....มีหน้า.....๕.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติการการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งชุดเซอร์กิต 15A 1.5kA	6.000	ชุด	161.2244	967.35	-	-	967.35	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x2.5 Sq.mm.	600.000	เมตร	17.8713	10,722.79	9.5642	5,738.50	16,461.29	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x1.5 Sq.mm.	540.000	เมตร	11.7229	6,330.38	6.8315	3,689.03	10,019.41	
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 20 mm. สีขาว	100.000	เมตร	18.8414	1,884.14	16.3957	1,639.57	3,523.71	
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟลายลูกฟูก 20 มม. ขนาด 5 เมตร สี	50.000	เมตร	25.4133	1,270.67	7.6240	381.20	1,651.87	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 2 x 4 นิ้ว	11.000	ชุด	31.4251	345.68	3.6890	40.58	386.26	(นายระเด่น สะมะแอ)
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	58.7513	58.75	42.7067	12.71	71.46	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
	- ติดตั้งบล็อกลอยไฟฟ้า ขนาด 2 x 4 นิ้ว	13.000	ชุด	12.2968	159.86	3.6890	40.58	207.82	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	- ติดตั้งบล็อกลอยไฟฟ้า ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	24.5936	24.59	5.3286	5.33	29.92	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 3 ช่อง	13.000	ชุด	38.2566	497.34	(นายวิระ พรหมจินดา)		497.34	
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 5 ช่อง	1.000	ชุด	62.8502	62.85	-		62.85	
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 1 ช่อง	1.000	ชุด	30.0588	30.06	(ลงชื่อ).....พยาน		30.06	
	- ติดตั้งเต้ารับกราวด์คู่ 16A, 250V	9.000	ชุด	222.7083	2,004.37	(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)		2,213.42	
	- ติดตั้งสวิทช์ทางเดียว ขนาด1ช่อง	9.000	ชุด	28.6925	258.23	(ลงชื่อ).....พยาน		368.90	
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 18W แสง Cool Daylight	8.000	ชุด	393.4969	3,147.98	(นางสาวชนพร ปานเกิด)		4,350.33	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ผนวก.....2.....มีหน้า.....๕7.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 9W แสง Cool Daylight	1.000	ชุด	215.8768	215.88	150.2939	150.29	366.17	
	- ติดตั้งแผ่น PVC ขนาดขนาด 10x12 นิ้ว	1.000	ชุด	91.5427	91.54	-	-	91.54	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x16 Sq.mm.	30.000	เมตร	112.4199	3,372.60	27.3262	819.79	4,192.38	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x10 Sq.mm.	15.000	เมตร	72.4144	1,086.22	21.8609	327.91	1,414.13	
	- ติดตั้งแท่งกรวดโหลตบของแดง ขนาด 1.8 เมตร	1.000	ชุด	202.2137	202.21	(นางวิระเด่น สะมะแอ)		202.21	
	- ติดตั้งยูแคลมป์ทองเหลือง สำหรับล๊อคแท่งกรวด ขนาด 50-70 มม.	1.000	ชุด	86.0774	86.08	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน		86.08	
	- วัสดุสิ้นเปลือง	1.000	งาน	5,020.0364	5,020.04	(นางวิระเด่น สะมะแอ)		5,020.04	
	รวมค่าซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/17				179,380.11	(นางวิระเด่น สะมะแอ)	44,343.11	223,723.22	

ลงชื่อ



(นายวิระ พรหมจินดา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตตาการโยธา

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ผนวก.....3.....มีหน้า.....58.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิธิตการกรโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/18		รวม		179,380.11		44,343.11	223,723.22	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							223,723.22	
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/18								
1.1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน T-bar (รื้อชนทั้ง)	54.000	ตร.ม.	-	-	34.1577	1,844.52	1,844.52	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น (รื้อชนทั้ง)	3.000	ตร.ม.	-	(ลงชื่อ).....54.6523	163.96	ผู้ว่าจ้าง	163.96	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดียว)	4.000	ชุด	-	-	(นายระเด่น สะมะแอ) 109.3047	437.22	437.22	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างวงกบไม้ พร้อมเหล็กดัด	3.000	ชุด	-	-	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	163.96	163.96	
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงคร่าวไม้ (ฝ้าหลังบ้าน) (รื้อชนทั้ง)	3.400	ตร.ม.	-	(ลงชื่อ).....40.9893	139.36	ผู้ว่าจ้าง	139.36	
	- งานรื้อพื้นอาคาร คสล.วางบนดิน หน้า 10 ซม. (รื้อชนทั้ง)	20.700	ตร.ม.	-	-	(นายวิระ พรหมจินดา) 95.6416	1,979.78	1,979.78	
	- รื้อถอนมุ้งลวด (ช่องระบายอากาศห้องนอน 6.5 ตร.ม.)	1.000	งาน	-	(ลงชื่อ).....136.6309	136.63	นางสาวกฤษิรินทร์ ทองเทศ	136.63	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	- ทาสีรองพื้นปูนเก่า	204.000	ตร.ม.	40.9893	8,361.81	(นางสาวธนพร ปานเกิด)	8,361.81	8,361.81	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายนอก	8.000	ตร.ม.	54.6523	437.22	46.4545	371.64	808.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ผนวก.....3.....มีหน้า.....54.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติการการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายใน	196.000	ตร.ม.	47.8208	9,372.88	40.9893	8,033.89	17,406.77	
	- ทาสีน้ำมัน	20.000	ตร.ม.	51.9197	1,038.39	51.9197	1,038.39	2,076.79	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D1 พร้อมลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หน้าบ้าน	2.000	ชุด	5,465.2344	10,930.47	136.6309	273.26	11,203.73	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D2 พร้อมวงกบ UPVC และลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.000	ชุด	5,738.4961	11,476.99	(ลงชื่อ)..... 136.6309 (นายระเด่น สะมะแอ)	273.26	11,750.25	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้งวงกบประตูไม้เนื้อแข็ง บานประตู D1 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	2.000	ชุด	4,372.1875	8,744.38	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		9,017.64	
	- ติดตั้งบานประตูอะลูมิเนียม D3 พร้อมวงกบและอุปกรณ์ปิดล็อก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	ชุด	3,415.7715	3,415.77	(ลงชื่อ)..... 136.6309 (นายวีระ พรหมจินดา)	136.63	3,552.40	ผู้รับจ้าง
	- ติดตั้งหน้าต่างบาน SLIDE อะลูมิเนียมขอบขาว (หน้าบ้าน) W1	1.000	ชุด	11,750.2539	11,750.25	(ลงชื่อ)..... 136.6309 (นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)	136.63	11,886.88	พยาน
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W2 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	1.000	ชุด	2,459.3555	2,459.36	(ลงชื่อ)..... 136.6309 (นางสาวณพร ปานเกิด)	136.63	2,595.99	พยาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ผนวก.....3.....มีหน้า.....๒๐.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิธิตการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W3 บานเกร็ดซ้อนคู่ติดตายพร้อมกระจกฝ้า หนา 6 มม.	1.000	ชุด	2,186.0938	2,186.09	136.6309	136.63	2,322.72	
	- ติดตั้งกระจกติดตายช่องแสงบนบานเกล็ด ขนาด 0.90x0.40 หนา 6 มม.	28.000	ตร.ฟ.	24.5936	688.62	34.1577	956.42	1,645.04	
	- ติดตั้งกระจกบานเกล็ดฝ้า หนา 6 มม.	12.000	แผ่น	40.9893	491.87	(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง	491.87	
	- ติดตั้งชุดบานเกล็ดปรับมุมระบบแบบมือหมุน	1.000	ชุด	956.4160	956.42	(นายระเด่น สะมะแอ)	13.6631	13.66	970.08
	- เทคอนกรีต ค.2 240 ksc. (คานเอ็นส่วนที่รื้อถอนรอบวงกบประตูหน้าต่าง)	1.000	ลบ.ม.	2,492.1469	2,492.15	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	2,492.15	
	- ฉาบเก็บปูนส่วนที่รื้อถอนวงกบ ปูนทรายฉาบผิวเรียบ หนา 1.5 ซม.เพื่อสูญเสียแล้ว	6.000	ตร.ม.	79.2459	475.48	(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง	475.48	
	- ติดตั้ง ก๊อกล้ำ 3/4"	1.000	ชุด	211.7778	211.78	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	34.1577	34.16	245.94
	- ติดตั้งฝักบัวชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	1.000	ชุด	793.8253	793.83	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	95.6416	95.64	889.47
	- ติดตั้งโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ เซรามิคเคลือบขาว	1.000	ชุด	4,097.5595	4,097.56	(นางสาวธนพร ปานเกิด)	614.8389	614.84	4,712.40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ผนวก.....3.....มีหน้า.....๒.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธิตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าเซรามิค พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและชุดก๊อกอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	2,322.7246	2,322.72	614.8389	614.84	2,937.56	
	- ติดตั้งก๊อกน้ำทองเหลือง 1/2"	1.000	ชุด	163.9570	163.96	34.1577	34.16	198.11	
	- ติดตั้งตะแกรงน้ำทิ้งพื้นห้องน้ำ	1.000	ชุด	457.7134	457.71	34.1577	34.16	491.87	
	- ติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด 0.60 ม.	1.000	ชุด	379.8338	379.83	95.6416	95.64	475.48	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้งที่ใส่สบู่เซรามิคเคลือบขาวแบบฝักผนัง	1.000	ชุด	434.1582	434.16	163.9570	163.96	598.12	
	- ติดตั้งที่ใส่ทิชชูสแตนเลสแบบเจาะยึดผนัง	1.000	ชุด	256.8660	256.87	163.9570	163.96	420.82	
	- ติดตั้งกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 8"x8"	3.200	ตร.ม.	270.5291	865.69	215.8768	690.84	1,556.50	
	- ติดตั้งกระเบื้องปูผนังห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 16"x16"	14.000	ตร.ม.	321.0825	4,495.16	215.8768	3,022.27	7,517.43	
	- ติดตั้งผ้าเพดาน T-bar พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	54.000	ตร.ม.	583.4138	31,504.34	71.0480	3,856.59	35,340.94	
	- ติดตั้งผ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	10.000	ตร.ม.	486.4059	4,864.06	128.4330	1,284.33	6,148.39	
	- เทพื้น คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	2.220	ลบ.ม.	4,071.5996	9,038.95	572.4833	1,270.91	10,309.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ผนวก.....3 มีหน้า.....12 ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุติดาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งตะแกรงเหล็ก WIRE MESH เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	22.220	ตร.ม.	47.8208	1,062.58	6.8315	151.80	1,214.38	
	- ปูนทรายทำพื้นผิวขัดมัน	22.220	ตร.ม.	103.8395	2,307.31	54.6523	1,214.38	3,521.69	
1.3	งานระบบไฟฟ้า								
	- ติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 6 ช่อง (แบบป้องกันไฟดูดและไฟฟ้าลัดวงจร)	1.000	ชุด	3,005.8789	3,005.88	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง		3,005.88	
	- ติดตั้งชุดเซอร์กิต 15A 1.5kA	6.000	ชุด	161.2244	967.35	(นายระเด่น สะมะแอ)		967.35	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x2.5 Sq.mm.	600.000	เมตร	17.8713	10,722.79	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	9.5642	5,738.50	16,461.29
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x1.5 Sq.mm.	540.000	เมตร	11.7229	6,336.56	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง	6.8315	3,689.03	10,019.41
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 20 mm. สีขาว	100.000	เมตร	18.8414	1,884.14	(นายวิระ พรหมจินดา)	16.3957	1,639.57	3,523.71
	- ติดตั้งท่ออ่อนสายไฟลายลูกฟูก 20 มม. ขนาด 5 เมตร สีขาว	50.000	เมตร	25.4133	1,270.67	(ลงชื่อ).....นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ	7.6240	381.20	1,651.87
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 2 x 4 นิ้ว	11.000	ชุด	31.4251	345.68	(ลงชื่อ).....พยาน	3.6890	40.58	386.26
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	58.7513	58.75	(นางสาวธนพร ปานเกิด)	12.7067	73.71	71.46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....
ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17,
ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ผนวก.....3.....มีหน้า.....32.....ถึง.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติดาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งปลั๊กลอยไฟฟ้า ขนาด 2 x 4 นิ้ว	13.000	ชุด	12.2968	159.86	3.6890	47.96	207.82	
	- ติดตั้งปลั๊กลอยไฟฟ้า ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	24.5936	24.59	5.3286	5.33	29.92	
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อคลอยไฟฟ้า 3 ช่อง	13.000	ชุด	38.2566	497.34	-	-	497.34	
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อคลอยไฟฟ้า 5 ช่อง	1.000	ชุด	62.8502	62.85	-	-	62.85	
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อคลอยไฟฟ้า 1 ช่อง	1.000	ชุด	30.0588	(ลงชื่อ).....	30.06	ผู้ว่าจ้าง	30.06	
	- ติดตั้งเต้ารับกราวด์คู่ 16A, 250V	9.000	ชุด	222.7083	2,004.37	(นายระเด่น สะมะแอ)	23.2272	209.05	2,213.42
	- ติดตั้งสวิตช์ทางเดียว ขนาด1ช่อง	9.000	ชุด	28.6925	258.23	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	12.2968	110.67	368.90
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 18W แสง Cool Daylight	8.000	ชุด	393.4969	3,147.98	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	150.2939	1,202.35	4,350.33
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 9W แสง Cool Daylight	1.000	ชุด	215.8768	215.88	(ลงชื่อ).....	150.2939	150.29	366.17
	- ติดตั้งแผ่น PVC ขนาดขนาด 10x12 นิ้ว	1.000	ชุด	91.5427	91.54	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	-	-	91.54
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x16 Sq.mm.	30.000	เมตร	112.4199	3,372.60	(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	27.3262	819.79	4,192.38
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x10 Sq.mm.	15.000	เมตร	72.4144	1,086.22	(ลงชื่อ).....	21.8609	327.91	1,414.13
	- ติดตั้งแท่งกราวด์ไหลดูดทองแดง ขนาด 1.8 เมตร	1.000	ชุด	202.2137	202.21	(นางสาวธนพร ปานเกิด)	-	-	202.21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ผนวก.....3 มีหน้า.....๒๔ ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งตู้แคลมป์ทองเหลือง สำหรับล๊อคแท่งกราวด์ ขนาด 50-70 มม.	1.000	ชุด	86.0774	86.08	-	-	86.08	
	- วัสดุสิ้นเปลือง	1.000	งาน	5,020.0364	5,020.04	-	-	5,020.04	
	รวมค่าซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/18				179,380.11		44,343.11	223,723.22	

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นายวิระ พรหมจินดา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจโยธา



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ผนวก.....๓.....มีหน้า.....๒๕.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติการการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/19		รวม		202.21		-	202.21	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							202.21	
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/19								
1.1	งานรื้อถอน	-							
	- รื้อถอนผ้าเพดาน T-bar (รื้อชนทั้ง)	54.000	ตร.ม.	-	-	34.1577	1,844.52	1,844.52	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น (รื้อชนทั้ง)	3.000	ตร.ม.	-	(ลงชื่อ).....54.6523.....	163.96	ผู้ว่าจ้าง	163.96	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดียว)	4.000	ชุด	-	-	109.3047	437.22	437.22	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างวงกบไม้ พร้อมเหล็กตัด	3.000	ชุด	-	-	54.6523	163.96	163.96	
	- รื้อถอนผ้าเพดาน พร้อมโครงคร่าวไม้ (ผ้าหลังบ้าน) (รื้อชนทั้ง)	3.400	ตร.ม.	-	-	40.9893	139.36	139.36	
	- งานรื้อพื้นอาคาร คสล.วางบนดิน หนา 10 ซม. (รื้อชนทั้ง)	20.700	ตร.ม.	-	-	95.6416	1,979.78	1,979.78	
	- รื้อถอนมุ้งลวด (ช่องระบายอากาศห้องนอน 6.5 ตร.ม.)	1.000	งาน	-	-	136.6309	136.63	136.63	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	-							
	- ทาสีรองพื้นปูนเก่า	204.000	ตร.ม.	40.9893	8,361.81	-	-	8,361.81	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายนอก	8.000	ตร.ม.	54.6523	437.22	46.4545	371.64	808.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....
ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17,
ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ผนวก.....3.....มีหน้า.....๒๒.....ถึง.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติการการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายใน	196.000	ตร.ม.	47.8208	9,372.88	40.9893	8,033.89	17,406.77	
	- ทาสีน้ำมัน	20.000	ตร.ม.	51.9197	1,038.39	51.9197	1,038.39	2,076.79	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D1 พร้อมลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หน้าบ้าน	2.000	ชุด	5,465.2344	10,930.47	136.6309	273.26	11,203.73	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D2 พร้อมวงกบ UPVC และลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.000	ชุด	5,738.4961	11,476.99	136.6309	273.26	11,750.25	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้งวงกบประตูไม้เนื้อแข็ง บานประตู D1 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	2.000	ชุด	4,372.1875	8,744.38	136.6309	273.26	9,017.64	(นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
	- ติดตั้งบานประตูอะลูมิเนียม D3 พร้อมวงกบและอุปกรณ์ปิดล็อก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	ชุด	3,415.7715	3,415.77	136.6309	136.63	3,552.40	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
	- ติดตั้งหน้าต่างบาน SLIDE อะลูมิเนียมขอบขาว (หน้าบ้าน) W1	1.000	ชุด	11,750.2539	11,750.25	136.6309	136.63	11,886.88	(นางสาวประพร หงษ์จินดา) (ลงชื่อ).....พยาน
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W2 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	1.000	ชุด	2,459.3555	2,459.36	136.6309	136.63	2,595.99	(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) (ลงชื่อ).....
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W3 บานเกร็ดซ้อนคู่ติดตายพร้อมกระจกฝ้า หนา 6 มม.	1.000	ชุด	2,186.0938	2,186.09	136.6309	136.63	2,322.72	(นางสาวธนพร ปานเกิด) (ลงชื่อ).....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....
ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17,
ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ผนวก.....๖.....มีหน้า.....๗.....ถึง.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งกระจกติดตายช่องแสงบนบานเกล็ด ขนาด 0.90x0.40 หนา 6 มม.	28.000	ตร.ฟ.	24.5936	688.62	34.1577	956.42	1,645.04	
	- ติดตั้งกระจกบานเกล็ดผ้า หนา 6 มม.	12.000	แผ่น	40.9893	491.87	-	-	491.87	
	- ติดตั้งชุดบานเกล็ดปรับมุมระบบแบบมือหมุน	1.000	ชุด	956.4160	956.42	13.6631	13.66	970.08	
	- เทคอนกรีต ค.2 240 ksc. (คานเอ็นส่วนที่ร้อยถอนรอบวงกบประตูหน้าต่าง)	1.000	ลบ.ม.	2,492.1469	2,492.15	(นายระเด่น สะมะแอ)		2,492.15	
	- ฉาบเก็บปูนส่วนที่ร้อยถอนวงกบ ปูนทรายฉาบผิวเรียบ หนา 1.5 ซม.เมื่อสูญเสียแล้ว	6.000	ตร.ม.	79.2459	475.48	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง		475.48	
	- ติดตั้ง ก๊อกรน้ำ 3/4"	1.000	ชุด	211.7778	211.78	(นายวิระ พรหมจินต)	34.16	245.94	
	- ติดตั้งฝักบัวชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	1.000	ชุด	793.8253	793.83	(ลงชื่อ).....พยาน	95.64	889.47	
	- ติดตั้งโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ เซรามิคเคลือบขาว	1.000	ชุด	4,097.5595	4,097.56	(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)	614.84	4,712.40	
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าเซรามิค พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและชุด ก๊อกอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	2,322.7246	2,322.72	(นางสาวธนพร ปานเกิด)	614.84	2,937.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....
 ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17,
 ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ผนวก.....3.....มีหน้า.....๙.....ถึง.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติการการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งก๊อกรน้ำทองเหลือง 1/2"	1.000	ชุด	163.9570	163.96	34.1577	34.16	198.11	
	- ติดตั้งตะแกรงน้ำทิ้งพื้นห้องน้ำ	1.000	ชุด	457.7134	457.71	34.1577	34.16	491.87	
	- ติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด 0.60 ม.	1.000	ชุด	379.8338	379.83	95.6416	95.64	475.48	
	- ติดตั้งที่ใส่สบูเซรามิคเคลือบขาวแบบฝังผนัง	1.000	ชุด	434.1582	434.16	163.9570	163.96	598.12	
	- ติดตั้งที่ใส่ทิชชูสแตนเลสแบบเจาะยึดผนัง	1.000	ชุด	256.8660	256.87	163.9570	163.96	420.82	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้งกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 8"x8"	3.200	ตร.ม.	270.5291	865.69	215.8768	690.81	1,556.50	
	- ติดตั้งกระเบื้องปูผนังห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 16"x16"	14.000	ตร.ม.	321.0825	4,495.16	215.8768	3,022.27	7,517.43	
	- ติดตั้งผ้าเพดาน T-bar พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	54.000	ตร.ม.	583.4138	31,504.34	71.0480	3,836.59	35,340.94	
	- ติดตั้งผ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	10.000	ตร.ม.	486.4059	4,864.06	128.4330	1,284.33	6,148.39	
	- เทพื้น คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	2.220	ลบ.ม.	4,071.5996	9,038.93	572.4835	1,270.91	10,309.86	
	- ติดตั้งตะแกรงเหล็ก WIRE MESH เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	22.220	ตร.ม.	47.8208	1,062.58	6.8315	151.80	1,214.38	
	- ปูนทรายทำพื้นผิวขัดมัน	22.220	ตร.ม.	103.8395	2,307.31	54.6523	1,214.38	3,521.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....
 ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17,
 ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ผนวก.....3.....มีหน้า.....๕.....ถึง.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1.3	งานระบบไฟฟ้า	-							
	- ติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง (แบบป้องกันไฟดูดและไฟฟ้าลัดวงจร)	1.000	ชุด	3,005.8789	3,005.88	-	-	3,005.88	
	- ติดตั้งชุดเซอร์กิต 15A 1.5kA	6.000	ชุด	161.2244	967.35	-	-	967.35	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x2.5 Sq.mm.	600.000	เมตร	17.8713	10,722.79	9.5642	5,738.50	16,461.29	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x1.5 Sq.mm.	540.000	เมตร	11.7229	6,330.38	6.8315	3,689.03	10,019.41	(นายระเด่น สะมะแอ)
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 20 mm. สีขาว	100.000	เมตร	18.8414	1,884.14	16.3957	1,639.57	3,523.71	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟลายลูกฟูก 20 มม. ขนาด 5 เมตร สีขาว	50.000	เมตร	25.4133	1,270.67	7.6240	581.20	1,651.87	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 2 x 4 นิ้ว	11.000	ชุด	31.4251	345.68	3.6890	40.58	386.26	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	58.7513	58.75	12.7067	13.71	71.46	(นางอริส พรหมจินดา)
	- ติดตั้งบล็อกลอยไฟฟ้า ขนาด 2 x 4 นิ้ว	13.000	ชุด	12.2968	159.86	3.6890	47.96	207.82	ไฟฟ้า
	- ติดตั้งบล็อกลอยไฟฟ้า ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	24.5936	24.59	(ลงชื่อ).....	5.33	29.92	พยาน
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 3 ช่อง	13.000	ชุด	38.2566	497.34	(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)		497.34	
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 5 ช่อง	1.000	ชุด	62.8502	62.85	-	-	62.85	
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 1 ช่อง	1.000	ชุด	30.0588	30.06	(ลงชื่อ).....	-	30.06	พยาน
						(นางสาวสนพร ปานเกิด)			

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....
 ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17,
 ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ผนวก...3...มีหน้า...70...ถึง.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งเต้ารับกราวด์คู่ 16A, 250V	9.000	ชุด	222.7083	2,004.37	23.2272	209.05	2,213.42	
	- ติดตั้งสวิตช์ทางเดียว ขนาด1ช่อง	9.000	ชุด	28.6925	258.23	12.2968	110.67	368.90	
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 18W แสง Cool Daylight	8.000	ชุด	393.4969	3,147.98	150.2939	1,202.35	4,350.33	
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 9W แสง Cool Daylight	1.000	ชุด	215.8768	215.88	150.2939	150.29	366.17	
	- ติดตั้งแผ่น PVC ขนาดขนาด 10x12 นิ้ว	1.000	ชุด	91.5427	91.54	-	-	91.54	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x16 Sq.mm.	30.000	เมตร	112.4199	3,372.60	27.3262	819.79	4,192.38	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x10 Sq.mm.	15.000	เมตร	72.4144	1,086.22	21.8608	327.91	1,414.13	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
	- ติดตั้งแท่งกราวด์โหลตูปทองแดง ขนาด 1.8 เมตร	1.000	ชุด	202.2137	202.21	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		202.21	
	- ติดตั้งยูแคลมป์ทองเหลือง สำหรับล๊อคแท่งกราวด์ ขนาด 50-70 มม.	1.000	ชุด	86.0774	86.08	-	-	86.08	
	- วัสดุสิ้นเปลือง	1.000	งาน	5,020.0364	5,020.04	-	-	5,020.04	
	รวมค่าซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/19				179,386.11	(ลงชื่อ).....	44,343.11	223,723.22	
						(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)			

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นายวิระ พรหมจินดา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการการโยธา

(ลงชื่อ).....นาย

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ผนวก.....3.....มีหน้า.....21.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุตากรการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/20		รวม		5,020.04		-	5,020.04	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							5,020.04	
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/20								
1.1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนผ้าเพดาน T-bar (รื้อชนทั้ง)	54.000	ตร.ม.	-	-	34.1577	1,844.52	1,844.52	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น (รื้อชนทั้ง)	3.000	ตร.ม.	-	(ลงชื่อ).....	54.6523	163.96	ผู้ว่าจ้าง 163.96	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดียว)	4.000	ชุด	-	-	109.5047	437.22	437.22	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างวงกบไม้ พร้อมเหล็กดัด	3.000	ชุด	-	-	54.6523	163.96	163.96	
	- รื้อถอนผ้าเพดาน พร้อมโครงคร่าวไม้ (ผ้าหลังบ้าน) (รื้อชนทั้ง)	3.400	ตร.ม.	-	-	40.9893	139.36	139.36	
	- งานรื้อพื้นอาคาร คสล.วางบนดิน หนา 10 ซม. (รื้อชนทั้ง)	20.700	ตร.ม.	-	-	95.6416	1,979.78	1,979.78	
	- รื้อถอนมุ้งลวด (ช่องระบายอากาศห้องนอน 6.5 ตร.ม.)	1.000	งาน	-	(ลงชื่อ).....	136.6309	136.63	พยาน 136.63	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	-				(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)			
	- ทาสีรองพื้นปูนเก่า	204.000	ตร.ม.	40.9893	8,361.81	(ลงชื่อ).....	-	พยาน 8,361.81	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายนอก	8.000	ตร.ม.	54.6523	437.22	46.4545	371.64	808.85	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายใน	196.000	ตร.ม.	47.8208	9,372.88	40.9893	8,033.89	17,406.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....
 ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17,
 ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ผนวก.....3.....มีหน้า.....72.....ถึง.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ทาสีน้ำมัน	20.000	ตร.ม.	51.9197	1,038.39	51.9197	1,038.39	2,076.79	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D1 พร้อมลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หน้าบ้าน	2.000	ชุด	5,465.2344	10,930.47	136.6309	273.26	11,203.73	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D2 พร้อมวงกบ UPVC และลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.000	ชุด	5,738.4961	11,476.99	136.6309	273.26	11,750.25	
	- ติดตั้งวงกบประตูไม้เนื้อแข็ง บานประตู D1 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	2.000	ชุด	4,372.1875	8,744.38	(ลงชื่อ)..... 136.6309 (นายระเด่น สะมะแอ)	273.26	9,017.64	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้งบานประตูอะลูมิเนียม D3 พร้อมวงกบและอุปกรณ์ปิดล็อก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	ชุด	3,415.7715	3,415.77	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 136.6309	136.63	3,552.40	
	- ติดตั้งหน้าต่างบาน SLIDE อลูมิเนียมขอบขาว (หน้าบ้าน) W1	1.000	ชุด	11,750.2539	11,750.25	(ลงชื่อ)..... 136.6309 (นายวิรัช พรหมจินดา)	136.63	11,886.88	ผู้รับจ้าง
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W2 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	1.000	ชุด	2,459.3555	2,459.36	136.6309	136.63	2,595.99	
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W3 บานเกร็ดซ้อนคู่ติดตายพร้อมกระจกฝ้า หนา 6 มม.	1.000	ชุด	2,186.0938	2,186.09	(ลงชื่อ)..... 136.6309 (นางสาวกมลกรินทร์ ทองเกิด)	136.63	2,322.72	พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....
 ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17,
 ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....
 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งกระจกติดตายช่องแสงบนบานเกล็ด ขนาด 0.90x0.40 หนา 6 มม.	28.000	ตร.ฟ.	24.5936	688.62	34.1577	956.42	1,645.04	
	- ติดตั้งกระจกบานเกล็ดผ้า หนา 6 มม.	12.000	แผ่น	40.9893	491.87	-	-	491.87	
	- ติดตั้งชุดบานเกล็ดปรับมุมระบบแบบมือหมุน	1.000	ชุด	956.4160	956.42	13.6631	13.66	970.08	
	- เทคอนกรีต ค.2 240 ksc. (คานเอ็นส่วนที่ร้อยถนนรอบๆวงกบประตูหน้าต่าง)	1.000	ลบ.ม.	2,492.1469	2,492.15	(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง	(นายระเด่น สะมะแอ)	2,492.15	
	- ฉาบเก็บปูนส่วนที่ร้อยถนนวงกบ ปูนทรายฉาบผิวเรียบ หนา 1.5 ซม.เพื่อสูญเสียแล้ว	6.000	ตร.ม.	79.2459	475.48	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	475.48	
	- ติดตั้ง ก๊อกล้ำ 3/4"	1.000	ชุด	211.7778	211.78	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง	34.16	245.94	
	- ติดตั้งฝักบัวชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	1.000	ชุด	793.8253	793.83	956.42	956.42	889.47	
	- ติดตั้งโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ เซรามิคเคลือบขาว	1.000	ชุด	4,097.5595	4,097.56	(ลงชื่อ).....พยาน	614.84	4,712.40	
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าเซรามิค พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและชุดก๊อกอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	2,322.7246	2,322.72	(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)	614.84	2,937.56	
	- ติดตั้งก๊อกล้ำทองเหลือง 1/2"	1.000	ชุด	163.9570	163.96	(ลงชื่อ).....พยาน	34.16	198.11	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....
ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17,
ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ผนวก.....3 มีหน้า.....74 ถึง.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุติการการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งตะแกรงน้ำทิ้งพื้นห้องน้ำ	1.000	ชุด	457.7134	457.71	34.1577	34.16	491.87	
	- ติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด 0.60 ม.	1.000	ชุด	379.8338	379.83	95.6416	95.64	475.48	
	- ติดตั้งที่ใส่สบู่เซรามิคเคลือบขาวแบบฝังผนัง	1.000	ชุด	434.1582	434.16	163.9570	163.96	598.12	
	- ติดตั้งที่ใส่ทิชชูสแตนเลสแบบเจาะยึดผนัง	1.000	ชุด	256.8660	256.87	163.9570	163.96	420.82	
	- ติดตั้งกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 8"x8"	3.200	ตร.ม.	270.5291	865.69	215.8768	690.81	1,556.50	
	- ติดตั้งกระเบื้องปูผนังห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 16"x16"	14.000	ตร.ม.	321.0825	4,495.16	215.8768	3,022.27	7,517.43	
	- ติดตั้งฝ้าเพดาน T-bar พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	54.000	ตร.ม.	583.4138	31,504.34	71.0480	3,836.59	35,340.94	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	10.000	ตร.ม.	486.4059	4,864.06	128.4330	1,284.33	6,148.39	
	- เทพื้น คอนกรีต คอนกรีตผสมเสิร์จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	2.220	ลบ.ม.	4,071.5996	9,038.95	572.4835	1,270.91	10,309.86	
	- ติดตั้งตะแกรงเหล็ก WIRE MESH เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	22.220	ตร.ม.	47.8208	1,062.58	6.8315	151.80	1,214.38	
	- ปูนทรายทำพื้นผิวขัดมัน	22.220	ตร.ม.	103.8395	2,307.31	54.6523	1,214.38	3,521.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....
 ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17,
 ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ผนวก.....๑.....มีหน้า.....๗๕.....ถึง.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุติการการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1.3	งานระบบไฟฟ้า	-							
	- ติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 6 ช่อง (แบบป้องกันไฟดูดและไฟฟ้าลัดวงจร)	1.000	ชุด	3,005.8789	3,005.88	-	-	3,005.88	
	- ติดตั้งชุดเซอร์กิต 15A 1.5kA	6.000	ชุด	161.2244	967.35	-	-	967.35	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x2.5 Sq.mm.	600.000	เมตร	17.8713	10,722.79	9.5642	5,738.50	16,461.29	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x1.5 Sq.mm.	540.000	เมตร	11.7229	6,330.38	6.8315	3,689.03	10,019.41	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 20 mm. สีขาว	100.000	เมตร	18.8414	1,884.14	16.3957	1,639.57	3,523.71	(นายระเด่น สะมะแอ)
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟลายลูกฟูก 20 มม. ขนาด 5 เมตร สี	50.000	เมตร	25.4133	1,270.67	7.6240	381.20	1,651.87	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 2 x 4 นิ้ว	11.000	ชุด	31.4251	345.68	3.6890	40.58	386.26	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	58.7513	58.75	12.7067	12.71	71.46	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
	- ติดตั้งบล็อกลอยไฟฟ้า ขนาด 2 x 4 นิ้ว	13.000	ชุด	12.2968	159.86	3.6890	47.96	207.82	(นายวิระ พรหมจินดา)
	- ติดตั้งบล็อกลอยไฟฟ้า ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	24.5936	24.59	5.3286	5.33	29.92	(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 3 ช่อง	13.000	ชุด	38.2566	497.34	-	-	497.34	51mm
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 5 ช่อง	1.000	ชุด	62.8502	62.85	(ลงชื่อ).....	-	62.85	พยาน
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 1 ช่อง	1.000	ชุด	30.0588	30.06	(นางสาวธนพร ปานเกิด)	-	30.06	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....
 ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17,
 ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ผนวก.....3.....มีหน้า.....76.....ถึง.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุตากรการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งเต้ารับกราวด์คู่ 16A, 250V	9.000	ชุด	222.7083	2,004.37	23.2272	209.05	2,213.42	
	- ติดตั้งสวิตช์ทางเดียว ขนาด1ช่อง	9.000	ชุด	28.6925	258.23	12.2968	110.67	368.90	
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 18W แสง Cool Daylight	8.000	ชุด	393.4969	3,147.98	150.2939	1,202.35	4,350.33	
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 9W แสง Cool Daylight	1.000	ชุด	215.8768	215.88	150.2939	150.29	366.17	
	- ติดตั้งแผ่น PVC ขนาดขนาด 10x12 นิ้ว	1.000	ชุด	91.5427	(ลงชื่อ).....			ผู้ว่าจ้าง 91.54	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x16 Sq.mm.	30.000	เมตร	112.4199	3,372.60	21.8609	475.83	4,192.38	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x10 Sq.mm.	15.000	เมตร	72.4144	1,086.22	21.8609	327.91	1,414.13	
	- ติดตั้งแท่งกราวด์โหลตรูปทองแดง ขนาด 1.8 เมตร	1.000	ชุด	202.2137	202.21			202.21	
	- ติดตั้งยูแคลมป์ทองเหลือง สำหรับล๊อคแท่งกราวด์ ขนาด 50-70 มม.	1.000	ชุด	86.0774	86.08	(ลงชื่อ).....		86.08	
	- วัสดุสิ้นเปลือง	1.000	งาน	5,020.0364	5,020.04			5,020.04	
	รวมค่าซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/20				179,380.11	(นางสาวกิริรินทร์ ทองเกิด)	44,343.41	223,723.22	

ลงชื่อผู้แทนราคา

(นายวิระ พรหมจินดา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุตากรการโยธา

(ลงชื่อ).....อปป.....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....
 ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17,
 ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....
 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

ผนวก.....3.....มีหน้า.....27.....ถึง.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุตากรการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/21		รวม		189,594.64		46,982.82	236,577.45	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							236,577.45	
1	ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/21								
1.1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนผ้าเพดาน T-bar (รื้อชนทั้ง)	54.000	ตร.ม.	-	-	34.1577	1,844.52	1,844.52	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น (รื้อชนทั้ง)	3.000	ตร.ม.	-	(ลงชื่อ).....	54.6523	163.96	ผู้ว่าจ้าง 163.96	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดียว)	4.000	ชุด	-	-	(นายระเด่น สะมะแอ) 109.3047	437.22	437.22	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างวงกบไม้ พร้อมเหล็กตัด	3.000	ชุด	-	-	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน 54.6523	163.96	163.96	
	- รื้อถอนผ้าเพดาน พร้อมโครงคร่าวไม้ (ผ้าหลังบ้าน) (รื้อ)	3.400	ตร.ม.	-	-	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 40.9893	139.36	139.36	
	- งานรื้อพื้นอาคาร คสล.วางบนดิน หนา 10 ซม. (รื้อชนทั้ง)	20.700	ตร.ม.	-	-	(ลงชื่อ)..... 95.6416	1,979.78	1,979.78	
	- รื้อถอนมุ้งลวด (ช่องระบายอากาศห้องนอน 6.5 ตร.ม.)	1.000	งาน	-	-	(นายวีระ พรหมจินดา) 136.6309	136.63	136.63	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	-				(ลงชื่อ).....			
	- ทาสีรองพื้นปูนเก่า	204.000	ตร.ม.	40.9893	8,361.81	(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) -	-	8,361.81	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายนอก	8.000	ตร.ม.	54.6523	437.22	(ลงชื่อ)..... 46.4545	371.64	808.85	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคผนังภายใน	196.000	ตร.ม.	47.8208	9,372.88	(นางสาวธนพร ปานเกิด) 40.9893	8,033.89	17,406.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ผนวก.....3 มีหน้า.....98.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการกรโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ทาสีน้ำมัน	20.000	ตร.ม.	51.9197	1,038.39	51.9197	1,038.39	2,076.79	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D1 พร้อมลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หน้าบ้าน	2.000	ชุด	5,465.2344	10,930.47	136.6309	273.26	11,203.73	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC D2 พร้อมวงกบ UPVC และลูกบิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.000	ชุด	5,738.4961	11,476.99	136.6309	273.26	11,750.25	
	- ติดตั้งวงกบประตูไม้เนื้อแข็ง บานประตู D1 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	2.000	ชุด	4,372.1875	8,744.38	136.6309	273.26	9,017.64	
	- ติดตั้งบานประตูอะลูมิเนียม D3 พร้อมวงกบและอุปกรณ์ปิดล็อก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	ชุด	3,415.7715	3,415.77	136.6309	136.63	3,552.40	
	- ติดตั้งหน้าต่างบาน SLIDE อะลูมิเนียมขอบขาว (หน้าบ้าน) W1	1.000	ชุด	11,750.2539	11,750.25	136.6309	136.63	11,886.88	
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W2 พร้อมช่องแสงบนติดตาย	1.000	ชุด	2,459.3555	2,459.36	136.6309	136.63	2,595.99	
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็งหน้าต่าง W3 บานเกร็ดซ้อนคู่ติดตายพร้อมกระจกฝ้า หนา 6 มม.	1.000	ชุด	2,186.0938	2,186.09	136.6309	136.63	2,322.72	

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ผนวก.....๒.....มีหน้า.....๗๑.....ถึง.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการกรโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งกระจกติดตายช่องแสงบนบานเกล็ด ขนาด 0.90x0.40 หนา 6 มม.	28.000	ตร.ฟ.	24.5936	688.62	34.1577	956.42	1,645.04	
	- ติดตั้งกระจกบานเกล็ดผ้า หนา 6 มม.	12.000	แผ่น	40.9893	491.87	-	-	491.87	
	- ติดตั้งชุดบานเกล็ดปรับมุมระบบแบบมือหมุน	1.000	ชุด	956.4160	956.42	13.6631	13.66	970.08	
	- เทคอนกรีต ค.2 240 ksc. (คานเอ็นส่วนที่ร้อยถอนรอบวงกบประตูหน้าต่าง)	1.000	ลบ.ม.	2,492.1469	2,492.15			ผู้ว่าจ้าง 2,492.15	
	- ฉาบเก็บปูนส่วนที่ร้อยถอนวงกบ ปูนทรายฉาบผิวเรียบ หนา 1.5 ซม.เพื่อสูญเสียแล้ว	6.000	ตร.ม.	79.2459	475.48			รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 475.48	
	- ติดตั้ง ก๊อกล้ำ 3/4"	1.000	ชุด	211.7778	211.78	34.1577	34.16	245.94	
	- ติดตั้งฝักบัวชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	1.000	ชุด	793.8253	793.83	95.6416	95.64	889.47	
	- ติดตั้งโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ เซรามิคเคลือบขาว	1.000	ชุด	4,097.5595	4,097.56	614.8389	614.84	พยาน 4,712.40	
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าเซรามิค พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและชุด ก๊อกอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	2,322.7246	2,322.72	614.8389	614.84	พยาน 2,937.56	
	- ติดตั้งก๊อกน้ำทองเหลือง 1/2"	1.000	ชุด	163.9570	163.96	34.1577	34.16	198.11	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....
 ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17,
 ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ผนวก.....3.....มีหน้า.....80.....ถึง.....
 บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17,

2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติดาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งตะแกรงน้ำทิ้งพื้นห้องน้ำ	1.000	ชุด	457.7134	457.71	34.1577	34.16	491.87	
	- ติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด 0.60 ม.	1.000	ชุด	379.8338	379.83	95.6416	95.64	475.48	
	- ติดตั้งที่ใส่สบูเซรามิคเคลือบขาวแบบฝังผนัง	1.000	ชุด	434.1582	434.16	163.9570	163.96	598.12	
	- ติดตั้งที่ใส่ทิชชูสแตนเลสแบบเจาะยึดผนัง	1.000	ชุด	256.8660	256.87	163.9570	163.96	420.82	
	- ติดตั้งกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 8"x8"	3.200	ตร.ม.	270.5291	865.69 (ลงชื่อ)	215.8768	690.81	1,556.50	
	- ติดตั้งกระเบื้องปูผนังห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 16"x16"	14.000	ตร.ม.	321.0825	4,495.16	215.8768 (นายระเด่น สะมะแอ)	3,022.27	7,517.43	ผู้ว่าจ้าง
	- ติดตั้งผ้าชายคา ไฟเบอร์ซีเมนต์แบบระบายอากาศพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	21.000	ตร.ม.	486.4059	10,214.52	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 125.7004	2,639.74	12,854.23	
	- ติดตั้งผ้าเพดาน T-bar พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	54.000	ตร.ม.	583.4138	31,504.34 (ลงชื่อ)	71.0480	5,836.59	35,340.94	
	- ติดตั้งผ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	10.000	ตร.ม.	486.4059	4,864.06	(นายวิระ พรหมจินดา) 128.4330	1,284.33	6,148.39	
	- เทพื้น คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	2.220	ลบ.ม.	4,071.5996	9,038.95 (ลงชื่อ)	572.4835 (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)	1,270.91	10,309.86	พยาน
	- ติดตั้งตะแกรงเหล็ก WIRE MESH เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	22.220	ตร.ม.	47.8208	1,062.56 (ลงชื่อ)	6.8315 (นางสาวธนพร ปานเกิด)	151.80	1,214.38	พยาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....
 ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17,
 ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ผนวก... 3 มีหน้า 61 ถึง.....
 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติดาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ปูนทรายทำพื้นผิวขัดมัน	22.220	ตร.ม.	103.8395	2,307.31	54.6523	1,214.38	3,521.69	
1.3	งานระบบไฟฟ้า	-							
	- ติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ยูนิต์ 6 ช่อง (แบบป้องกันไฟดูดและไฟฟ้าลัดวงจร)	1.000	ชุด	3,005.8789	3,005.88	-	-	3,005.88	
	- ติดตั้งชุดเซอร์กิต 15A 1.5kA	6.000	ชุด	161.2244	967.35	-	-	967.35	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x2.5 Sq.mm.	600.000	เมตร	17.8713	10,722.79	(ลงชื่อ) 9.5642	5,738.50	ผู้ว่าจ้าง 16,461.29	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x1.5 Sq.mm.	540.000	เมตร	11.7229	6,330.38	(นายระเด่น สะมะแอ) 6.8315	3,689.03	10,019.41	
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 20 mm. สีขาว	100.000	เมตร	18.8414	1,884.14	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน 16.3957	1,639.57	3,523.71	
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟลายลูกฟูก 20 มม. ขนาด 5 เมตร สี	50.000	เมตร	25.4133	1,270.67	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 7.6240	381.20	1,651.87	
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 2 x 4 นิ้ว	11.000	ชุด	31.4251	345.68	(ลงชื่อ) 3.6890	40.58	ผู้รับจ้าง 386.26	
	- ติดตั้งบล็อกกันน้ำ ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	58.7513	58.75	(นายวิระ พรหมจินดา) 12.7067	12.71	71.46	
	- ติดตั้งบล็อกลอยไฟฟ้า ขนาด 2 x 4 นิ้ว	13.000	ชุด	12.2968	159.86	(ลงชื่อ) 3.6890	47.96	พยาน 207.82	
	- ติดตั้งบล็อกลอยไฟฟ้า ขนาด 4 x 4 นิ้ว	1.000	ชุด	24.5936	24.59	(นางสาวกริรินทร์ ทองนาค) 5.3286	5.33	29.92	
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 3 ช่อง	13.000	ชุด	38.2566	497.34	(ลงชื่อ) -	-	พยาน 497.34	
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อกลอยไฟฟ้า 5 ช่อง	1.000	ชุด	62.8502	62.85	(นางสาวธนพร ปานเกิด)		62.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ชื่อโครงการ/งานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

ผนวก.....3.....มีหน้า.....92.....ถึง.....

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติดาการโยธา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ติดตั้งหน้ากากบล็อคลอยไฟฟ้า 1 ช่อง	1.000	ชุด	30.0588	30.06	-	-	30.06	
	- ติดตั้งเต้ารับกราวด์คู่ 16A, 250V	9.000	ชุด	222.7083	2,004.37	23.2272	209.05	2,213.42	
	- ติดตั้งสวิตช์ทางเดียว ขนาด1ช่อง	9.000	ชุด	28.6925	258.23	12.2968	110.67	368.90	
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 18W แสง Cool Daylight	8.000	ชุด	393.4969	3,147.98	150.2939	1,202.35	4,350.33	
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 9W แสง Cool Daylight	1.000	ชุด	215.8768	215.88	150.2939	150.29	366.17	
	- ติดตั้งแผ่น PVC ขนาดขนาด 10x12 นิ้ว	1.000	ชุด	91.5427	(ลงชื่อ) 91.54			ผู้ว่าจ้าง 91.54	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x16 Sq.mm.	30.000	เมตร	112.4199	3,372.60	(นายวิระ เตชะมณี) 27.3262	819.79	4,192.38	
	- ติดตั้งสายไฟฟ้า THW 1x10 Sq.mm.	15.000	เมตร	72.4144	1,086.22	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน 21.8609	327.94	1,414.13	
	- ติดตั้งแท่งกราวด์ไหลดซับทองแดง ขนาด 1.8 เมตร	1.000	ชุด	202.2137	202.21	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา -		202.21	
	- ติดตั้งยูแคลมป์ทองเหลือง สำหรับล๊อคแท่งกราวด์ ขนาด 50-70 มม.	1.000	ชุด	86.0774	(ลงชื่อ) 86.08	(นายวิระ พรหมจินดา) -		86.08	
	- วัสดุสิ้นเปลือง	1.000	งาน	5,020.0364	5,020.04	(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) -		5,020.04	
	รวมค่าซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 2/21				(ลงชื่อ) 189,594.64	(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) 46,982.82		236,577.45	

ลงชื่อ

(นายวิระ พรหมจินดา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุติดาการโยธา

(ลงชื่อ).....อนง.....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...00473/2568... แบบใบเสนอราคา

เรียนที่... 30... ลงวันที่... 30... 2568... โดยวิธีคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริตการการโยธา... ตั้งอยู่เลขที่... 10... ซอย... 8 (ถนนเวฬุวัน).. ถนนเวฬุวัน. ตำบลสะเตง อำเภอเมือง... จังหวัด... ยะลา... โทรศัพท์... 082-565-3519... โดย... นายวิระ พรหมจินดา... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล 51009/ ..2617... ลงวันที่ ...11 กันยายน 2568... โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน จ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ 2/7, 2/8, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20 และ 2/21

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในแบบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น.....2,952,000.00.....บาท (...สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน...) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....193,121.50.....บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. ค่าเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา.....180.....วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับค่าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ออกออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วนถูกต้อง ภายใน....270....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้รับระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยผู้ต้องและครบถ้วน

(ลงชื่อ) นายวิระ พรหมจินดา (นายวิระ พรหมจินดา)
(นางสาวธนพร ปานเค็ด)
กรรมการ

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกประกัน หรือเรียกจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับค้ำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่...16...เดือน ...กันยายน...พ.ศ.....2568.....

(ลงชื่อ).....

(....นายวิระ พรหมจินดา...)

ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....

.....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....

.....พยานกรรมการ

(นางสาวธนพร ปานกิด)

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บันทึกการต่อรองราคา

ลงวันที่... 30 กันยายน 2568

การเสนอราคาการเสนอราคาการจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพัก ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาบ้านเลขที่ ๒/๗, ๒/๘, ๒/๑๑, ๒/๑๒, ๒/๑๓, ๒/๑๔, ๒/๑๕, ๒/๑๖,

๒/๑๗, ๒/๑๘, ๒/๑๙, ๒/๒๐ และ ๒/๒๑ โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๘/๒๖๑๔-๒๖๒๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๒,๙๘๑,๐๙๕.๘๖ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบ้าบาทแปดสิบหกสตางค์) ราคากลาง ๒,๙๕๘,๒๑๘.๙๑ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบบ้าบาทแปดสตางค์) จำนวน ๓ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และกำหนดพิจารณาเปิดซอง ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการโยธา

เสนอราคา ๒,๙๕๒,๐๐๐.- บาท

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝิเสื่อและดอกไม้

เสนอราคา ๒,๙๕๕,๓๐๐.- บาท

๓. บริษัท อิศรา บิลเดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

เสนอราคา ๒,๙๕๗,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒,๙๕๒,๐๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิตาการโยธา หก.ฯ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นเงิน จำนวนเงิน ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) คงเหลือ ๒,๙๕๐,๐๐๐.- บาท ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงาน ภายใน ๒๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพรหมณี พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประสิทธิ์ บุญไทย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

(นางสาวธนาภรณ์ สุขศรีมิล)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...00473...สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

๑. การปรับราคาค่าก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

- ประปาของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมระบบประปาภายในบริเวณ

- ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

- ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

- ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

- ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.50 Mt/Mo + 0.10 St/So$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกรมการช่างเทคนิค ปฏิบัติราชการแทน

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทยในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....ปานพ.....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

หนังสือรับรอง

ผนวก..... ๖ หน้า..... 1

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่.....นครศรีธรรมราช

วันที่.....๓๐ เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. 2568

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....นายสุทธิพงษ์ อิศมาอิน.....อายุ.....65.....ปี
 เชื้อชาติ.....ไทย สัญชาติ.....ไทย อยู่บ้านเลขที่.....129/40 หมู่ที่.....10 ถนน.....-
 ตรอก/ซอย.....- ตำบล.....ส.ระยอง อำเภอ.....เวียง จังหวัด.....ระยอง
 หมายเลขโทรศัพท์.....091-0454129.....สถานที่ทำงาน.....-
 ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท.....วิศวกรรม สาขา.....โยธา
 แขนง.....- ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....รศ. 15578
 และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า
 เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด.....ห้องแถว ๒ ชั้น พักอาศัย ๑๕ คน (๑๕ คน)
 จำนวน.....1.....โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,
 แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....วิศวกร

(นายสุทธิพงษ์ อิศมาอิน)

วิศวกร สย.15578

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการ

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวกมลทิพย์ หอมหวาน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

คำเตือน

1. ให้ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
 (นางสาวกมลทิพย์ หอมหวาน)
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
 (นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่....00473/2568.....

ผนวก.....๖.....หน้า 2.....

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....



(Handwritten signature)

(นายสุทธิพงษ์ อิสมาอิน)
วิศวกร สย.15578



ใช้สำหรับออกแบบ คำนวณ.....
โครงการ.....
ของ.....
สถานที่.....

(Handwritten signature)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง



(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...00473/2568.....

ผนวก.....๖ หน้าแนบ.....๒.....

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม
ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

เขียนที่ 129/48 ซ.รวมทอง ม.10 ถ.ติ่งเบาะ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายสุทธิพงษ์ อีสมาอิน อายุ.....ปี สัญชาติ ไทย

เลขประจำตัวประชาชน 3-9598-00023-62-0 อยู่บ้านเลขที่ 129/40 ตรอก/ซอย -

ถนน ติ่งเบาะ หมู่ที่ 10 ตำบล/แขวง สะเตงนอก อำเภอ/แขวง เมืองยะลา

จังหวัด ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000 โทรศัพท์ 091-045-4129 สถานที่ทำงาน

โทรศัพท์.....

ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น ☒ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

☐ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

ประเภท สมาชิกสามัญ สาขา โยธา แขนง วิศวกรรมโยธา ระดับ สามัญวิศวกร

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน สย.15578 และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตาม ☒ กฎหมายว่าด้วยวิศวกร ☐ กฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

โดยข้าพเจ้าเป็น ☒ ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร ☐ ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร

(๑) ชนิด อาคาร ๑ ชั้น จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....

(๒) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....

(๓) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....

โดยมี นางสาวกรรณิการ์ วัฒนวงศ์ เป็นเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

☐ ก่อสร้างอาคาร ☐ ดัดแปลงอาคาร ☐ รื้อถอนอาคาร ☐ เคลื่อนย้ายอาคาร

ที่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน ติ่งเบาะ หมู่ที่.....

ตำบล/แขวง สะเตงนอก อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา

รหัสไปรษณีย์.....

ในที่ดิน ☐ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส.๓ ☐ น.ส.๓ ก. ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่น ๆ.....เลขที่.....

เป็นที่ดินของ.....แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว และได้แนบมาพร้อมเรื่องราวคำขออนุญาตดังกล่าว

๑. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

จำนวน.....1.....ฉบับ

(นายระเด่น สะมะแอ)

๒. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ที่ออกโดยสภาวิศวกรรมหรือสภาสถาปนิก แล้วแต่กรณี จำนวน.....1.....ฉบับ

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลายมือชื่อ).....วิศวกร/สถาปนิก

(.....นายสุทธิพงษ์ อีสมาอิน.....)
สย.15578

(ลายมือชื่อ).....ผู้ขออนุญาต/ผู้แจ้ง

(.....นายวิระ พรหมจินดา.....)
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

(ลายมือชื่อ).....พยาน

(.....นางแก่นใจ อีสมาอิน.....)

(ลายมือชื่อ).....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ วัฒนวงศ์)

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องแก้ไข

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นศตนิฟ งาม วชิ ปวส.
สาขา วิชา ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จอ งามเหลว ปณ พังงา ภูเก็ต เพชรเกษม
ปภศา (พจ, พ.ศ.)
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ นจก จิตกรกร ไซก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
..... นจก จิตกรกร ไซก เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) นศตนิฟ งาม
(..... นศตนิฟ งาม)
ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) นายวิระ พรหมจินดา
(..... นายวิระ พรหมจินดา)
ผู้เสนอราคา
ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ นจก จิตกรกร ไซก


หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวิระ พรหมจินดา)
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

รายการเกี่ยวกับบ้าน		เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน	9505-002639-3	สำนักทะเบียน อำเภอชะอำ
รายการที่อยู่	105 หมู่ที่ 2	
ตำบลบางโกลน อำเภอชะอำ จังหวัดยะลา		
ชื่อหมู่บ้าน	ชื่อบ้าน	
ประเภทบ้าน	ลักษณะบ้าน	
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่		
ลงชื่อ	นายทะเบียน	
(นายสุกชัย ไชยพันธ์)		
วันเดือนปีขึ้นทะเบียนบ้าน	12 กุมภาพันธ์ 2550	

สัญญาจ้าง
ฉบับที่
(๗๗๐ ๐๗๗๗ ๖๕๐)

เล่มที่ - 1	รายการบุคคลในครัวเรือนของเลขรหัสประจำบ้าน	9505-002639-3	ลำดับที่ 6
ชื่อ	ค.ช. อาชีพ ชาวลอ	สัญชาติ ไทย	เพศ ชาย
เลขประจำตัวประชาชน	1-9505-00227-79-9	สถานภาพ	ผู้อาศัย
เกิดเมื่อ	17 ก.ย. 2545		
การอยู่ให้กำเนิด ชื่อ	พ่อคเณาะ	3-9006-00274-95-7	สัญชาติ ไทย
บิดาให้กำเนิด ชื่อ	อาฮามัดสุกรี	3-9505-00307-68-3	สัญชาติ ไทย
มาจาก	ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร	(ลงชื่อ)	ผู้รับแจ้ง
เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ	18 ก.ย. 2545	(นายสุกชัย ไชยพันธ์)	
.. ไม่		รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
		(ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
		(นายวิระ พรหมจินดา)	
		(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)	
		(ลงชื่อ) พยาน	
		(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)	
		(ลงชื่อ) พยาน	
		(นางสาวธนพร ปานเกิด)	




ระเบียบแสดงผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00473/2568

ผนวก..... หน้า 7

ชื่อ - นามสกุล นายอาทิตย์ ชลล
 จังหวัด ยะลา
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2568
 รหัสประจำตัวประชาชน 1-9505 00227 79 9

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา
 สถานศึกษาเดิม โรงเรียนสุราษฎร์วิทย
 จังหวัด ยะลา
 ระดับการศึกษาที่จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ปีการศึกษาที่จบ 2563
 เข้าศึกษาเมื่อ 15 พฤษภาคม 2566
 หน่วยกิตที่รับโอน 13
 หน่วยกิตที่เรียน 93
 หน่วยกิตที่ได้ 86
 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.65
 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ 6 มีนาคม 2568
 สำเร็จการศึกษาเมื่อ 18 มีนาคม 2568



ชื่อ - นามสกุล นายอาทิตย์ ชลล
 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม
 วัน เดือน ปีเกิด 17 กันยายน 2545
 เลขประจำตัวประชาชน 1 9505 00227 79 9
 ชื่อบิดา นายอาฮามัดสุกรี ชลล
 ชื่อมารดา นางสาวพอลติมาะ บุลลลิจ
 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
 สาขาวิชา โยธา
 สาขางาน โยธา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)
ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1					ปีการศึกษา 2566 ภาคฤดูร้อน				
30000-1101	ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ(*1)	3	4.0	12.0	30121-8001	ฝึกงาน	4	4.0	16.0
30000-1201	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(*1)	3	3.0	9.0	หน่วยกิตที่ได้ในภาค 4 หน่วยกิตสะสม 40 คะแนนเฉลี่ยในภาค 4.00 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.58				
30000-1202	ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน(*1)	2	2.5	5.0	ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1				
30000-1501	ชีวิตกับสังคมไทย(*1)	3	3.0	9.0	30000-1204	ภาษาอังกฤษโครงงาน	1	2.5	2.5
30000-1602	การคิดอย่างเป็นระบบ(*1)	2	4.0	8.0	30001-2001	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ	3	4.0	12.0
30001-1001	การบริหารงานคุณภาพในองค์กร	2	4.0	8.0	30121-2001	การทดสอบวัสดุงานโยธา	3	4.0	12.0
30100-0101	กลศาสตร์วิศวกรรม	3	4.0	12.0	30121-2004	การเขียนแบบโยธาดำเนินการคอมพิวเตอร์	3	4.0	12.0
30100-0105	ความแข็งแรงของวัสดุ	3	4.0	12.0	30121-2103	วิศวกรรมจราจร	3	3.0	9.0
30108-0002	การเขียนแบบก่อสร้าง(*2)	3	3.5	10.5	30121-2107	การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก	3	2.5	7.5
30000-2001	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1	ผ.			30121-2111	การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา	3	4.0	12.0
30000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2(*1)	ผ.			30121-2112	ระบบสุขาภิบาล	2	3.0	6.0
30121-0001	กลศาสตร์โครงสร้าง	3	ผ.		30121-8502	โครงงาน 1	2	3.5	7.0
30121-0002	วัสดุก่อสร้าง	3	ผ.		30000-2003	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3	ผ.		
30121-0005	พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธา	3	ผ.		หน่วยกิตที่ได้ในภาค 23 หน่วยกิตสะสม 63 คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.54 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.54				
30121-0007	พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา	2	ผ.		ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 2				
หน่วยกิตที่ได้ในภาค 24 หน่วยกิตสะสม 24 คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.56 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.56					30000-1305	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	4.0	12.0
ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2					30000-1610	น้ำดื่ม	1	4.0	4.0
30000-1404	แคลคูลัส 1	3	4.0	12.0	30001-1052	กฎหมายและสัญญา	2	3.5	7.0
30100-0301	ทฤษฎีโครงสร้าง	3	3.0	9.0	30121-2005	การประมาณราคางานโยธา	3	4.0	12.0
30121-2002	คอนกรีตเทคโนโลยี	3	3.0	9.0	30121-2006	การออกแบบและก่อสร้างงานโยธา	3	4.0	12.0
30121-2003	ปฐพีกลศาสตร์	3	4.0	12.0	30121-2101	การเขียนแบบโครงสร้างงานโยธา	3	4.0	12.0
30121-0003	เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา	3	ผ.		30121-2105	ชลศาสตร์	3	4.0	12.0
30121-0004	พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา	3	ผ.		30000-2004	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4	ผ.		
30121-0006	พื้นฐานการสำรวจ	3	ผ.		หน่วยกิตที่ได้ในภาค 12 หน่วยกิตสะสม 36 คะแนนเฉลี่ยในภาค 3.50 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.54				

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 18 มีนาคม 2568

เหตุที่ออก สำเร็จการศึกษาคตามหลักสูตร

(นางสาวกมล แก้วนก)
 หัวหน้างานทะเบียน
 วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

(นางสาวกรรณิการ์ ห่อหมก)
 ผู้อำนวยการ

วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ผู้อำนวยการ
 (นางสาวกมล แก้วนก)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....๐๐๔๗๓๗๒๕๖๘.....

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

ลงวันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๘.....

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจันทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...00473/2568.....

ภาคผนวก ๑
ผนวก..... ๗หน้า..... ๒

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568...ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...00473/2568.....

ผนวก..... 7 ภาคผนวก ๒ 3 หน้า.....

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่...00473/2568.....

ผนวก.....7 ภาคผนวก ๓ 4
หน้า.....

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ
รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
- ☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
- เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้เช่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ผนวก.....8.....มีหน้า.....1.....ถึง.....5.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

ผนวก.....8.....มีหน้า.....1.....ถึง.....5.....

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ พรหมจันทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ผนวก.....8 มีหน้า.....2 ถึง.....5


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานเดิวก่อสร้าง					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รายการ...	ตร.ม.				
รวม						0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

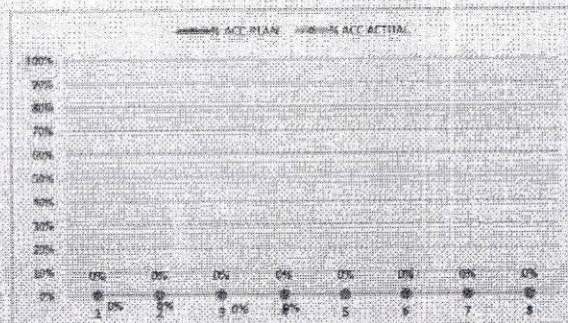

หมายเหตุ:

1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินการสัญญา จำนวน 8 เดือน

2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบคำนวณงานของแต่ะรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการเตรียมงาน)

3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบงานประจำเดือนของแต่ะรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ะรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %

4) Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแบบงานเทียบกับมูลค่ากำหนดของแต่ะรายการ

5) % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแบบดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

Money							
AccMoney							
	(ลงชื่อ).....					ผู้ว่าจ้าง	
% PLAN				(นายระเด่น สาระแน)			
% ACC PLAN							
				รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน			
% ACTUAL				นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
% ACC ACTUAL							
% ACC DIFF	(ลงชื่อ).....					ผู้รับจ้าง	
				(นายวิระ พรหมจินดา)			
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF	(ลงชื่อ).....					พยาน	

(นางสาวสมพร ปานเกิด)

(นางสาวสมพร ปานเกิด)


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....00473/2568.....

ผนวก.....๕ มีหน้า.....3 ถึง.....๕..... สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเสริม					
	ส1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	ส2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานสีผิวทาง					
	บ1	ตร.ม.	100	2,000	800,000	26%
	บ2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

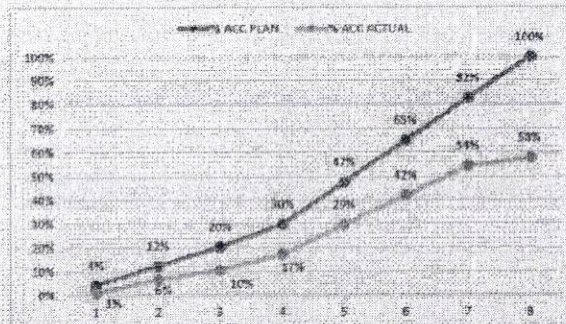

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบค่าเงินรวมทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแบบค่าเงินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานก่อสร้างเสริม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง (ตัวอย่างนี้คือ 100 ของรายการนี้)
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ ค่าเงินจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- % PLAN ร้อยละของแผนค่าเงินงาน ค่าเงินจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

	1	2	3	4	5	6	7	8
	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สระมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ พรหมจินดา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

ลงวันที่.....30 กันยายน 2568.....

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ระยะเวลาเกิน 1 ปี 2

ระยะเวลาเกิน 3 ปี 4


ในสุดสัญญา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานสีทาขาว					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	500	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
คค.	พค.	ธค.	มค.	กค.	มิค.	เมย.	พค.
20	20	20	20	20			
	20	20					
			10	20	15	20	20
				10	25	25	25

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29 \%$$

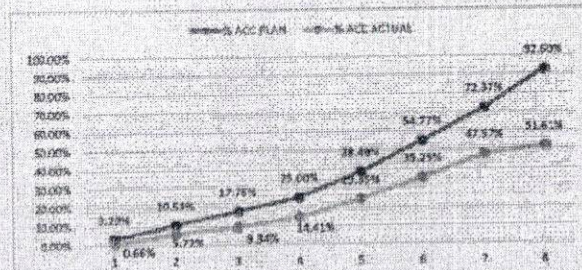

Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	13.45%	16.28%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.51%	17.76%	25.00%	32.22%	39.44%	46.67%	53.89%
% ACTUAL	0.66%	5.07%	3.62%	5.07%	9.44%	11.40%	12.32%	4.05%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.30%	14.37%	23.81%	35.21%	47.53%	51.61%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.93%	14.64%	19.52%	24.89%	40.99%

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานเป็นงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่รายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างเดิม)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างคือจำนวนการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่รายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
- Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่รายการ
- AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
- % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากร้อยละของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
- % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
- % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
- % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
- % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินงานสะสม

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวชนพร ปานเกิด)


ลงวันที่..... 30 กันยายน 2568.....

ผนวก 8 มีหน้า 5 ถึง 5 สิ่งที่ยังมาด้วย ๔

1997/1998

[illegible]

$$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\%$$

[illegible]

Money	100,000	100,000	100,000	75,000	960,000	810,000	810,000									
Acc Money	100,000	100,000	100,000	410,000	420,000	870,000	1,161,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
% PLAN	1.00%	1.00%	1.00%	1.33%	0.00%	0.00%	0.00%									
% ACC PLAN	1.00%	1.00%	1.00%	0.00%	0.00%	12.50%	19.23%	24.37%								
% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	1%	0%	0%									
% ACC ACTUAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%	13%								
% ACC DIFF	1%	0%	0%	0%	-2%	0%	0%	12%								
% PLAN2	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%									
% PLAN2 DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%									



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปลัดราชการแทน

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยระบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
(นายวิระ พรหมจินดา)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....สนม.....พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๘๐๘/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ ๒/๗, ๒/๘, ๒/๑๑, ๒/๑๒, ๒/๑๓, ๒/๑๔, ๒/๑๕, ๒/๑๖, ๒/๑๗, ๒/๑๘, ๒/๑๙,
๒/๒๐ และ ๒/๒๑ โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพัก
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่ ๒/๗, ๒/๘, ๒/๑๑, ๒/๑๒,
๒/๑๓, ๒/๑๔, ๒/๑๕, ๒/๑๖, ๒/๑๗, ๒/๑๘, ๒/๑๙, ๒/๒๐ และ ๒/๒๑ โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้
เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง
โครงการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ ถนนเอกราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บ้านเลขที่
๒/๗, ๒/๘, ๒/๑๑, ๒/๑๒, ๒/๑๓, ๒/๑๔, ๒/๑๕, ๒/๑๖, ๒/๑๗, ๒/๑๘, ๒/๑๙, ๒/๒๐ และ ๒/๒๑ โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางสาวพรรณนิภา พรพระสงฆ์

ประธานกรรมการฯ

นิติกรชำนาญการ

๒. นายประสิทธิ์ บุญฤทธิ์

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓. นางสาวธนาภรณ์ สุขศรีมิล

กรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุนสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายณัฏชนนท์ คุณาเรียนกุล

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

๒. นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

กรรมการ

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาวุโส

๓. นายอาทิตย์ศักดิ์ เพชรสกุลวงศ์

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายฤทธิรงค์ ครอบคอบ

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

๒. นายคมกริช เขียวแก้ว

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายมุตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
