

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๔๕๘/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายมุขตาร์ มะทา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ็น.พี. บิลด์กรุป ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕๔/๑ ถนนสิโรส ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดยนางวรรัตน์ ทองคุปต์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล. ๐๐๐๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าโรงเรียนลำพะยาประชาชนเคราะห์ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด) ณ โรงเรียนลำพะยาประชาชนเคราะห์ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดแบบแปลน+แบบป้าย	จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา+บันทึกการต่อรองราคา	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดปริมาณงานและราคา	จำนวน ๔ (สี่) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ราคา ค่าK	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดหนังสือรองรับผู้ประกอบการวิชาชีพควบคุมงาน+	
หนังสือรับรองช่างควบคุมงานก่อสร้าง	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน	จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....(นายมุขตาร์ มะทา).....)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นางวรรัตน์ ทองคุปต์).....



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๐๑๘๘๑/๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๔๒,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับ จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ วันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่น บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๔,๙๕๓.๒๗ บาท (ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ งาน จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าโรงเรียนลำพระยาประชานุเคราะห์ ตำบลลำพระยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ งานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้ว เสร็จภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นาย मुखาร์ มะทา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....) N.P. (.....) BUILDING GROUP LIMITED PARTNERSHIP

(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.....)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นาย मुखตาร์ มะทา)
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)

(ลงชื่อ).....
(นางนวรรตน์ ทองคำ)
(.....)
M.M.P.
BUILDING GROUP LIMITED PARTNERSHIP

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับ มีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมนตรี มະธา)

(นายทรงเกียรติ วัฒนา...)

(ลงชื่อ).....
(นางนารัตน์ ทวี...



การที่ผู้ว่าจ้างทำกรณีนเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขัดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)

(ลงชื่อ).....

(นาง นวรัตน์ พันธ์รัตน์)



ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมนตรี มหา)

(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)

(ลงชื่อ).....

(นางนวิรัตน์...ทองแดง)



ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๘๔๐.๐๐ - บาท (แปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และจะต้อง ชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมนตรี มหา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
นางนารัตน์ ทองคำ
N.N.P.
BUILDING GROUP LIMITED PARTNERSHIP

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

(ลงชื่อ).....

[Signature]

ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

[Signature]

นางนารัตน์ ทองคำ

(.....)



การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ โยธา

๒๓.๒ ก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นางนารัตน์ ทองสุข)

.....



ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นาง นวรัตน์ ทองคุปต์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๘๔๖๑๒๓๒๑

เลขคู่สัญญา ๖๖๐๘๔๒๐๑๘๖๖๒



ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Default.aspx)

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

ระบบงบประมาณ

รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายรับ

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

จัดทำใบปลงเงิน ()

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม/เงินทุนสำรอง

เงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

จัดทำฎีกา ()

เงินประกัน ()

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบบัญชี

รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี ()

ทะเบียนสินทรัพย์ ()

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 26 กันยายน 2566 (ปีงบประมาณ 2566)

นางสาว ธนพร ปานเกิด (./Default.aspx?menu=0B8D6D79-D5A4-4467-
หน้า B2B0-5400E99E4ADB&control=list)

หน่วย

งาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สด

ออกจากระบบ

26 กันยายน 2566[V.2023-09-22141.20]

แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

☐ ข้อมูลจากระบบ e-GP ☒ บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

ประวัติการแก้ไข

เลขที่โครงการ(e-GP)

66089612721

เลขคณสัญญา(e-GP)*

660922018662

เลขที่คณสัญญาของ อปท.*

00458/2566

วันที่ทำสัญญา*

26/09/2566

วันสิ้นสุดสัญญา*

22/06/2567

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

0

ระบบ GFMIS

เลขที่สัญญา(e-LAAS)

CNTR-00458/66

ชื่อเจ้าหน้าที่*

ทจก.เอ็น.เอ็น.พี.บิลด์กรุป

จำนวนเงินขอซื้อจ้าง

870,000.00

บาท

จำนวนเงินขะการการจัดซื้อจ้าง

840,000.00

บาท

จำนวนเงินที่ทำสัญญา

840,000.00

บาท

สถานะ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

แหล่งที่มาของเงิน

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างซ่อม ทางเข้าโรงเรียนสำ พะยาประชาชนเคราะห ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	เงินงบ ประมาณ ค้างจ่าย		870,000.00	840,000.00	30,000.00
						840,000.00	

เงินล่วงหน้า

☐ มีเงินล่วงหน้า ☒ ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

☒ มีหลักประกันสัญญา ☐ ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา

เงินสด

ชื่อผู้จัดทำ*

นางสาวธนพร ปานเกิด

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินงบประมาณค้างจ่าย 2565 : โครงการก่อสร้างซ่อมทางเข้า โรงเรียนลำพะยาประชาชนเคราะห ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา	840,000.00	0.00	840,000.00



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01881/66

วันที่ 26 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ได้รับเงินจาก หจก.เอ็น.เอ็น.พี.บิลด์กรุป

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างซ่อมทางเข้า โรงเรียนลำพะยาประชาชนเคราะห์ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นเงินสด	2112010101.001	42,000.00	สัญญาเลขที่ 00458/2566(CNTR- 00458/66)
รวมเงิน			42,000.00	

ตัวอักษร (สีหมึกสองพื้นบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวนิรุติหิซาน สะแลแม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 02076609263208115366

เลือกยื่นตราสาร ☒ ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ☐ ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 5 3 5 4 2 0 0 0 2 0 7

สาขาที่ 00000

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ็น.พี.บิลดิงกรุ๊ป

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 6 0 4 2 3 8

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา อบจ. ยะลา

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ 00458/2566 ลงวันที่ 26/09/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 27/09/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 22/06/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 66089612721

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 785,046.73

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

จำนวนงวดงาน 2

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 786.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 786.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 66124423813

วันที่ชำระเงิน 26/09/2566

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date :2023-09-26 14:27:21



แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

☒ (1) ยื่นปกติ ☐ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่

☒ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา ☐ (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร **ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ็น.พี.บิลดิ้งกรุ๊ป**

ในฐานะ **ผู้รับจ้าง**

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร **0 9 5 3 5 4 2 0 0 0 2 0 7** สาขาที่ **0**

ที่อยู่อากร - **ห้องเลขที่ -** **ชั้นที่ -** **หมู่บ้าน -** **เลขที่ 254/1** **หมู่ที่ -**

ตรอก/ซอย - **แยก -** **ถนน สีโรธ** **ตำบล/แขวง สะเต**

อำเภอ/เขต **เมืองยะลา** **จังหวัด ยะลา** **รหัสไปรษณีย์ 9 5 0 0 0**

ชื่อคู่สัญญา **อบจ. ยะลา**

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร **0 9 9 4 0 0 0 6 0 4 2 3 8** สาขาที่

ที่อยู่อากร **ห้องเลขที่** **ชั้นที่** **หมู่บ้าน** **เลขที่ 1** **หมู่ที่**

ตรอก/ซอย **แยก** **ถนน วงเวียน 2** **ตำบล/แขวง สะเต**

อำเภอ/เขต **เมืองยะลา** **จังหวัด ยะลา** **รหัสไปรษณีย์ 9 5 0 0 0**

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ **00450/2566** ลงวันที่ **26/09/2566**

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร **27/09/2566**

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร **22/06/2567**

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ **66089612721**

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่ยึดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 66124423813

วันที่: 26/09/2566

จำนวนเงิน 786.00 บาท

(เจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)

DLN: 669000060001295001030925660926020000100

UID: 0000600025660926309011346

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ **จ้างทำของ**

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) **705,046.73**

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	786.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	786.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง: **จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพื้นที่ทางเข้าโรงเรียนสำหรับพยาบาลประจำโรงเรียน**

จำนวนรพ.งาน: **2**

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Digitally Signed

By 336 Revénue Département 489A) 1D02737646673C9B7470E9D0266C649443E4C3E00D6FDBA1ED2F562101F1BC054B60A0E700752460

Date: 2023-09-26 14:27:20

ในวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 00:00:00 น.



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร		
ผู้ชำระภาษีอากร	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็มพีเอสดังกรุ๊ป		
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน	0-9535-42000-20-7		

วันชำระเงิน/วันนำส่ง	26/09/2566
เดือน/ปีภาษี	
ประเภทการชำระ	อากรแสตมป์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090011022535	66124423813	*****786.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร	(เจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)	786.00

อ.ส.9

ผู้รับเงิน

ทศพร ทรัพย์

(นางทิพย์มณี เต่าร้าง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



เอกสารแนบ.....
 เลขที่.....
 วันที่.....
 ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖
 เลขที่.....

สถานที่ โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์^{๒๕๖} ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา



นางสาวธนพร ปานเกิด

๑๐ / ๑๕๒. วันที่ 2.0 มิ.ย. 2555

เอกสารแนบ... เลขที่ ๐๐458/2556

โครงการ: ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๒๕๕๖

โรงเรียนพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี

แนวทางการปฏิบัติทั่วไปในการก่อสร้าง

- 1. การดำเนินการ - ในกรณีจ้างเหมาจ้างงาน... 2. การดำเนินการ... 3. การดำเนินการ...

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

- 1. วัสดุ - 1.1 วัสดุ... 1.2 วัสดุ... 2. วัสดุ - 2.1 วัสดุ... 2.2 วัสดุ... 2.3 วัสดุ... 3. วัสดุ - 3.1 วัสดุ... 3.2 วัสดุ...

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)

- คอนกรีตเสริมเหล็ก... - คอนกรีตเสริมเหล็ก... - คอนกรีตเสริมเหล็ก... - คอนกรีตเสริมเหล็ก... - คอนกรีตเสริมเหล็ก... - คอนกรีตเสริมเหล็ก... - คอนกรีตเสริมเหล็ก... - คอนกรีตเสริมเหล็ก... - คอนกรีตเสริมเหล็ก... - คอนกรีตเสริมเหล็ก...

(ลงชื่อ)

นายกองการบริการลูกค้า... (ลงชื่อ) ... (ลงชื่อ) ... (ลงชื่อ) ... (ลงชื่อ) ... (ลงชื่อ) ... (ลงชื่อ) ... (ลงชื่อ) ... (ลงชื่อ) ... (ลงชื่อ) ...



Form with fields for name, position, and signature. Includes a stamp from the Ministry of Education and Higher Education.



วันที่ ๑๐/๑๒/๒๕๕๖

รายการประกอบแบบก่อสร้าง (ต่อ)

[illegible][illegible]

	ผนัง สลักฐานรูป	(ลงชื่อ)..... (นาย).....
	คอนกรีต	(ลงชื่อ)..... (นางสาว).....
	พื้นดิน	(ลงชื่อ)..... (นางสาว).....
	รูปลัดและทิศทางวางวัด	(ลงชื่อ)..... (นางสาว).....
	นวมยธรรมบ้าน	(ลงชื่อ)..... (นางสาว).....
	นวมยธรรมบ้าน	(ลงชื่อ)..... (นางสาว).....
	ประตู	(ลงชื่อ)..... (นางสาว).....
	หน้าต่าง	(ลงชื่อ)..... (นางสาว).....
	ผนัง	(ลงชื่อ)..... (นางสาว).....

3

(ลงชื่อ) นพด. (นายผู้তার มณฑา)

[Handwritten signature]

นายแพทย์ มุสซิมาน

Signature _____

STZ
A-1

นายสมชาย ทรัพย์น้อย (รอง) นายสาธิต พร บานเกิด

1. 1.00
 2. 1.00
 3. 1.00
 4. 1.00
 5. 1.00
 6. 1.00
 7. 1.00
 8. 1.00
 9. 1.00
 10. 1.00
 11. 1.00
 12. 1.00
 13. 1.00
 14. 1.00
 15. 1.00
 16. 1.00
 17. 1.00
 18. 1.00
 19. 1.00
 20. 1.00
 21. 1.00
 22. 1.00
 23. 1.00
 24. 1.00
 25. 1.00
 26. 1.00
 27. 1.00
 28. 1.00
 29. 1.00
 30. 1.00
 31. 1.00
 32. 1.00
 33. 1.00
 34. 1.00
 35. 1.00
 36. 1.00
 37. 1.00
 38. 1.00
 39. 1.00
 40. 1.00
 41. 1.00
 42. 1.00
 43. 1.00
 44. 1.00
 45. 1.00
 46. 1.00
 47. 1.00
 48. 1.00
 49. 1.00
 50. 1.00
 51. 1.00
 52. 1.00
 53. 1.00
 54. 1.00
 55. 1.00
 56. 1.00
 57. 1.00
 58. 1.00
 59. 1.00
 60. 1.00
 61. 1.00
 62. 1.00
 63. 1.00
 64. 1.00
 65. 1.00
 66. 1.00
 67. 1.00
 68. 1.00
 69. 1.00
 70. 1.00
 71. 1.00
 72. 1.00
 73. 1.00
 74. 1.00
 75. 1.00
 76. 1.00
 77. 1.00
 78. 1.00
 79. 1.00
 80. 1.00
 81. 1.00
 82. 1.00
 83. 1.00
 84. 1.00
 85. 1.00
 86. 1.00
 87. 1.00
 88. 1.00
 89. 1.00
 90. 1.00
 91. 1.00
 92. 1.00
 93. 1.00
 94. 1.00
 95. 1.00
 96. 1.00
 97. 1.00
 98. 1.00
 99. 1.00
 100. 1.00
 101. 1.00
 102. 1.00
 103. 1.00
 104. 1.00
 105. 1.00
 106. 1.00
 107. 1.00
 108. 1.00
 109. 1.00
 110. 1.00
 111. 1.00
 112. 1.00
 113. 1.00
 114. 1.00
 115. 1.00
 116. 1.00
 117. 1.00
 118. 1.00
 119. 1.00
 120. 1.00
 121. 1.00
 122. 1.00
 123. 1.00
 124. 1.00
 125. 1.00
 126. 1.00
 127. 1.00
 128. 1.00
 129. 1.00
 130. 1.00
 131. 1.00
 132. 1.00
 133. 1.00
 134. 1.00
 135. 1.00
 136. 1.00
 137. 1.00
 138. 1.00
 139. 1.00
 140. 1.00
 141. 1.00
 142. 1.00
 143. 1.00
 144. 1.00
 145. 1.00
 146. 1.00
 147. 1.00
 148. 1.00
 149. 1.00
 150. 1.00
 151. 1.00
 152. 1.00
 153. 1.00
 154. 1.00
 155. 1.00
 156. 1.00
 157. 1.00
 158. 1.00
 159. 1.00
 160. 1.00
 161. 1.00
 162. 1.00
 163. 1.00
 164. 1.00
 165. 1.00
 166. 1.00
 167. 1.00
 168. 1.00
 169. 1.00
 170. 1.00
 171. 1.00
 172. 1.00
 173. 1.00
 174. 1.00
 175. 1.00
 176. 1.00
 177. 1.00
 178. 1.00
 179. 1.00
 180. 1.00
 181. 1.00
 182. 1.00
 183. 1.00
 184. 1.00
 185. 1.00
 186. 1.00
 187. 1.00
 188. 1.00
 189. 1.00
 190. 1.00
 191. 1.00
 192. 1.00
 193. 1.00
 194. 1.00
 195. 1.00
 196. 1.00
 197. 1.00
 198. 1.00
 199. 1.00
 200. 1.00
 201. 1.00
 202. 1.00
 203. 1.00
 204. 1.00
 205. 1.00
 206. 1.00
 207. 1.00
 208. 1.00
 209. 1.00
 210. 1.00
 211. 1.00
 212. 1.00
 213. 1.00
 214. 1.00
 215. 1.00
 216. 1.00
 217. 1.00
 218. 1.00
 219. 1.00
 220. 1.00
 221. 1.00

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ ๑๐๐๐/๒๕๖๓
วันที่ ๑๐/๑๐/๖๓

๑๑ / ๒๕๖๒ วันที่ 20/ม.ย. 256๒

.....
U2911

.....
 ୧୧୧୩ ୩୩ ୧୩

 ୩୩୩୩

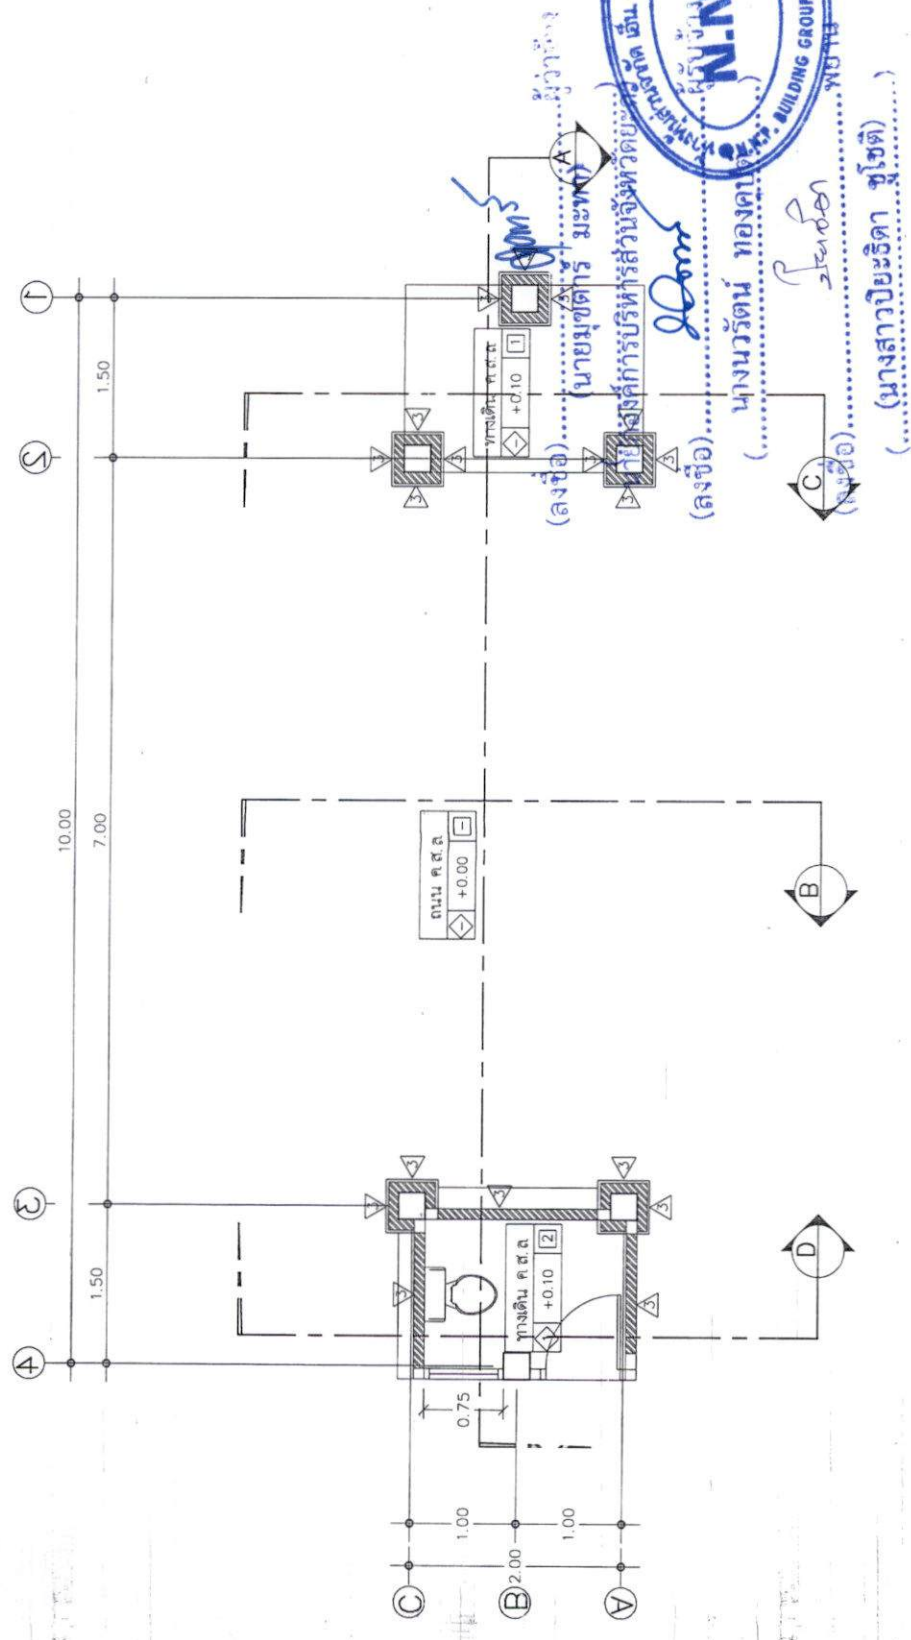

๒๒๒๒
๒๒๒๒ ๒๒๒๒

(ลงชื่อ)..... วิชาพร..... พิชญ
(นางสาวธนพร ปานเกิด)

คณะกรรมการสอบแล้ว
 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา
ลงนาม
วิมลกรไชย (ส. 11560)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา
 เลขที่ตรวจสอบ ๕๐ / ๒๐๒ / ๒.๐ ก.ย. ๕๖

[illegible]

[illegible]

(.....(นางสาวปิยะธิดา ชูชาติ))

5. $\frac{1}{2} \log 2$

แปลงหลังคา

มาตรา ๕๖	๑:๕๐
----------	------

นางสาวธนพร ปานเกิด

จำนวนเงิน

กลุ่มงานวิชาการและวิชาการ
นโยบายวิชาการและแผนของจังหวัด

สำนักงานนโยบายการและผังเมืองแห่งชาติ

.....

R..... 3000000 (ca. 11500)


.....

๙๐ / ๕๕๖๖ วันที่ 2.0.มิ.ย. 2566

[illegible][illegible]

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐458/2566


ถึงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๖

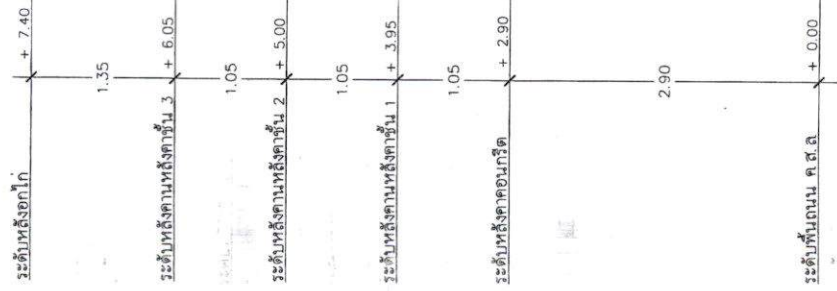

Come Again Soon

ผนังปูนประดับขนาด 4x10 นิ้ว

ถนน คสล	± 0.00
---------	--------



(ลงชื่อ).....

(นางนันทน์ ทองคปต)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะธิดา ขุโธติ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอนพร ปานเพ็ญ)

อุปดำนห้ถึง

มัตราลวัน คณณำนรชาการโยธาธิการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา

สถาปนิก

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างรั้วทางม้า
โรงเรียนสหประชาประชาสรรค์

แบบแสดง

มตราลวัน

วันที่ A-08 จำนวน/แผ่น 18

สำรวจ

นายสุทัศน์ หนึ่งสิงห์
นายสุวิทย์ ชื่นบุญ

นายสุวิทย์ ชื่นบุญ

นายสุวิทย์ ชื่นบุญ

นายสุวิทย์ ชื่นบุญ

นายสุวิทย์ ชื่นบุญ

นายสุวิทย์ ชื่นบุญ

นายสุวิทย์ ชื่นบุญ


นายสุวิทย์ ชื่นบุญ

นายสุวิทย์ ชื่นบุญ

นายสุวิทย์ ชื่นบุญ

นายสุวิทย์ ชื่นบุญ

นายสุวิทย์ ชื่นบุญ

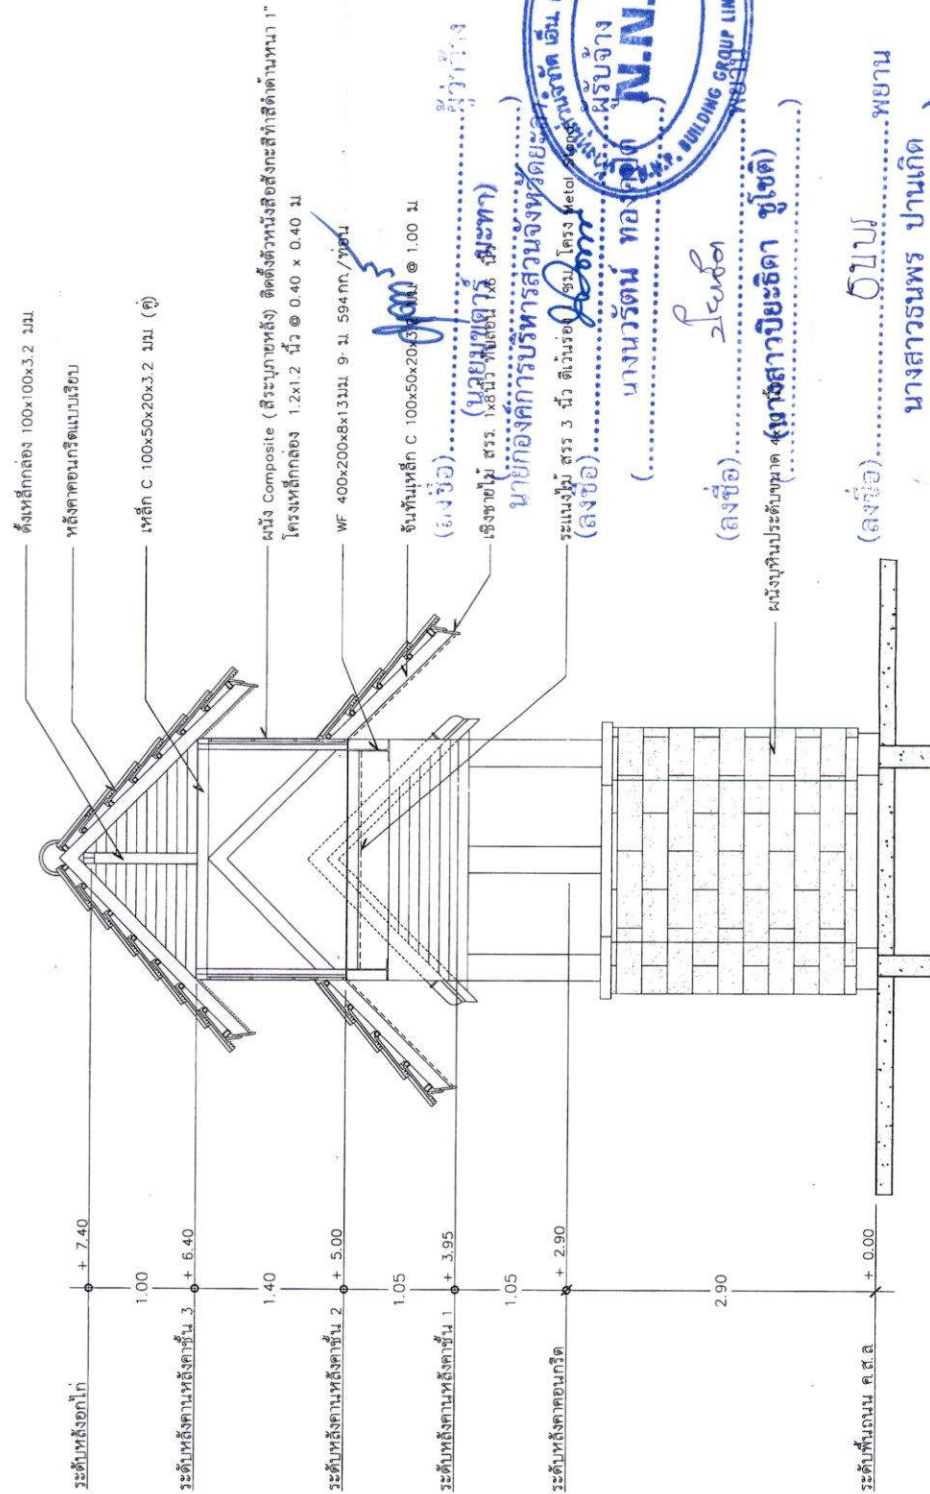

รวม ๒๓

1.50
1.50

แผนการตรวจและ
กลุ่มงานวิชาการ
สำนักงานวิชาการและ
สำนักงานวิชาการและ

.....สถาบัน.....
.....วิบูลย์ (๓๑ 11590).....


~~๑~~ ข้อความนี้เป็นเอกสารโดยฉักร
โดยวิธีการหนึ่งเมืองจังหวัดยะลา
เลขที่ตรวจสอบ. ๕๐ / ๒๖๖ วันที่ 2-0-71 E. 2566.

เลขที่ตรวจสอบ ๕๐ / ๕๐๖ วันที่ 20/11/2565

[illegible]

.....
 ১৩৮৬
 ১৩৮৬


✓

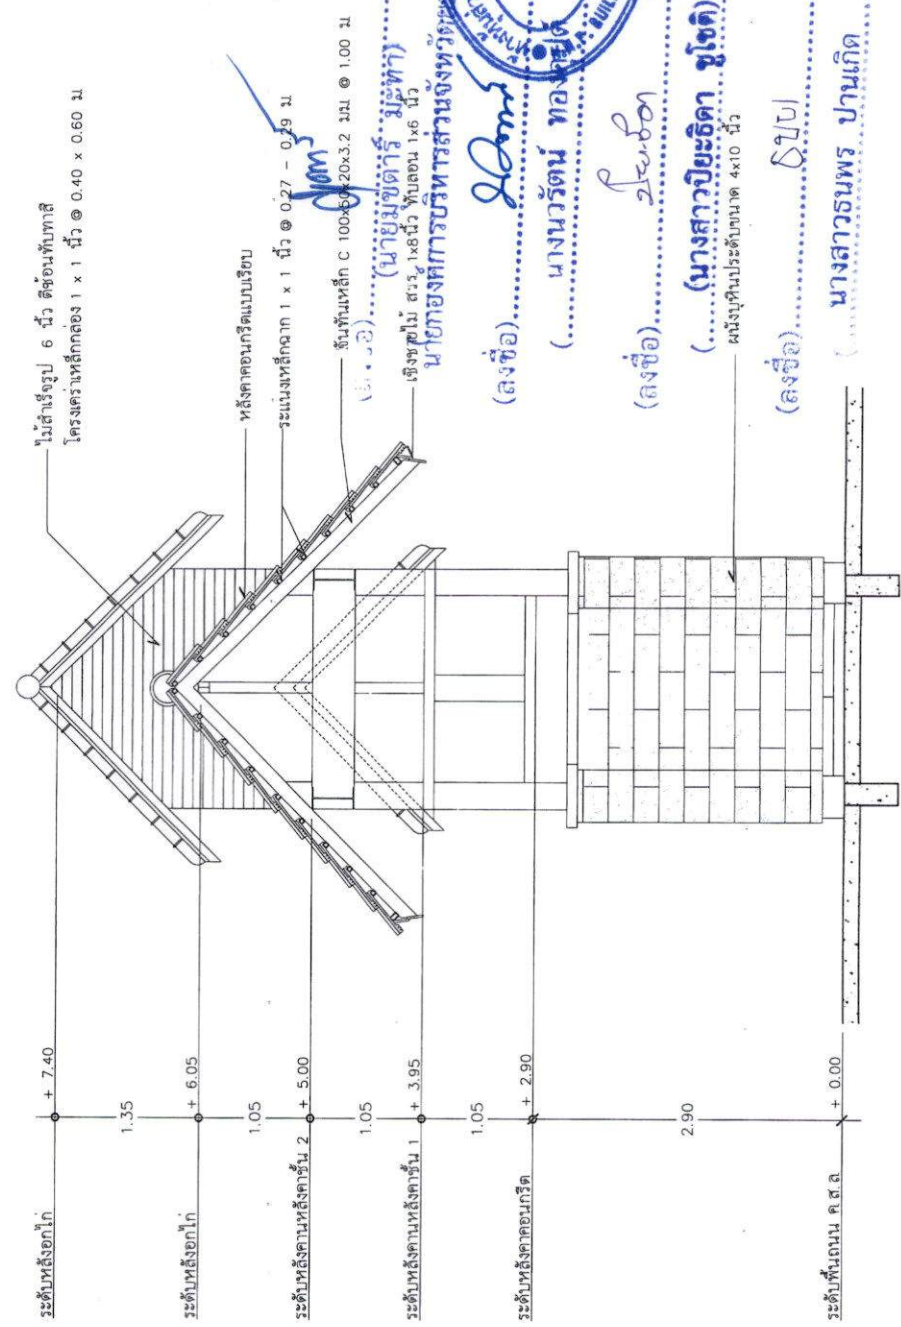

รูปตัด C
มาตราส่วน 1:50

[illegible]


ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
โครงการ ก่อสร้างรูกางเข้า โรงเรียนสหประชาประชาสรรค์	
แบบแสดง	
มาตราส่วน	
วันที่	
แผนที่ A-12	จำนวน/แผ่น 18
สำรวจ นายศักดิ์สิทธิ์ หะดีดีง นางสาวสุภาวชนิษฐาน นาย..... นายอดุลกร ตูย์ สุระยศวาสังวรวง	
เขียนแบบ นายอดุลกร หะดีดีงและ นายพรจิตรวิชญ์ธน	
ตรวจสอบ 	
ตรวจ	หัวหน้าฯ
พิจารณา	ส.ค.
เห็นชอบ	ผู้อำนวยการกองทาง
เปิดดำเนินการให้ทุกส่วนจังหวัดยะลา	
อนุมัติ	
ผู้บัญชาการบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
หมายเหตุ 1. รายละเอียด ที่กำหนดในแบบใช้ติดต่อ คำสั่งเป็นต้น 2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขแบบให้ออกไป ตลอดทั้งงานจะส่งมอบหมาย และคณะกรรมการ ตรวจสอบจึงจะออกคำสั่งเป็นต้นต่อไป	



✓

74


แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

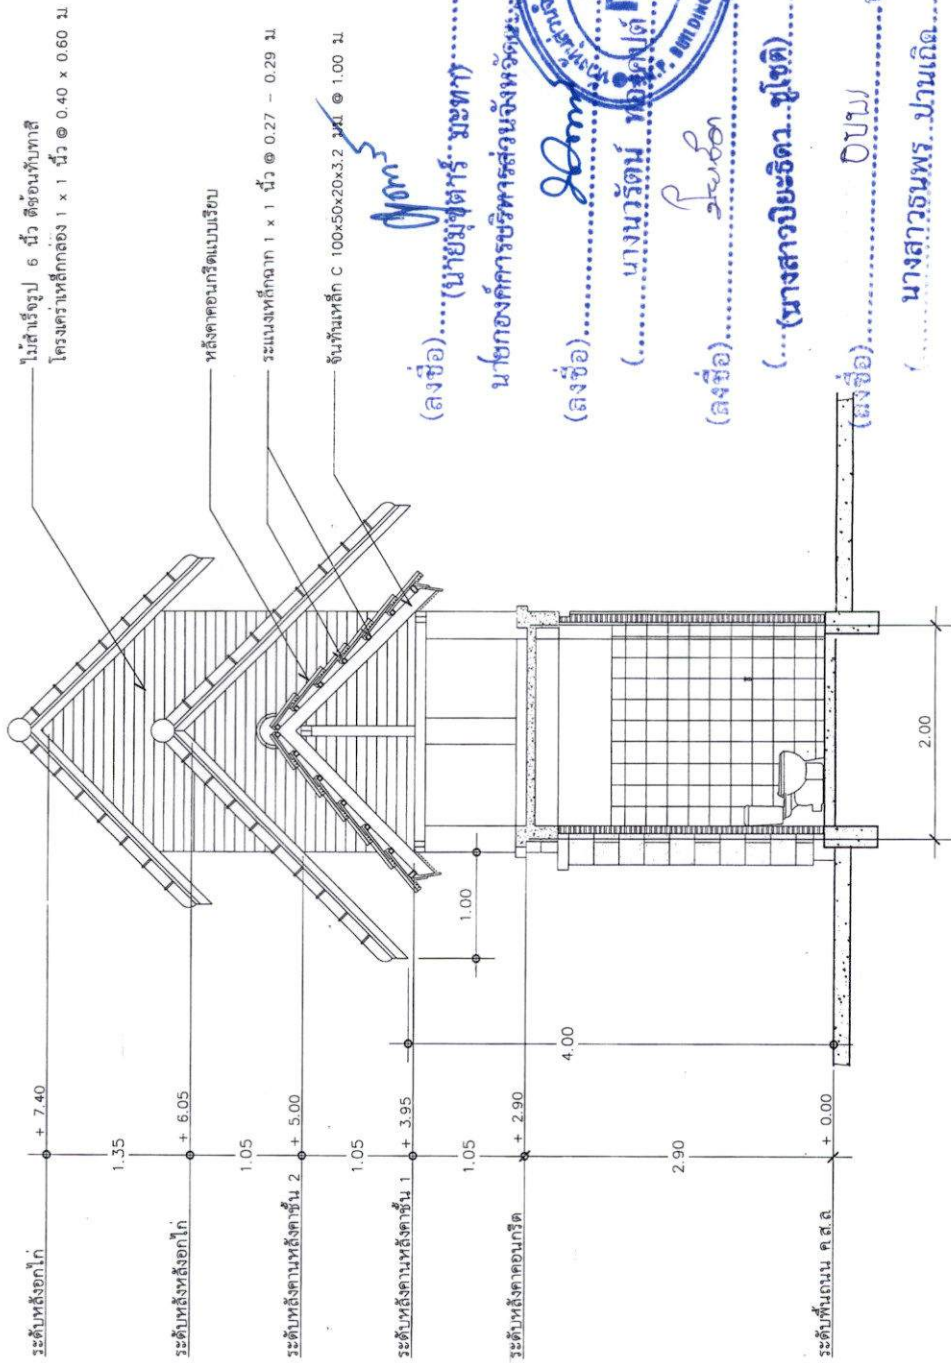

รูปตัด D
มาตราส่วน 1:50

[illegible]

	
ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
โครงการ ก่อสร้างท่าทางข้าม โรงเรียนวัดพระพรหมประชาสรรค์	
แบบแปลน	
มาตรฐาน	
วันที่	
แผ่นที่ A-13	จำนวน/แผ่น 18
สำรวจ	 นายสุทัศน์ ตู๋ สุวัชนราชสว่าง
เขียนแบบ	 นายเชษฐา หะลิละ นพพรพิทักษ์ นพคุณ
ตรวจสอบ	 นายทรงสิทธิ์ นพคุณ
ตรวจ	 หัวหน้าฝ่าย
พิจารณา	 ผู้อำนวยการกองช่าง
เป็นชอบ	
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
อนุมัติ	
หมายเหตุ	
1. เสร็จแล้ว ให้ยกส่งไปขอใบเปิดที่ดิน 2. หากกรณีที่ดินเป็นของเอกชนให้ดำเนินการ ขอใช้ประโยชน์จากที่ดินตาม ขั้นตอนการขอ อนุญาตจากราชการแล้วจึงเป็นต้น	




UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

BUREAU OF PLANT INDUSTRY


WASHINGTON, D. C.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE


① १५३७-१६८४-१७०२

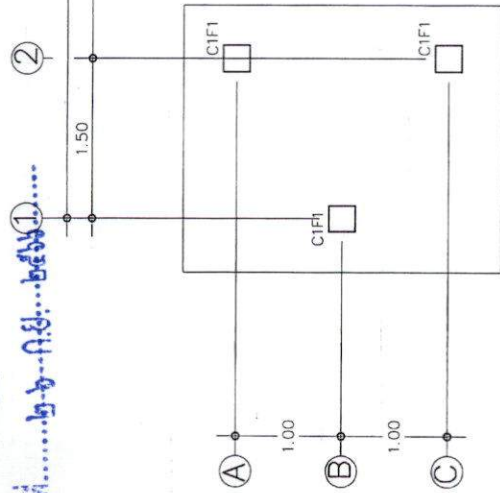


แปลนฐานราก, ตอม่อ

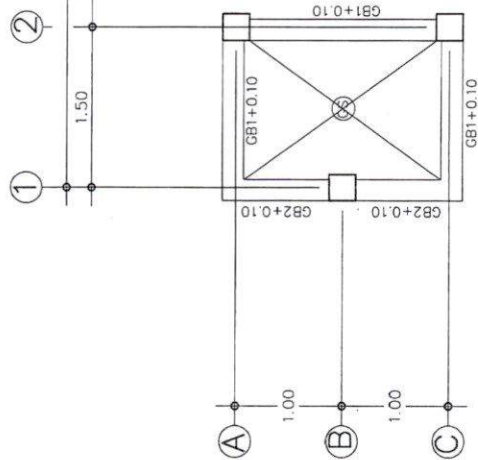

แปลนคานคอติน

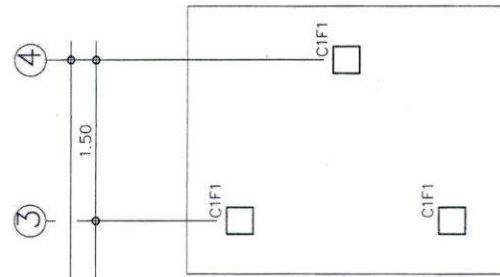

(ลงชื่อ) ด.ต.ว. ๓
(.....)
(.....) ๓ (นาย) ๔ (นาย) ๕
(.....) นายกองกลาง บวรวิทย์ นามวงศ์

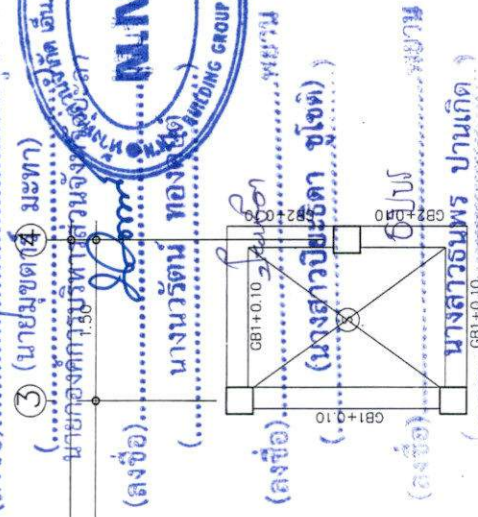

ผานการตรวจสอบแล้ว
กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา

.....สถาบัน
.....วิทยาลัย (ค. 1159)

๒ / โขงหินอ่อนเมืองจันทระ
เลขที่ตรวจพบ ๒๐ / ๘๒๒ จันท 2.0 ปี. 2566



ฝ่ายสำรวจ ออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

โครงการ
ก่อสร้างอุโมงค์เข้า
โรงเรียนสำหรับประชาชนที่
แบบแสดง

மேலும்

4m5

แผ่นที่	จำนวน/แผ่น
S-01	18

สำรวจ
นายสุวิมล หะยั้ง
นายสงฆ์ราชันยาภรณ์

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុំ ឃុនហ៊ាន

תעודת

นางจะอรุณ หะมิงและ

นายชวโรจน์นาถ

๑๕๑๑

พิจารณา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

อนันต์
ปัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผ. นายกองัดการบริหารส่วนจังหวัดพะล

หมายเหตุ

1. ระบอบเจ้าฟ้าทศบาลในสมัยรัชกาลที่ ๑

ตัวแรกเป็นเด็ก

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใน
ดังที่เพิ่งขอตัวกลับมา งาน หมายความว่า
ตรวจการงานส่วนนี้ว่าเป็นต้นตอ

✓



1:50

3000

2591

2020

---TACONOTI

ภาพการตรวจสอบแล้ว

การส่งงานวิชาการโยธาธิการ

[illegible]

10/10/19

1500 (1500)

[illegible]

Suburban Life Magazine

๒๐๖๖-๒๐๖๗

DATE: 11/17/2011

--	--

10

2

ଅନୁବିଧାନ

1:50

10

แปลนิโครงหลังคา



முடிவுரை

1:50

.....
 ৬৬৬৬ ৬৬৬৬ ৬৬৬৬
 ৬৬৬৬ ৬৬৬৬ ৬৬৬৬



Technical drawing of a wall section showing a window opening. The drawing includes dimensions: 1.45m for the wall height, 1.10m for the window height, and 0.35m for the window depth. Labels include 'C1F' for the wall, 'F1' for the window frame, 'D8' for the window depth, and 'BRUNSTENEN' for the window material. A scale bar at the bottom indicates 0.00m.



(...(นางสาวปฐะธิดา..สุโชติ)...)



0.20 m.#

.....สถานึก
.....วิทยาลัย (สว. 11590)

๑๖. วิชาความรู้และวิชาการโยธาธิการ

แบบขยายการเสริมเหล็กคาน, ฟน,ฐาน

Maths

1:25







1895

1895

1895

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐488/2566
๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

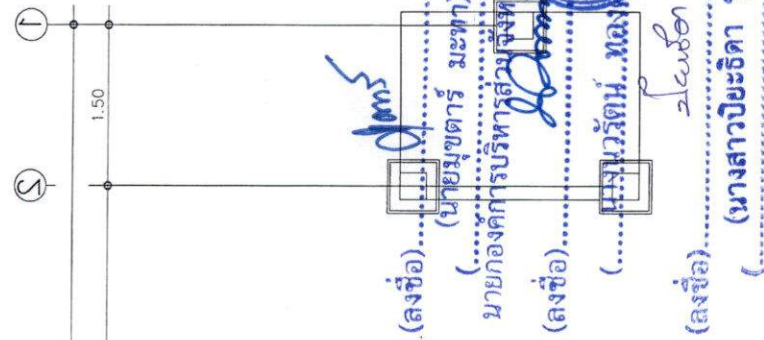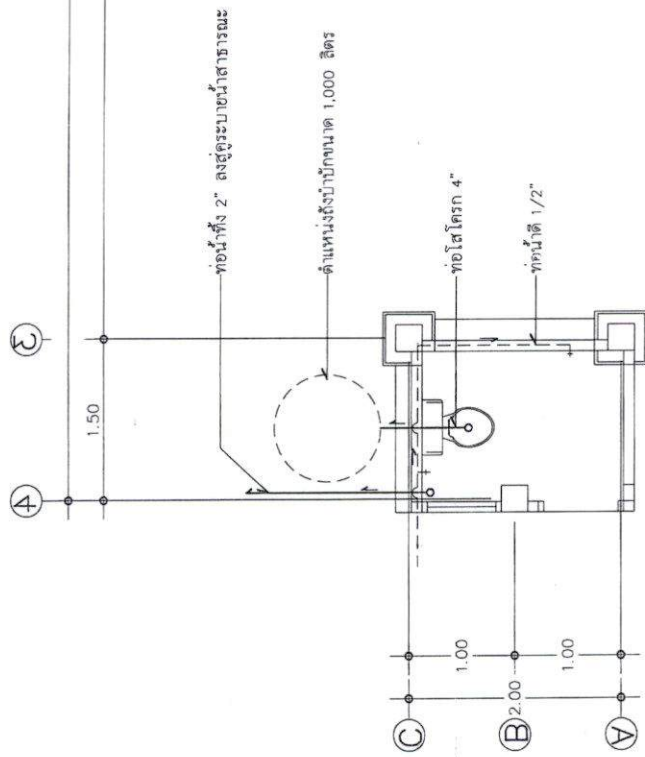

นางสาวนพร ปานเกิด

แปลนส่งขำภิบาล

มาตรา ๕๑

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะงานวิชาการและบริหาร
สำนักงานบริหารและผังเมืองจังหวัดยะลา

.....สถาบัน
.....วิศวกรรม (ค. 1590)

~~.....~~

เลขที่ตรวจพบ..... ๒ / ๒๕๖๖ วันที่ 2.0/มิ.ย./2566

		ฝ่ายร่าง ออกแบบ กองร่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
โครงการ		โรงเรียนเทศบาล	
โรงเรียนสาธิตอานันทราชนิกุล		แบบแสดง	
มาตราส่วน			
วันที่			
แผนที่	SAN-01	จำนวน/แผ่น	18
สำรวจ		นายสุทัศน์ หะมีดี นายวิชาญ วิชาญคุณ	
นายสุทัศน์ หะมีดี		นายวิชาญ วิชาญคุณ	
นายวิชาญ วิชาญคุณ		นายวิชาญ วิชาญคุณ	
ตรวจสอบ		นายวิชาญ วิชาญคุณ	
วิศวกร		นายวิชาญ วิชาญคุณ	
ตรวจ		นายวิชาญ วิชาญคุณ	
พิจารณา		นายวิชาญ วิชาญคุณ	
เห็นชอบ		นายวิชาญ วิชาญคุณ	
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		นายวิชาญ วิชาญคุณ	
อนุมัติ		นายวิชาญ วิชาญคุณ	
นายวิชาญ วิชาญคุณ		นายวิชาญ วิชาญคุณ	

..... ๔๔๘๙ ๖๖ ๔๔ ๔๔๔๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : งานโครงการก่อสร้างขุมทางเขาโรงเรียนลพพะยาประชาชนเคราะห์ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน : โครงการก่อสร้างศูนย์ทางเขา โรงเรียนลำพะยาประชาชนตระหงะ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับแจ้ง ทางหนังสือแจ้งจำกัด เ็น.เอ็น.พี. บิลดิ้งกรุ๊ป ที่อยู่ 254/1 ถนนสีริส ต่ำบสสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางนวิรัตน์ ทองคุปต์ โทร. 089-5977816
ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 27 กันยายน 2566 และระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 22 มิถุนายน 2567 รวมเป็นระยะเวลา 270 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้อีก 870,000.- บาท

ราคากลางคาบก่อสร้าง 851,876.62 บาท

วงเงินค่างอสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 840,000.- บาท

ผู้ควบคุมงาน

๑๖

1. นายเจษฎาชน หะยิเจและ นายชงโยธาชำนาญงาน

โทร: 0-7320-3625

2. นายอสมาน คุ้ม

พชวณายนางล้ำาจรจ

โทร. 0-7320-3625

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายณัฐนันท์ แก้วงาม

2. นายปรรณ อัจฉา

3. นายอสมิต ตาเละ

0211-7320-3625

นางสาวธนพร ปานเกิด
โรงเรียนสุภาพระยาภรณ์ประชาบาลเตตราษฎ์

โทร. 0-7320-3625

Ms.0-7320-3625

หมายเหตุ : ผู้รับแจ้งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผนป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแตেলাงนามในสัญญาจ้าง

ฝ่ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : งานโครงการก่อสร้างซ่อมทางเข้า โรงเรียนลำพะยาประชาชนเคราะห์ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน : โครงการก่อสร้างซ่อมทางเข้า โรงเรียนลำพะยาประชาชนเคราะห์ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
(ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

0.60 เมตร

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2566

วงเงินค่าก่อสร้าง : 840,000.- บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

วันเริ่มต้นประกันสัญญา :

วันสิ้นสุดการรับประกัน :

(ลงชื่อ).....

(นายมุขตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นางนวรรตน์ ทองคำ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....

นางสาวณพร ปานเกิด



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐458/2566
ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

ผนวก..... 2 หน้า 1 ถึง 3
จำนวน..... 3 (ฉบับ)

แบบใบเสนอราคา

ผนวก..... 2 หน้า 1

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก

1. ข้าพเจ้า...หอก.เอ็น.เอ็น.พี.บิลด์กรุป.../... อยู่เลขที่...254/1... หมู่ที่...ถนน สีโรธ...
ตำบล/แขวง...สะเตง... อำเภอ...เมืองยะลา... จังหวัด...ยะลา... โทรศัพท์...089-5977816...
โดย นางนวรรณ์ ทองอุปต์... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในรายละเอียดพัสดุ และการยื่น
ขอเสนอโดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ 2275/2566 ลงวันที่ 1 กันยายน 2566
โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างซ่อมทางเข้าโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์
ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในแบบท้ายใบเสนอราคานี้
เป็นเงินทั้งสิ้น...843,000...บาท (.....แปดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน.....)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน...55,149.53.../...บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา...180.../...วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือกและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือ
ระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วน
ถูกต้อง ภายใน...270.../...วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งกำหนดไว้ใน
หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา (ลงชื่อ).....นางนวรรณ์ ทองอุปต์.....

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญา
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูก นางสาวอริยา อธิธา ชูโชติ


(ลงชื่อ).....อน.....

นางสาวอริยา อธิธา

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



ลงวันที่..... ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

- 2 -

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกปรับหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบต่อ ความผิดพลาดหรือ ตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่...6.....เดือน...กันยายน พ.ศ.....2566.....

(ลงชื่อ).....

(นางนวรรตน์ ทองคุณ)

ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....

ประทับตรา (ถ้ามี).....

(นาย मुखตาร์ มะทา)

(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา)

(ลงชื่อ).....

(นางนวรรตน์ ทองคุณ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ปานเกิด)

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



Сектор безопасности

Сектор безопасности

วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

บันทึกการต่อรองราคา

การเสนอราคางานจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมทางเข้าโรงเรียนลำพะยาประชาชนนคราห์
ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ๒๒๗๕-๒๒๘๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมทางเข้าโรงเรียนลำพะยาประชาชนนคราห์ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๘๗๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๘๕๑,๘๗๖.๖๒ บาท จำนวน ๖ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และคณะกรรมการฯ ได้เปิดซอง ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| ๑. หจก. อาบาติโยธากิจ | เสนอราคา ๘๕๐,๐๐๐.- บาท |
| ๒. บจก. อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง | เสนอราคา ๘๔๕,๕๐๐.- บาท |
| ๓. หจก. เอ็น.เอ็น.พีบิลดิ้งกรุ๊ป | เสนอราคา ๘๔๓,๐๐๐.- บาท |

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคา ๒ ราย เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ขึ้นบัญชีรายชื่อกับสว. ส่วนบริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิเนียริง ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และทั้ง ๓ ราย เป็นผู้ที่ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด และไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยหจก. เอ็น.เอ็น.พีบิลดิ้งกรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๘๔๓,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคางบประมาณ และต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงได้ต่อรองราคาให้ทางฯ ลดวงเงินลงอีก ทางทางฯ ยินดีลดวงเงินให้อีก จำนวนเงิน ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๘๔๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคา ๑๘๐ วัน และส่งมอบงานภายใน ๒๗๐ วัน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางนรรัตน์ ทองคุปต์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุธัญญา สุขรมย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุญธิดา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายชายสิทธิ์ เขียวแก้ว)

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ถึงวันที่ ๒๖.๐๔.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ ก่อสร้างซ่อมทางเข้าโรงเรียนลำพะยา ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ็น.พี บิลดิ้งกรุ๊ป

งบประมาณ 870,000.00

ราคากลาง 851,876.62

ราคาที่ชนะ 840,000.00

ผลต่างจากราคากลาง 11,876.62

คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.3942

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดิน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	รวม		รวม		651,572.74		188,230.15	840,000.00	
	รวมเป็นเงิน				651,572.74		188,230.15	840,000.00	
1	งานโครงสร้าง								
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน	26.88	ลบ.ม.	-	-	227.32	6,110.24	6,110.24	
	- ทราบบดอัดแน่นรองได้ฐานรากและพื้น	0.80	ลบ.ม.	533.11	426.49	140.72 (ลงชื่อ)	112.58	539.06	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองได้ฐานราก	0.80	ลบ.ม.	2,148.67	1,718.94	576.41 (ลงชื่อ)	481.55 (นางสาวบุษรีดา ขูใจดี)	2,180.00	
	- ไม่แบบ	67.92	ตร.ม.	-	-	188.08	12,774.15	12,774.15	
	- ไม่ใช้ทำแบบ	54.34	ตร.ม.	554.76	30,145.53	-	-	30,145.53	
	- ไม่เคร่า	16.30	ลบ.ฟ.	554.76	9,042.55	-	-	9,042.55	
	- ตะปู	20.38	กก.	48.71	992.72	-	-	992.72	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc Cube	10.34	ลบ.ม.	3,768.29	38,964.14	566.94 (นางสาวบุษรีดา ขูใจดี)	44,826.25	44,826.25	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	186.00	ม.	85.24	15,855.24	142.07 (ลงชื่อ)	26,425.40	42,280.65	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต	-					นางสาวพร ปานเทต		
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.08	ตัน	35,014.67	2,801.17	5,953.50	476.28	3,277.45	




ที่	รายละเอียดงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- เหล็ก RB 9 มม.	0.03	ตัน	32,405.96	972.18	5,953.50	178.60	1,150.78	
	- เหล็ก RB 12 มม.	0.32	ตัน	27,624.22	8,839.75	4,871.04	1,558.73	10,398.48	
	- เหล็ก RB 16 มม.	0.42	ตัน	28,703.97	12,055.67	4,871.04	2,045.84	14,101.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	25.71	กก.	75.77	1,948.09	-	-	1,948.09	
	- Wiremesh ผิวย่อหุ้ม คก.4.0. มม. ตาราง 0.20*0.20 ม.	3.00	ตรม.	37.89	113.66	6.77	20.30	133.95	
2	งานโครงสร้าง								
	- ค่าแรงทำโครงสร้างหลังคา (ทรงจั่ว)	2,443.30	กก.	-	-	16.24	39,671.39	39,671.39	
	- เหล็กกล่อง 2"4"3.2 มม. นน.42 กก./ท่อน	126.00	กก.	42.20	5,317.47	-	-	5,317.47	3 ท่อน
	- เหล็กกล่อง 4"4"3.2 มม. นน.57 กก./ท่อน	114.00	กก.	34.71	3,956.50	-	-	3,956.50	2 ท่อน
	- เหล็ก C 100*50*20*3.2 มม นน. 26 กก./ท่อน	754.00	กก.	37.89	28,565.96	-	-	28,565.96	29 ท่อน
	- เหล็กฉาก 25*25*3 มม. นน.6.70 กก./ท่อน	261.00	กก.	40.39	10,541.54	-	-	10,541.54	39 ท่อน
	- WF 400*200*8*13 มม. 9 ม. 594กก/ท่อน	1,188.00	กก.	49.25	58,510.96	(ลงชื่อ)	-	58,510.96	2 ท่อน
	- หลังคาคอนกรีตแบบเรียบ (เพรศที่จ) หรือเทียบเท่า	781.00	แผ่น	44.89	35,062.82	9.84 (นายบุษกร 82.54 ทา)	42,745.36	42,745.36	
	- ครอบบันได	43.00	อัน	99.33	4,271.13	36.09	1,351.17	822.84	
	- ครอบบันได	92.00	อัน	99.33	9,138.24	(ลงชื่อ) 36.09	3,199.94	12,458.18	
	- ครอบบันไดปลายบันได	16.00	อัน	112.72	1,803.58	36.09	577.38	2,380.97	
	- ครอบบันได	6.00	อัน	132.86	797.15	(ลงชื่อ) 36.09	216.52	1,013.66	
	- เติงชายไม้ สร. 6" ทับ 8"	58.64	ม.	196.19	11,504.86	98.77 (นางสาวปัทมา ปุณต์)	5,792.10	17,296.96	
	- Drytech system	6.00	ชุด	2,271.80	13,630.80	-	617	13,630.80	
	- ค่าเคาน์	8.00	ชม.	-	-	2,029.60	16,236.81	16,236.81	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง								



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐458/2566
วันที่ ๒๖.๐๙.๒๕๖๖

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	40.00	ตร.ม.	376.10	15,043.94	127.19	5,087.53	20,131.48	
- ผนังฉาบปูนเรียบ	85.00	ตร.ม.	121.78	10,350.96	128.54	10,926.02	21,276.98	
- ผนังบุหินประดับขนาด 4*10 นิ้ว (สีระบุภายหลัง)	22.00	ตร.ม.	5,615.23	123,535.04	297.67	6,548.85	130,183.89	***
- บั้วรดเสา 4"	6.00	ม.	270.61	1,623.68	81.18	487.10	2,110.78	
- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ 6"	12.19	ตร.ม.	572.35	6,976.92	93.36	1,138.08	8,114.99	
- ผนัง Composite (สีระบุภายหลัง)	13.30	ตร.ม.	4,735.74	62,985.28	-	-	62,985.28	
- ผนังบุกระเบื้อง 8*10 นิ้ว	14.00	ตร.ม.	608.88	8,524.32	224.61	3,144.53	11,668.85	
งานพื้น				-		-		
- พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม	20.00	ตร.ม.	183.92	3,678.45	110.95	2,219.03	5,897.48	
- พื้นขัดมันเรียบ	8.00	ตร.ม.	-	-	54.12	432.98	432.98	
- พื้นบุกระเบื้อง 8*8 นิ้ว ชนิดหยาบ	3.00	ตร.ม.	541.23	1,623.68	213.78	641.35	2,265.03	
งานฝ้า	-			-				
- เพดานระแนง สร. 3" โครง Metal Stand. เว้นร่อง 1 ซม.	54.00	ตร.ม.	453.28	24,476.99	151.54	8,204.56	32,681.55	
งานประตูหน้าต่าง				-				
- ประตู 1	1.00	ชุด	5,479.92	5,479.92	419.45	176,451.45	181,931.37	
- หน้าต่าง 1	1.00	ชุด	4,735.74	4,735.74	-	-	4,735.74	
งานไฟฟ้า				-				
- สายเมนไฟฟ้า THW เบอร์ 1*10	100.00	ม.	56.69	5,669.35	21.65	2,164.91	7,834.26	
- โคมไฮเบย์ LED 12"	2.00	ชุด	2,435.52	4,871.04	405.92	162,374.84	167,245.88	รวมสายไฟ
- โคมดาวไลท์แบบติดลอย 6"	2.00	ชุด	947.15	1,894.29	405.92	162,374.84	1,896,669.13	รวมสายไฟ
- สวิตช์แบบมีฝาปิดกันน้ำ	1.00	ชุด	162.37	162.37	405.92	162,374.84	1,896,831.29	รวมสายไฟ
- สวิตช์ (รวมสายไฟ)	2.00	ชุด	270.61	541.23	405.92	162,374.84	1,897,747.07	รวมสายไฟ

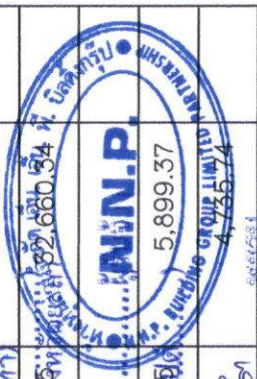

ที่ กส.ร.บ. ๒๖.๐๑.๒๕๖๖

ที่ กส.ร.บ. ๒๖.๐๑.๒๕๖๖	จำนวน	หน่วย	ตัววัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
5	งานสี			-		-		
	- งานสีรองพื้นสีน้ำมัน	95.00	ตร.ม.	5,141.66	51.42	4,884.57	10,026.23	
	- งานทาสีอะคริลิค	80.00	ตร.ม.	5,412.27	46.00	3,680.34	9,092.61	
6	งานอื่นๆ			-		-		
	- งานตัวหนังสือสังกะสีหนา 1" ทำสีดำ	1.00	งาน	33,826.68	-	-	33,826.68	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย 1,000 ลิตร	1.00	ชุด	4,735.74	1,353.07	1,353.07	6,185.91	***
	- เดินท่อน้ำดี 1/2"	15.00	ม.	21.65	40.59	608.88	933.62	
	- เดินท่อน้ำทิ้ง 2"	20.00	ม.	33.83	54.12	1,082.45	1,758.99	
	- เดินท่อไฮโดรกร 4"	4.00	ม.	251.67	(ลงชื่อ) 31	541.23	1,547.91	
	- โถงรับน้ำถึงถังพักน้ำ	1.00	ชุด	8,794.94	608.88	608.88	9,403.82	
	- ก๊อกน้ำ	2.00	ชุด	744.19	1,488.37	33.83 (ลงชื่อ)	1,556.03	
	- สายชำระพร้อม Stop Valve	1.00	ชุด	1,014.80	1,014.80	94.71	1,109.51	
	รวม			651,572.74		188,230.15	840,000.00	
	ตัวอักษร	(แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)					840,000.00	

หมายเหตุ

1. ปรับเพิ่มรายการผนังปูนประตึขนาด 4*10 นิ้ว (สีระบุ ภายหลัง) (100 บาท)
1. ปรับเพิ่มรายการถังบำบัดน้ำเสีย 1,000 ลิตร (97.11 บาท)

นางสาวธนพร ปานเกิด



ลงชื่อ (นางเนาวรัตน์ ทองคุปต์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ็น.พี บิลดิ้งกรุป

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐458/2561
ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

ผนวก.....4.....มีหน้า.....1.....ถึง.....1.....
จำนวน.....1.....(ฉบับ)

ผนวก.....4.....หน้า.....1.....

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน
งานจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมทางเข้า โรงเรียนลำพะยาประชาชนเคราะห์ ตำบลลำพะยา
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

กำหนดส่งมอบงานภายใน ๒๗๐ วัน และเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง เป็นจำนวน ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๓๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) จะจ่าย
ให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ตีผังวางแผนก่อสร้าง
- ขุดหลุมฐานราก เทฐานราก
- หล่อเสา ค.ส.ล.
- หล่อคานคอดิน
- หล่อคานหลังคาและติดตั้งคานหลังคา
- เทพื้นคอนกรีต

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๐๔,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน) จะจ่าย
ให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ก่ออิฐฉัง
- ฉาบปูนผนัง
- ติดตั้งโครงหลังคาและมุงหลังคา
- ติดตั้งประตู หน้าต่าง
- ทาสีอาคาร
- งานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมุขตาร์ มะทา)

(นางองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางนวรรณ์ ทองคป)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูชาติ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ฉบับที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าโรงเรียนลำพะยาประชาชนเคราะห์ 5

ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ฉบับ.....5.....หน้า.....1.....

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑. การปรับราคาค่าก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๓/๒๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมเมเจอร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รื้อ เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ).....

(นาง นวรัตน์ ทองคุด)

(ลงชื่อ).....

(นางสาว นิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาว รณพร ปานเกิด)

ผู้ว่าจ้าง





ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖

จำนวน.....³.....(ฉบับ)

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม..... 6พ.พ. 7

วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

นางสาวธนพร บานเกิด

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นายสมิทธิวัฒน์ ไชยเมสสี วุฒิ วิศวกรโยธา
สาขา โยธา ดังสำเนาใบประกาศ หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคาร ๖ ชั้น
เลขที่ ๑๐๐ ถนนสาย ๑๐๖ ตำบล ๑๐๖ อำเภอ ๑๐๖ จังหวัด ๑๐๖
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ เค.เค.เค. เอ็นจิเนียริ่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
เค.เค.เค. เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) สมิทธิวัฒน์ ไชยเมสสี
(นายสมิทธิวัฒน์ ไชยเมสสี)
ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) [Signature]
(นายสมิทธิวัฒน์ ไชยเมสสี)
ผู้เสนอราคา

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ เค.เค.เค. เอ็นจิเนียริ่ง

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) [Signature]
(นายสมิทธิวัฒน์ ไชยเมสสี)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ) [Signature]

(นางนารัตน์ ทอ...)

(ลงชื่อ) [Signature] พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชู...)

(ลงชื่อ) [Signature] พยาน

(นางสาวฉันทพร ปานเกิด)





เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑๕๘/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๖.๐๙.๒๕๖๖

ผนวก.....๖.....หน้า.....๓.....



จาก 7 ผนวก



(ลงชื่อ)..... (นาย मुखดาร์ มะทา)

(ลงชื่อ).....

(นางนวลรัตน์ ทองคุณ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ
ԵՐԱՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ
ԵՐԱՅՈՒՆ

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ).....นางนรินทร์ ทองคุปต์

(นางสาวปิยะธิดา ขุโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ขุโชติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)





МОНАСТЫР

МОНАСТЫР

1

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ)
(นาย मुखตาร์ มะทา) ผู้ว่าฯ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ)
นางนารัตน์ ทองคป

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวธนพร ปานเกิด)



ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้วัสดุทั้งโครงการ
รายการวัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ
มูลค่าวัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าวัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
- ☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ลงชื่อ)..... (นาย मुखตาร์ มะทา).....
- เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....

(นางนวรรตน์ ทองคุปต์)

ลงชื่อ..... (ประธานกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวธนพร ปานเกิด)



7



RECEIVED

APR 10 1964

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE


การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้
แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ).....
(นายมุขตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ลงชื่อ).....
(นางนรรัตน์ ทองคำ)
(ลงชื่อ).....
(นางสาวปิยะธิดา ชูเขต)



(ลงชื่อ).....
(นางสาวธนพร ปานเกิด)



UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

WASHINGTON, D.C.

OFFICE OF THE SECRETARY

WASHINGTON, D.C.

1918

8. ทัก 2


১৩০ ৬৬৬

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

แผนการทำงาน							
1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานวิวิหก					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รายการ...	ตร.ม.				
				รวม		0%

Money	
Acc Money	
% PLAN	
% ACC PLAN	
% ACTUAL	
% ACC ACTUAL	
% ACC DIFF	
% PLAN/2	
% PLAN/2 DIFF	

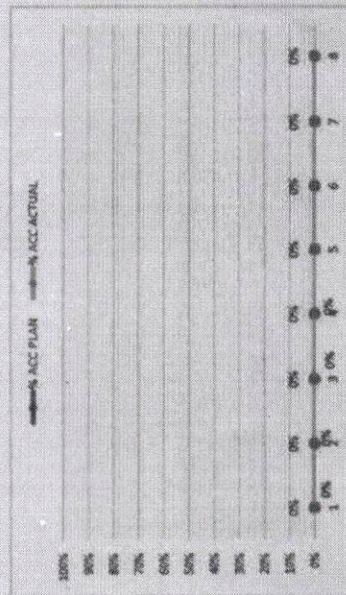[illegible]

- | | | |
|----|--------------|--|
| 1) | กรณีตัวอย่าง | กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนค่าเป็นบาทถึงสัญญา จำนวน 8 เดือน |
| 2) | | หมายถึง ระยะเวลากการก่อสร้างตามแผนค่าเป็นบาทของแผนโครงการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างสิ่งพิมพ์ กำหนดร่างพิมพ์ |
| 3) | % | หมายถึง ร้อยละของงานที่มีผู้รับเข้าเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแผนโครงการก่อสร้าง ซึ่ง |
| 4) | Money | มูลค่าตามแผนโครงการ ค่าเงินจากร้อยละตามแผนงานใช้กับมูลค่าตามแผนโครงการ |
| 5) | % PLAN | ร้อยละของแผนค่าเป็นบาท ค่าเงินจากมูลค่าของตามแผนค่าเป็นบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานที่โครงการ |

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 00458/2566
 ลงวันที่ ๒๖.๐๙.๒๕๖๖


ผนวก.....8.....หน้า 4
 สิ่งส่งมาด้วย ๔

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินงาน การมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานโครงสร้างเสริม	ส.บ.ล.	100	5,000	500,000	16%
		ส.บ.ล.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉาบ	พ.บ.ล.	400	2,000	800,000	26%
		พ.บ.ล.	300	5,000	1,500,000	49%
				รวม	3,040,000	100%

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$

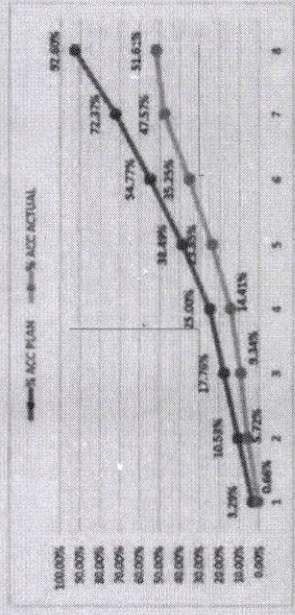

- 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบค่าเป็นเงินถึงสัญญา จำนวน 8 เดือน
- 2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบค่าเป็นเงินของแผนผังรายการก่อสร้าง เช่น งานโครงสร้างเสริม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างอื่น ๆ)
- 3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้จ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแนบค่าเป็นเงินของแผนผังรายการก่อสร้าง (แต่รายการก่อสร้างอื่น ๆ รวมกัน 100 %)
- 4) บุคลากรและรายการ ค่าจ้างจากร้อยละตามแนบค่าเป็นเงินเกี่ยวกับบุคลากรและรายการ
- 5) บุคลากรและรายการ ค่าจ้างจากร้อยละตามแนบค่าเป็นเงินเกี่ยวกับบุคลากรและรายการ
- 6) ร้อยละของแผนผังเป็นงาน ค่าจ้างจากร้อยละตามแนบค่าเป็นเงินเกี่ยวกับบุคลากรและรายการ
- 7) ร้อยละของแผนผังเป็นงาน ค่าจ้างจากร้อยละตามแนบค่าเป็นเงินเกี่ยวกับบุคลากรและรายการ
- 8) ร้อยละของแผนผังเป็นงาน ค่าจ้างจากร้อยละตามแนบค่าเป็นเงินเกี่ยวกับบุคลากรและรายการ
- 9) ร้อยละของแผนผังเป็นงาน ค่าจ้างจากร้อยละตามแนบค่าเป็นเงินเกี่ยวกับบุคลากรและรายการ
- 10) ร้อยละของแผนผังเป็นงาน ค่าจ้างจากร้อยละตามแนบค่าเป็นเงินเกี่ยวกับบุคลากรและรายการ

เดือนที่ 1		เดือนที่ 2		เดือนที่ 3		เดือนที่ 4		เดือนที่ 5		เดือนที่ 6		เดือนที่ 7		เดือนที่ 8	
สค	พค	พค	พค	พค	พค	พค	พค	พค	พค	พค	พค	พค	พค	พค	พค
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
100,000	100,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000	615,000	615,000	615,000	615,000
100,000	100,000	320,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
3.29%	3.29%	7.24%	7.24%	17.76%	25.00%	38.49%	54.77%	61.49%	61.49%	61.49%	61.49%	61.49%	61.49%	61.49%	61.49%
0.66%	0.66%	5.07%	5.07%	9.41%	14.41%	23.85%	35.25%	47.57%	51.61%	51.61%	51.61%	51.61%	51.61%	51.61%	51.61%
2.63%	2.63%	4.80%	8.42%	8.42%	8.42%	8.42%	8.42%	8.42%	8.42%	8.42%	8.42%	8.42%	8.42%	8.42%	8.42%



(ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวปิยะธิดา ขุซิด)
 (นางสาวชนพร ปานเกิด)
 (นางสาวชนพร ปานเกิด)

Abstracting

[illegible]

1994

$$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\%$$

Concentration of Initiator (C_i) / mol/l	R_p / %/min at 25°C	R_p / %/min at 30°C
0.00	0.00	0.00
0.01	0.01	0.02
0.02	0.02	0.03
0.03	0.03	0.04
0.04	0.04	0.05

(স্বাধীন).

(...นายमुखตาร์ มะฆา)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

(ਸ਼ਾਬੀਕ)

M.V.P.

2

25.00

.....

(... (นางสาวปฤษฎา ชูเขต))

2

1179 (B2, B3)

นางสาวธนพร ปานเกิด

.....

100
