

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔๓๘ /๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง สะเตง อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตามหนังสือมอบ อำนาจลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ เอฟ.แอล.การก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๖ ตำบล/แขวง บันนังสาด อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดยนางกลือซง เจ๊ะมะสาแล ผู้มีอำนาจลง นามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ยล ๐๐๐๗๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีก ฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบทางรถไฟ บ้านอาตะควอ หมู่ที่ ๓ ตำบลกอตโต๊ะ - บ้านบาลาสมิแล หมู่ที่ ๕ ตำบลกาเยาะอาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๖๑๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบบจ.ที่กำหนด) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการ งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา + บันทึกการต่อรองราคา	จำนวน	๓	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน	๔	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดแบ่งงวดงาน	จำนวน	๑	หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	๒	หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดหนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพ	จำนวน	๗	หน้า
ควบคุมงาน + หนังสือรับรองช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง			
๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดแบบป้าย + แบบแปลน	จำนวน	๑๖	หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง	จำนวน	๓	หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางกลือซง เจ๊ะมะสาแล)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในการทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่ ๑๐๐๐๕๕๕๖๓๖๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๙๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๕๖,๔๔๘.๖๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ จำนวน ๒ งวด ตามรายละเอียดภาคผนวก ๓ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๙,๒๔๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนน คสล.สายเสียบทางรถไฟ บ้านอาตะคูว หมู่ที่ ๓ ตำบลกอตอตีระ-บ้านบาลาสมิแล หมู่ที่ ๕ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....
(นายระเด่น สมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางกลีสง เจริญสาแล)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๕๓๐,๗๕๒.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขข้อนี้เกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นายระเด่น สมะแอ)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

(นางกลีสง เจริญสกุล)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไปแล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันเร็วหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางกลีสง เจ๊ะมะसानะ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงาน แต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุ ให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาท เลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง งานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่า จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับ จ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคง ต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่า เสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

(นางกลีสง เจ๊ะมะสังแล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน



ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และเมื่ออำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(นางกลีสง เจ๊ะมะฮะแม)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๙,๘๐๐.๐๐ - บาท (เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

(นางกลือซง เจ๊ะมัสแล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หุ้นส่วนผู้จัดการ



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การลดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ก่อสร้าง

๒๒.๒ โยธา

(ลงชื่อ).....(นายระเด่น สมะพะ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางกล่อซง เจ๊ะมะสาแล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะมะเย)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางกลีสง เจ๊ะมะสะแล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุญธิรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100055456369

วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนปราชญ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางสาวกคินี ศรีพงษ์ และ นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ้ว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.แอล.การก่อสร้าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายเลียบทางรถไฟ บ้านอาตะควอ หมู่ที่ 3 ตำบลกอดดือรี - บ้านบาลาสมิแล หมู่ที่ 5 ตำบลยายบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 438/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 196,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 196,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวกคินี ศรีพงษ์)

1907

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวศิริลักษณ์ หมดพิบูรณ์)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ้ว) 2226

พยาน

(นายธนพัฒน์ ทองอยู่)

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (ง) สาขาที่ยกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-24340847 : -

EFF_C_1_NN_PLUS

ที่ ยล. 000755



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953553000122

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.แอล.การก่อสร้าง/

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางกลีซง เจ๊ะมะสาแล

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

800,000.00 บาท

2. นางสาวพาติน เจ๊ะมะสาแล

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

200,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางกลีซง เจ๊ะมะสาแล/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 44 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....

(นางกลีซง เจ๊ะมะสาแล)

(.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....)

(ลงชื่อ).....

ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ).....

นางสาวภาวิณี ทองเทก

(นางมุสลิห์ จ้ายเจริญ)

(นางกลีซง เจ๊ะมะสาแล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

นายทะเบียน

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 9501 00343 31 3
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล **นาง กลือซง เจ๊ะมะสาแล**
Name **Mrs. Kluesong**
Last name **Cheamasalae**
เกิดวันที่ **2 ส.ค. 2510**
Date of Birth **2 Aug. 1967**
ศาสนา **อิสลาม**

ที่อยู่ **28 หมู่ที่ 6 ต.บ้านโงสาเรง**
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
16 ส.ค. 2564
วันออกบัตร
18 Aug. 2021 (นายณาคณ จงจิระ)
Date of Issue เจ้าพนักงานออกบัตร

1 ส.ค. 2573
วันหมดอายุ
1 Aug. 2030
Date of Expiry

9508-03-08180929

(นายระเด่น สะมะแอ) บัญชี 10.8-05-2563
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ) **นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา**
(นางกลือซง เจ๊ะมะสาแล)
หุ้นส่วนผู้จัดการ
(ลงชื่อ) **นางบุณยิรา วรรณพัฒน์**
(ลงชื่อ) **นางสาวภาวิณี ทองเหล็ก**

ME3-1480818-23



สำเนาถูกต้อง

(นางกลือซง เจ๊ะมะสาแล)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๗๕๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบางทางรถไฟ บ้านอาตะควอ หมู่ที่ ๓ ตำบลกอตตือรี - บ้านบาลาสมิแล หมู่ที่ ๕ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบางทางรถไฟ บ้านอาตะควอ หมู่ที่ ๓ ตำบลกอตตือรี - บ้านบาลาสมิแล หมู่ที่ ๕ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นายสรพรเพชญ์ กุลวิจิตร

ประธานกรรมการฯ

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒. นางยุพาวรรณ บุญอินทร์

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

๓. นายอามัน ตาละ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสมบุรณ์ แสนพงษ์

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายชูโฮมี ชุมชุมพันธ์

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

๓. นายหัสตินทร์ หะยีเต็ง

กรรมการ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณีสืบกลาง ส่วนที่ ๒๒ ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/
ว.๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง
กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายอัมมิ ยานี

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. นายอสมิต ตาละ

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเฉลิมพล เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ X38/2565 ผนวก..... มีหน้า..... ถึง.....
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2565 แบบใบเสนอราคา จำนวน..... ฉบับ

เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก ผนวก..... หน้า.....

1. ข้าพเจ้า หจก.เอฟ.แอล.การก่อสร้าง อยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ 6 ถนน -
ตำบล/แขวง บ้านวังสาแหร อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา โทรศัพท์ 080-1376432
โดย นางกลีสง เจ๊ะมะสาแล ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในรายละเอียดพัสดุ และการยื่น
ข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือเชิญร่วมเสนอราคา ที่ ยล.51004/1436 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบทางรถไฟ บ้านอาตะควอ หมู่ที่ 3
ตำบลกอตอตีระ -บ้านบาลาสมิแล หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว
922.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,610 ตารางเมตร (ตามแบบบอจ.ที่กำหนด)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข แบบรูป ที่กำหนดในเงื่อนไขเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ตามราคาค่างที่ได้ระบุไว้ในแบบท้ายใบเสนอราคานี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 3,930,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 257,102.80 บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันเปิดซองโดยวิธีคัดเลือกและองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้
ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญาและจะส่งมอบงานตามเอกสารโดยวิธีคัดเลือกโดยครบถ้วน
ถูกต้อง ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดไว้ใน
หนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา
(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ของเอกสารโดยวิธีคัดเลือก ให้แก่
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา" ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญา
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
(ลงชื่อ)..... พยาน

.....ประธานกรรมการ (นางบุณธิดา วรรณพัฒน์)
.....กรรมการ (ลงชื่อ)..... พยาน
.....กรรมการ (นางสาวภาวณีย์ หิองเทร็ด)
(.....)

/หากข้าพเจ้า...

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกปรับค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบต่อ ความผิดพลาดหรือ ตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ).....

(นางกลีสง เจ๊ะมะสะแล)

ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(กรรมการบริหารส่วนจังหวัดยะลา)

(กรรมการบริหารส่วนจังหวัดยะลา)

(ลงชื่อ).....พยาน
นางบุญธรา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวภาวณี ทองเทศ

(.....)

การเสนองานโครงการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงทางรถไฟ บ้านอาตะควอ หมู่ที่ ๓ ตำบลก้อตือระ-
บ้านบาลาสมิแล หมู่ที่ ๕ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามหนังสือเชิญและรายละเอียดพัสดุฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๔/๑๔๓๕-๑๔๓๙ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคางานโครงการก่อสร้างถนน
สายเลี่ยงทางรถไฟ บ้านอาตะควอ หมู่ที่ ๓ ตำบลก้อตือระ-บ้านบาลาสมิแล หมู่ที่ ๕ ตำบลกายูบอเกาะ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๓,๙๕๐,๐๐๐.- บาท ราคาากลางของทางราชการ
๔,๐๑๙,๙๒๐.๘๗ บาท จำนวน ๕ ราย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ถึง ๑๒.๐๐ น. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลา
ดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย

๑. หจก. เอฟ.แอล.การก่อสร้าง

เสนอราคา ๓,๙๓๐,๐๐๐.- บาท

๒. หจก. วิหนึ่ง เอ็นจิเนียริง

เสนอราคา ๓,๙๔๗,๕๐๐.- บาท

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๒ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย หจก. เอฟ.แอล.การก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำสุด เป็นเงิน ๓,๙๓๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงิน
งบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
จึงได้ต่อรองราคาให้ทางฯ ลดวงเงินลงอีก ทางทางฯ ยินดีลดวงเงินให้อีก จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือวงเงิน ๓,๙๒๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคา ๑๘๐ วัน และส่งมอบงาน
ภายใน ๑๘๐ วัน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... (นางกสิทอง เจ๊ะมะส่วนแล) ผู้ต่อรองราคา
(นายระเด่น สะมะแอ) (นางกสิทอง เจ๊ะมะส่วนแล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ)..... (นางกสิทอง เจ๊ะมะส่วนแล) ประธานกรรมการ
(นางกสิทอง เจ๊ะมะส่วนแล) (นายสรพรเพชญ์ กุลวิจิตร)
(.....) (นางยุพาพรรณ บุญอินทร์)
(ลงชื่อ)..... (นางยุพาพรรณ บุญอินทร์) กรรมการ
(นางยุพาพรรณ บุญอินทร์)
(ลงชื่อ)..... (นางยุพาพรรณ บุญอินทร์) กรรมการ
(นางยุพาพรรณ บุญอินทร์)
(นางสาวภาวณี ทองเทศ) (นางยุพาพรรณ บุญอินทร์) กรรมการ
(นางสาวภาวณี ทองเทศ) (นางยุพาพรรณ บุญอินทร์) กรรมการ
(นางสาวภาวณี ทองเทศ) (นางยุพาพรรณ บุญอินทร์) กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 438/2565
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2565

ผนวก..... 2 มีหน้า..... 1 ถึง..... 4
จำนวน..... 4 ฉบับ

1/4

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ผนวก..... 5 หน้า..... 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบริมทางรถไฟ บ้านอาตะควว หมู่ที่ 3 ตำบลกอตตือรี - บ้านบาลาสมิแล หมู่ที่ 5

ตำบลกายูบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง สายเลียบริมทางรถไฟ บ้านอาตะควว หมู่ที่ 3 ตำบลกอตตือรี - บ้านบาลาสมิแล หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนวณราคาโดย หจก.เอฟ.แอล.การก่อสร้าง

ลำดับที่ ตาม สัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ) รองนายก อบจ.ยะลา (ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (นางกลือซง เจ๊ะมะสาเล) (ลงชื่อ)..... นางบุษรา วรรณพัฒน์ (.....) (ลงชื่อ)..... นางสาวภาวิณี ทองเทด (.....)	รวม (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....)
	1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)					
	1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ					
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,844.00	2.57	4,739.08	
	1.1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)			0.00	0:00	
2	1.1.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,955.00	47.59	93,038.45	
	1.1.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)			0.00	0.00	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 438/2565
ลงวันที่ 25.12.2565.....

ผนวก..... 2หน้า..... 2

2/4

ลำดับที่ ตาม สัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
3	1.1.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	141.000	206.15	29,067.15	
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)					
	1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)					
4	1.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	982.800	279.42	274,613.98	
	1.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)					
5	1.2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	230.500	728.95	168,022.98	

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นางกลือซง เจ๊ะมะดะแล)
(.....) หัวหน้าผู้จัดการ
(ลงชื่อ).....พยาน
นางบุณธรา วรรณพัฒน์
(.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวภาวิณี ทองเทศ
(.....)



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 438/2565
ลงวันที่ 25 ส.ค. 2565

ผนวก..... 2 หน้า 3

3/4

ลำดับที่ ตาม สัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)					
6	1.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,610.000	662.54	3,054,309.40	
7	1.3.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	445.000	234.07	104,161.15	
8	1.3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	922.000	106.32	98,027.04	
	1.4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)					
9	1.4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	32.000	1,538.68	49,237.76	
10	1.4.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	10.000	4,010.86	40,108.60	

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางกลือซง เจ๊ะมะฮะแม)
หุ้นส่วนผู้จัดการ
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบุณรีรา วรรณพัฒน์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภาวิณี วัฒนผล)

ลงวันที่..... ๒.๕.๖๖..... ๒๕๖๖.....

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน..... จำนวน..... ฉบับ

งานก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบริมทางรถไฟ บ้านอาตะควอ หมู่ที่ ๓ ตำบลกอดตือตือระ-บ้านบาลาสมิแล
หมู่ที่ ๕ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

..... ผนวก..... 3 หน้า..... 1

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๙,๒๔๘.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบ บาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
- งานวางป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)
- งานตัดดินคันทาง
- งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก
- งานดินถมคันทาง
- งานรองพื้นทางลูกรัง
- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ปริมาณงาน ๗๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint)
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๙๐ วัน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๓๐,๓๕๒.- บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint) แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของงาน และงานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของโครงการ

แล้วเสร็จเรียบร้อย

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๙๐ วัน

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแอ)
(ลงชื่อ)..... (นางกลีสง เจ๊ะมะแอ)
(ลงชื่อ)..... (นางบุญธิรา วรรณพัฒน์)
(ลงชื่อ)..... (นางสาวภาวิณี ทองเพ็ช)
(ลงชื่อ)..... (นางสาวภาวิณี ทองเพ็ช)

ลงวันที่..... ๒.๕.๖๖..... ๒๕๖๖.....

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

จำนวน..... ฉบับ

งานก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบริมทางรถไฟ บ้านอาตะควอ หมู่ที่ ๓ ตำบลกอดตือตือระ-บ้านบาลาสมิแล
หมู่ที่ ๕ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

..... ผนวก..... 3 หน้า.....

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๙,๒๔๘.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบ บาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
- งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)
- งานตัดดินคันทาง
- งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก
- งานดินถมคันทาง
- งานรองพื้นทางลูกรัง
- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ปริมาณงาน ๗๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint)
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๙๐ วัน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๓๐,๓๕๒.- บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint) แล้วเสร็จ
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint) แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของงาน และงานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของโครงการ

แล้วเสร็จเรียบร้อย

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๙๐ วัน

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ)
(ลงชื่อ)..... (นางกลีสง เจ๊ะมะเต๊ะ)
(ลงชื่อ)..... (นางบุญธิรา วรรณพัฒน์)
(ลงชื่อ)..... (นางสาวภาวิณี ทองเพ็ช)
(ลงชื่อ)..... (นางสาวภาวิณี ทองเพ็ช)

1. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด
ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือ
บวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

2. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบด
อัดดิน การขุด ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล
ปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติ
ของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้ได้
มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED
BASE และ SHOULDE

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

2.2 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบ ด้วย
ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL
BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

2.3 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก
(MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

(นางกสิณ ชะมะแอ) (นางกสิณ ชะมะแอ)

(นางกสิณ ชะมะแอ) (นางกสิณ ชะมะแอ)

(นางกสิณ ชะมะแอ) (นางกสิณ ชะมะแอ)

(นางกสิณ ชะมะแอ) (นางกสิณ ชะมะแอ)

(นางกสิณ ชะมะแอ) (นางกสิณ ชะมะแอ)

(นางกสิณ ชะมะแอ) (นางกสิณ ชะมะแอ)

(นางกสิณ ชะมะแอ) (นางกสิณ ชะมะแอ)

(นางกสิณ ชะมะแอ) (นางกสิณ ชะมะแอ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 438/206
ลงวันที่ 25 ส.ค. 2565 -2-

ผนวก.....หน้า 2

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

- K = ESCALATION FACTOR
- It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นางกลีสง เจ๊ะมะสะเล)
.....
(ลงชื่อ).....
นางบุณธิรา วรรณพัฒน์
(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวภาวิณี ทองเทศ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....

ลงวันที่ 25 ต.ค. 2565

ผนวก 5 มีหน้า 1 ถึง 7

หนังสือรับรอง

จำนวน 7 ฉบับ

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ผนวก 5 หน้า 1

เขียนที่ 58/49 หมู่ 3 ต. สะพานหิน

วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย อัมมธนา เงินเอ อายุ 39 ปี
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 58/49 หมู่ที่ 3 ถนน -
ตรอก/ซอย - ตำบล สะพานหิน อำเภอ เมือง จังหวัด จ. พะเยา
หมายเลขโทรศัพท์ 0887913675 สถานที่ทำงาน -
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาววิศ/ภค สาขา วิศวกรรมโยธา
แขนง - ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ภม. 48696
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้า
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด ถนน คสล.
จำนวน 1 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ,
แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....วิศวกร

(นาย อัมมธนา เงินเอ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/ห้าง.

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(นางกลีสง เจริญสถาน)

(ลงชื่อ) นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นางกลีสง เจริญสถาน)

(ลงชื่อ).....พยาน

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(น.ส. กอฉิน วันทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุญธรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางอัมมธนา เงินเอ)

(.....)

คำเตือน

1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรีบแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 438/2561
25 ส.ค. 2565
ลงวันที่.....

ผนวก..... 5 หน้า 2



ให้ใช้แทนการลงนามในสัญญาจ้าง
หน้า 3 ต. กอตาบูรี
หน้า 5 ต. มุมมอเร




(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเหล็ก)

(นายอัมมตาน เจ๊ะนัว)

ผนวก.....หน้า.....



9. ^น สหกรณ์ อวน กว
^น สหกรณ์ อวน กว 3
 สหกรณ์ อวน กว 3
 ส. สหกรณ์ อวน กว 3 (ลงชื่อ)
 รองนายก

๗ (ลงชื่อ).....(นายประเด็น สมะแอ).....ผู้ว่าจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....(นางกลีสง..เจ้าพระยาเส..))

(ลงชื่อ).....นางบุณยิรา วรรณพัฒน์.....

(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวภาวิณี ทองเทศ
(.....)

(นางกลีสง เจริญสวัสดิ์)
 หัวหน้าผู้จัดการ

สำเนาถูกต้อง

(นายอัมตาน เจ๊ะแว)

438/2561
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2565

5 หน้า 4
ผนวก.....

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

สาขา ช่างไฟฟ้า นาย อัมตลสิทธิ์ กั๊ว 117 วุฒิ ม.ศ. มค. โยมคหวิทย์พงษ์นี้
ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โรงเรือน ปลูก ส้มเขียวหวาน/ฟ
บ้านเลขที่ 30 หมู่ 3 ตำบลหนองเสือ - บ้านนาหลวงสีละ หมู่ 5 ตำบลหนองเสือ (ต่อจาก) บ้านนาหลวงสีละ
ให้กับ บริษัท/ห้างฯ ทจก. 10 พ. 108. มร. กอ. 108 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนการก่อสร้างเสร็จ บ้านนาหลวงสีละ
ถูกต้องตามแบบแปลน และ รายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้ บริษัท/ห้างฯ
ทจก. 10 พ. 108. มร. กอ. 108 เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ) อัมตลสิทธิ์
(นาย อัมตลสิทธิ์ กั๊ว 117)
ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) [Signature]
(นางกลีสง เจ๊ะมะสาแล)
ผู้แทนผู้จัดการ

ผู้จัดการ บริษัท/ห้างฯ 10 พ. 108. มร. กอ. 108

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นางกลีสง เจ๊ะมะสาแล)
ผู้แทนผู้จัดการ
(ลงชื่อ) [Signature] พยาน
(นางบุญธิรา วรรณพัฒน์)
([Signature])
(ลงชื่อ) [Signature] พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเท)

เข้าศึกษาเมื่อ 19 พฤษภาคม 2557

ชื่อการค้า นางรอมิยะ ปุณณ

ผลการเรียน 76 หน่วยการเรียน/ 20

สำเร็จการศึกษาเมื่อ 28 มีนาคม 2560



รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิตติ	ผล การเรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิตติ	ผล การเรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิตติ	ผล การเรียน (2)	(1) x (2)
3106-0002	วิชาการศึกษาศาสตร์ 2557 ภาคเรียนที่ 1	2	3	6.0	3121-2001	การทดสอบวัสดุ	2	2	4.0	3121-2005	การสำรวจเส้นทาง	3	2.5	7.5
3106-0003	เทคนิคก่อสร้าง	2	3.5	7.0	3121-2008	การประมาณราคางานโยธา	2	3.5	7.0	3121-2101	งานโยธา	3	3.5	10.5
3106-0005	ปฏิบัติงานก่อสร้าง	2	3	6.0	3121-2109	ระบบสุขาภิบาล	2	2.5	5.0	3121-2114	การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง	2	3.5	7.0
3106-0006	ประมาณราคาก่อสร้าง	2	2	4.0	3000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 6	ค.			3121-2110	ปฏิบัติงานโยธา I	4	3.5	14.0
3106-0007	เขียนแบบก่อสร้าง	2	3	6.0	3000-1301	ชีวิตและวัฒนธรรมไทย	1	3	3.0	3000-2003	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7	ค.		
3106-0008	การสำรวจ	2	3	6.0	3100-0107	ความแข็งแรงของวัสดุ	3	3	9.0	3000-1101	ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ	3	2	6.0
3121-2007	เทคนิคก่อสร้างงานโยธา	3	3	9.0	3121-2002	ทฤษฎีโครงสร้าง	3	2.5	7.5	3000-1425	วิทยาศาสตร์ 6	3	4	12.0
3121-2105	กฎหมายก่อสร้าง	2	2.5	5.0	3121-2003	คณิตศาสตร์ 1	2	2	4.0	3000-1601	ห้องสมุดกับการบริการสารสนเทศ	1	4	4.0
3000-2001	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5	ค.			3000-1202	ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษา-	2	2.5	5.0	3106-2201	การอ่านแบบและประมาณราคา	2	4	8.0
3000-0201	โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ	3	4	12.0	3000-1304	การเมืองการปกครองของไทย	2	3.5	7.0	3121-2010	การออกแบบโครงสร้างไม้แฉะเหล็ก	3	2	6.0
3000-1201	ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ	2	2.5	5.0	3000-1521	คณิตศาสตร์ 2	3	3	9.0	3121-2102	การเขียนแบบโยธา	3	3	9.0
3100-0101	กลศาสตร์วิศวกรรม 1	3	2.5	7.5	3121-2004	ปฐพีกลศาสตร์	3	3	9.0	3121-2104	เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง	2	3	6.0
3106-0001	กลศาสตร์โครงสร้าง	2	2.5	5.0						3121-2108	การควบคุมงานและการตรวจงาน	2	3	6.0
										3000-2004	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 8	ค.		
										3000-1225	ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ	1	3	3.0
										3000-1525	แคลคูลัส I	3	3	9.0
										3000-1606	มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน	2	2.5	5.0
										3121-2009	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	3	1.5	4.5
										3121-2011	การเขียนแบบโยธาคด้วยคอมพิวเตอร์	2	2	4.0
										3121-2012	การบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง	3	2	6.0
										3000-1610	การคิดอย่างเป็นระบบ	1	3.5	3.5

สรุปผลการเรียน	ภาคเรียน								
	1/2557	2/2557	3/2558	4/2558	5/2559	6/2559			
หน่วยกิตที่ได้ในภาค	17	25	22	23	17	9			
หน่วยกิตสะสม	17	42	64	87	104	113			
ระดับคะแนนเฉลี่ยในภาค	2.88	2.78	3.13	3.08	2.29	2.77			
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	2.88	2.82	2.92	2.97	2.86	2.85			

3. ระดับคะแนนเฉลี่ยคะแนนไม่น้อยกว่า 2.00

ดำเนินเอกสารนี้เมื่อหัวหน้าสถานศึกษาลงนาม
ประทับตรารับรองแล้วถือว่าเป็นเอกสารรับรองผล

นายกองคำการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

บันทึก

*** หมายถึง โอนผลการเรียน

*** หมายถึง เขียนประวัติระดับชั้น

*** หมายถึง เขียนใบความรู้ระดับชั้น

**** หมายถึง ฝึกงาน

ลงนาม

รับรองผล

นางบุญศิริ รุ่งวัฒน

หัวหน้างานทะเบียน

วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

นางสาวภาวิณี ทองเท

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

หุ้นส่วนผู้จัดการ

[illegible]

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 438/2561

ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2565

ผนวก 5 หน้า 6

๑/ส่วน ๕ โครงการฯ คสช. สายสีชมพูฯ ๒/ส่วน ๕๒๐๐ หมู่ ๖
ตำบล กอทองไร่ - บ้านป่าละเมาะ หมู่ ๕ ต.กอบมณ อ.เมืองมโน...



วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายอับดุลเลาะ เจ๊ะแต

ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม (ลงชื่อ) สาขาวิชา โยธา

(นายระเด่น สะมะแอ)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางกลีสง เจ๊ะมะแล)

ขอให้ความช่วยเหลือจากท่าน

ผู้รับจ้าง

หัวหน้างานทะเบียน



นางบุณธรี วรรณพจน์

ผู้อำนวยการสถาบัน

(ลงชื่อ) นางสาวภาวณี ทองเทศ



(นางกลีสง เจ๊ะมะแล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

คำ/เคยก้อง

อัมฤตแก้ว

(โฮงอัมฤตแก้ว ๒๖/๓๙)

ผนวก.....หน้า.....



๕๒/๑๙/๓๖๕

(ସଫଳତା: $n = 100$)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

๒. ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้รับแจ้ง

(นางกลี๋อซง เจ๊ะมะลาแล)

(.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

นางบุญธิรา วรรณพัฒน์

(ลงชื่อ).....พยาน

นางสาวภาวีนี ทองเทค

(.....)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 438/2061 ป้ายประชาสัมพันธ์
23 ส.ค. 2565 2.40 เมตร 6 มีหน้า 1 ถึง 16
ลงวันที่..... ฉบับ.....ฉบับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบริมทางรถไฟ บ้านอาตะควอ หมู่ที่ 3 ตำบลกอตตือรี๊ะ - บ้านบาลาสมิแล หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 922.00 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
4,610.00 ตารางเมตร (ตามแบบบจ.ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.แอล การก่อสร้าง ที่อยู่ 28 หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสาด อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดย นางกลือซง เจ๊ะมะสะแล โทร.

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 26 สิงหาคม 2565 และระยะเวลายสิ้นสุดสัญญา 21 กุมภาพันธ์ 2566 รวมเป็นระยะเวลา 180 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ 3,950,000.- บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 4,019,920.87 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 3,920,000.- บาท

ผู้ควบคุมงาน

1.นายอัสมี ยาบิ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

2.นายอสมิล ตาเละ นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.0-7320-3625

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายสมบุรณ์ เสนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร.0-7320-3625

2. นายซูไฮมี ชุมชุมพันธ์ นายช่างโยธาอาวุโส โทร.0-7320-3625

3. นายหัสตินทร์ ทะยี้เต็ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน โทร. 0-7320-3625

“ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน ”

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่.....
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2565

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

ผนวก.....หน้า.....

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : งานก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบางทางรถไฟ บ้านอาตะควอ หมู่ที่ 3 ตำบลกอตตืออ๊ะ - บ้านบาลาสมีแล หมู่ที่ 5

ตำบลกาญบ่อเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 922.00 เมตร หาด 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

4,610.00 ตารางเมตร (ตามแบบอบจ.ที่กำหนด)

0.60 เมตร

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2565

วงเงินค่าก่อสร้าง : 3,920,000.- บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินอุดหนุนทั่วไป

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี

วันเริ่มต้นประกันสัญญา : (ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

วันสิ้นสุดการรับประกันของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางกลีสง เจ๊ะมะฮาล) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าผู้จัดการ

(นางสุนิรา วรรณพัฒน์) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทก) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทก) พยาน

(นางสาวภาวิณี ทองเทก) พยาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 438/2565
ลงวันที่ 25 ส.ค. 2565

ผนวก..... 6 หน้า 3



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (นางกลีสง เจ๊ะมะกุล) ผู้รับจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบทางรถไฟ บ้านอาตะควอ หมู่ที่ 3 ตำบลกอตตือรี๊ะ - บ้านบาลาลัมมีแล หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ที่ STA. 0+000 - 0+922

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ) พยาน

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 922.00 เมตร

รวมความยาว 0.922 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ / กองช่าง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
สายบ้านอาตะควอ หมู่ที่ 3 ตำบลกอตตือรี๊ะ - บ้านบาลาลัมมีแล หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

คำนำ

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 26 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงท้องถิ่น ได้ให้อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ดำเนินการกำหนด มาตรฐานและลักษณะของทางและงานทาง ประกอบแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขึ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ได้กำหนดภารกิจให้กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษา แนะนำทางวิชาการ ทั้งได้กำหนดพันธกิจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม และขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐานงานทาง เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยให้จัดทำมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับงานทางและข้อกำหนดทางวิชาการ เป็นแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีการรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานและนำแบบมาตรฐานมาประยุกต์โดยคำนึงและให้ความสำคัญของแบบ เงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมตรงกับสภาพงานก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะ อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบทางรถไฟ บ้านอาตะลูอ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองค้อ - บ้านบาลมิ่งเม หมู่ที่ 5 ตำบลเขาบูบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 922.00 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,910.00 ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ

รายการทั่วไป

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่าง ๆ ให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดี ของงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ
 - แจ้งขอเข้าปฏิบัติงาน
 - ส่งแผนการปฏิบัติงาน
 - ส่งขออนุญาตผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
 - ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด วัสดุ และ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 3 ที่ ก. (กวก) 0405.2/ว. 845 ลว. 31 ธ.ค. 2564

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการ
- วัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติ ให้ป้าวัสดุดังกล่าวมาใช้ในการก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งนี้
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้าง ด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
- ค่าระดับและพิกัดฐานตามแบบที่กำหนด (บม.) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
- เส้นทางขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
- งานตัดดิน ฝัง งานตัดดิน , งานตัดหิน , งานตัดหินแข็งและงานตัดอื่น ๆ
- จุดจบลงวัสดุทั้งเครื่องและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
- ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- มาตรฐานงานก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานช่างของกรมทางหลวงชนบท (มทช.) เฉพาะในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดให้ใช้
- ที่จัดตั้งดินและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน
- สำหรับงานปูโกล้าง ๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขุดถอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น
- ท่อ คล. ให้ใช้เส้นความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีกาตัดใช้ในการก่อสร้าง
- ให้แสงดินเดิม และ/หรือ ร่องน้ำเดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำผ่านท่อได้โดยสะดวก
- จำนวนท่อในแต่ละแนว สำหรับงานวางท่อแต่ละระดับทางป้าเข้า - ออก อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสามารถระบายน้ำได้ดี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๕38/2566
ลงวันที่ 25 ต.ค. 2565

ลารบัญญัติ

ผนวก 6 หน้า 4

รายการแบบ	แบบเลขที่	แผ่นที่
ใบปะหน้า		1
คำนำ, วัตถุประสงค์, ลารบัญญัติและรายการทั่วไป		2
แผนที่สังเขป		3
รูปตัดแฉ่งโครงร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคลุมดมบติวัด		4
แบบแปลนแฉ่งการเสริมเหล็กถนน คล.ล.		5
รูปตัดตามยาว / รูปตัดตามขวาง		6 - 12
บัญชีรายการ/บัญชีราคาส่ง		7 - 8

- ค่าแห่งก่อสร้างที่ตลอดหลั้ม เครื่องหมายจราจร จารงระบายน้ำ และบ่อพักอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ค่าแห่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการปรับแต่งตามข้อ 14, 15 และ 16 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณของครวมทั้งสิ้นของแต่ละรายการน้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
- รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือข้อกำหนดไว้ชัดเจนหรือแสดงไว้ชัดเจนกัน หรือมีปัญหามากในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามมติของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องหามาตรการในการป้องกัน (Safety) อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าอันตรายนั้นจะมีลักษณะเป็นอันตรายต่อคนงานหรือทรัพย์สิน สาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมัดที่เกี่ยวข้อง มาตราการป้องกันการป้องกันอุบัติเหตุผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง ซึ่งกำหนดไว้ในแบบหรือข้อกำหนดไว้ชัดเจน หรือมีปัญหามากในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามมติของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟจราจรในที่ทำการก่อสร้างตามแบบที่กำหนด
- มีติดงา มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากการระบุอย่างอื่นไว้ในแบบ
- ในการนี้ผู้จ้างและผู้รับจ้างจะพิจารณาถึงความปลอดภัย (SKEW ANGLE) ของแนวท่อลอดที่ตัด ท่อลอดดมบ, ทางระบายน้ำ จากแบบก่อสร้าง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
- ถ้าบริเวณก่อสร้าง มีอาคารระบายน้ำเดิมอยู่ ผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อถอนออกและย้ายไปตั้งในที่ที่เหมาะสมหรือปรับพื้นที่งานก่อสร้าง

หมายเหตุ

- พัสดุประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้
- วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 - เหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็ก
- ที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วัน
- นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เส้นทางสาย สายเลียบทางรถไฟ บ้านอาตะลูอ - บ้านบาลมิ่งเม	สำรวจ สำรวจ ออกแบบ	นายสุเมธ ภูมิ นายชินัน ชัย นายอติส คำและ	เห็นชอบ
แบบแปลน สารบัญญัติ	เขียนแบบ เขียนแบบ ตรวจ	นายนิศร ใจ นายอานัน คำและ นายสุโธม ภูมิ นายสมฤทธิ์ เสนพงศ์	ปัดเล็การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อนุมัติ
แบบเลขที่ สป.ยช แก้ไขที่	แผ่นที่ 2 ท.ฝ่ายสำรวจออกแบบ ท.ฝ่ายออกแบบก่อสร้าง	นายสุวัตร ใจ นายสุโธม ภูมิ นายสมฤทธิ์ เสนพงศ์	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

N 06.49227, E 101.40285

ลงวันที่ 25 ส.ค. 2565.....

N06.48875, E 101.41031



ลักษณะ

- | | |
|---|---|
|  | ทางหลวงแผ่นดิน(กรมทางหลวง) |
|  | ทางโครงการฯ ที่จะทำการก่อสร้าง (กรมทางหลวงชนบท) |
|  | แม่น้ำ, ลำคลอง |
|  | หนองน้ำ, ห้วย |
|  | หมู่บ้าน |
|  | วัด, สำนัก, โรงเรียน |
|  | ที่ตั้ง จังหวัด, อำเภอ |



(ลงชื่อ).....นายกองการบริวารส่วนตัวจังหวัดยะลา.....ผู้รับจัด

(.....) **ผู้อำนวยการ**

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางบุญธิรา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ)..... กมล  แผนกส่งเสริมสุขภาพ

(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

แผนทล้งเขบ

พยาน




องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

1. ต้นทาง/สาขา สายนิคมเกาะต๋อง บ้านหาดทรายขาว - บ้านนาสามัคคี		สำรวจ		นายอุดม นู้น	เห็นชอบ	
		สำรวจ		นายชิน ชาติ		
		ออกแบบ		นายสมคิด คำละ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
แบบแสดง		เขียนแบบ		นายนิศุล พิระฐ		
แผนที่ผังเขต		เขียนแบบ		นายอนุทิน คำละ		
		ตรวจ		นายสุวัฒน์ วรรณพันธ์	อนุมัติ	
แบบแสดง อบ.ต.	แผ่นที่ 3	ทนายฝ่ายสำรวจออกแบบ		นายสมนุสรณ์ แสนพงษ์	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
เจ้าหน้าที่จะ		ทนายฝ่ายการก่อสร้าง		นายสมนุสรณ์ แสนพงษ์		

ด้านทางสาย สายเคเบิลทางรถไฟ ไร้อาเขตควบคุม - บ้านนาสามัคคี	สำรวจ		นายคุณาน นุ่น	เห็นชอบ 
	สำรวจ		นายธีรชัย ยิป	
	ออกแบบ		นายสมิธ ตาละ	
แบบแสดง แบบแปลนแสดงการเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เขียนแบบ		นายนิศุล พิเศษ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อนุมัติ 
	เขียนแบบ		นายอินัน ตาละ	
	ตรวจ		นายสุกัญญา ทรัพย์	
			นายสมานันต์ แสนพงษ์	
แบบแสดง ๒๖๔ ๒๖๕	แผ่นที่ 5	นายประธานวงออกแบบ		
แก้ไขครั้งที่		ทุกชิ้นก่อนการลงร่าง		
			นายสมานันต์ แสนพงษ์	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๔๓๘/๒๕๖๑
 ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๑

จุดต่อเนื่อง กม.ที่ ๐+500

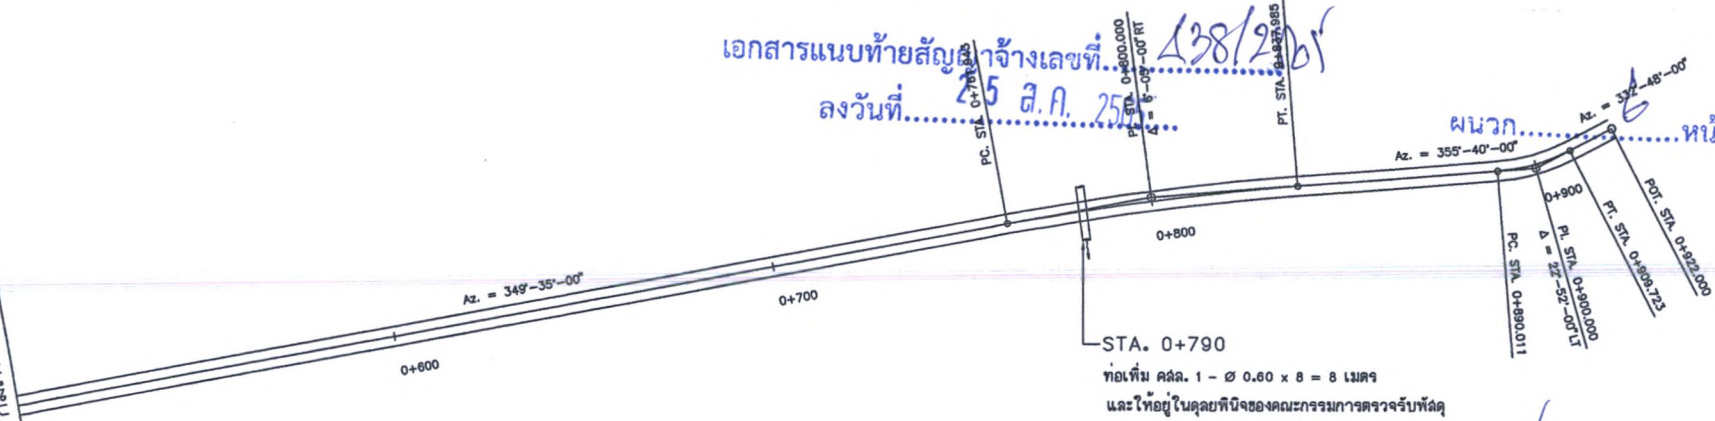

STA. 0+790
 ท่อเพิ่ม คล. 1 - Ø 0.60 x 8 = 8 เมตร
 และให้อยู่ในคูขยที่บึงของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางกลีสง เชื้อมะลิ) หัวหน้างาน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้างาน

(นางสาววิภา วัฒนพัฒน์) หัวหน้างาน

(นางสาววิภา วัฒนพัฒน์) หัวหน้างาน

(นางสาววิภา วัฒนพัฒน์) หัวหน้างาน

(นางสาววิภา วัฒนพัฒน์) หัวหน้างาน

(นางสาววิภา วัฒนพัฒน์) หัวหน้างาน

(นางสาววิภา วัฒนพัฒน์) หัวหน้างาน


(นางสาววิภา วัฒนพัฒน์) หัวหน้างาน

(นางสาววิภา วัฒนพัฒน์) หัวหน้างาน


(นางสาววิภา วัฒนพัฒน์) หัวหน้างาน

(นางสาววิภา วัฒนพัฒน์) หัวหน้างาน


(นางสาววิภา วัฒนพัฒน์) หัวหน้างาน

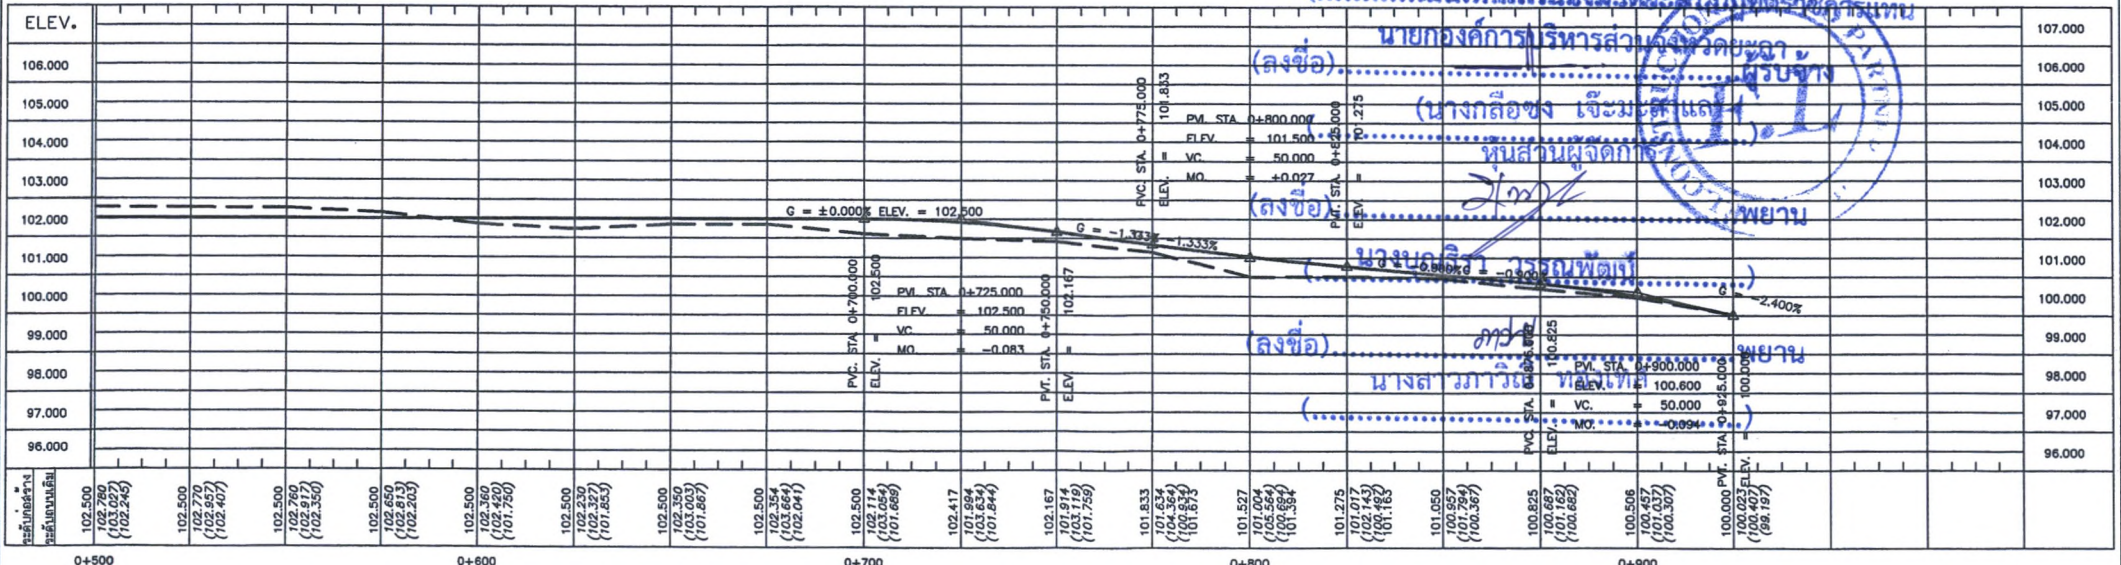


- หมายเหตุ
- จำนวนท่อในแต่ละแนวและตำแหน่งในการวางท่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ขอยกเว้นท่อเดิม
 - ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และบ่อพักอาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
 - เขตทาง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
 - งานตัด ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหิน, งานตัดหินแข็ง และงานตัดอื่นๆ




องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
เส้นทางสาย	สำรวจ	นายสุมน ภูมิ	เห็นชอบ
สายเคเบิลทางรถไฟ	สำรวจ	นายธีร ชัย	
โบราณวัตถุ - โบราณสถาน	ออกแบบ	นายอภินันท์ ศาและ	
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายวิศรุต ใจสูง	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แปลนและระดับตามยาว	เขียนแบบ	นายชานัน ศาและ	อนุมัติ
Sta. 0+500 - 0+922	ตรวจ	นายสุวัฒน์ ธรรมกันย์	
แบบตัดหน้า ข.ย.ย	หน้า 7	นายสมานันท์ ศาและ	
แก้ไขครั้งที่	หน้า 7	นายสมานันท์ ศาและ	

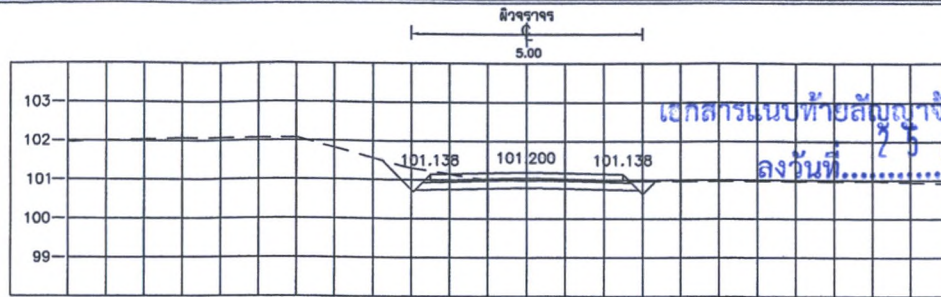


ST. 0+100.000
NGL = 100.990




ST. 0+075.000
NGL = 100.500



ST. 0+050.000
NGL = 100.200




ST. 0+025.000
NGL = 99.870



ST. 0+000.000
NGL = 99.902

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 138/2165
ลงวันที่ 25 ต.ค. 2565


ผนวก.....หน้า 6 10

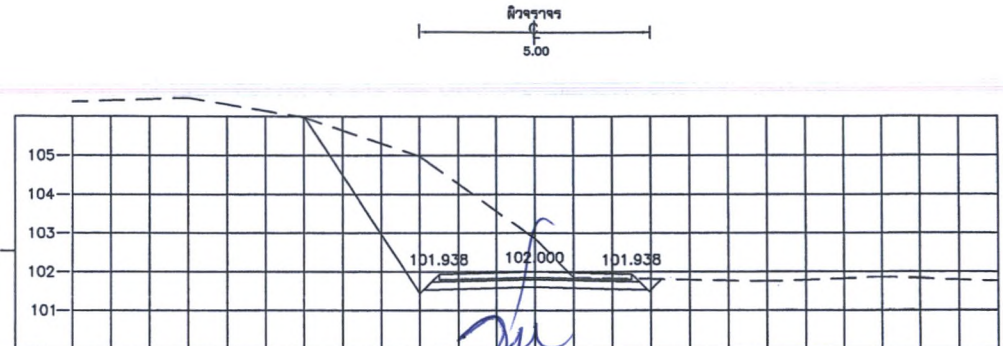

ST. 0+175.000
NGL = 102.857




ST. 0+150.000
NGL = 101.777




ST. 0+125.000
NGL = 101.577


(ลงชื่อ)..... (นายประเสริฐ) สาระมณี
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ).....
(นางกลุ่).....
หุ้นส่วนผู้จัดการ
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางบุณธรา วรณพัฒน์)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวภาวณี พงษ์เหล็ก)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เดินทางสาย	สำรวจ	นายอุดมมาน คุ้ม	เห็นชอบ	
สายเคเบิลทางรถไฟ	สำรวจ	นายชัย ชัย		
โบราณคดีทางรถไฟ - โบราณคดี	ออกแบบ	นายอสิณ คาคะ		
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายนิศกุล เตชะ	บันทึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
รูปตัดตามขวาง	เขียนแบบ	นายอานัน คาคะ	อนุมัติ	
Sta. 0+000 - 0+175	ตรวจ	นายสุวัฒน์ รุ่งแก้ว		
แบบแสดง ชบ.ย.ย	แผ่นที่ 8	นายสมบุญ เสงฆ์		
แก้ไขครั้งที่	แก้ไขครั้งที่	นายสมบุญ เสงฆ์	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	




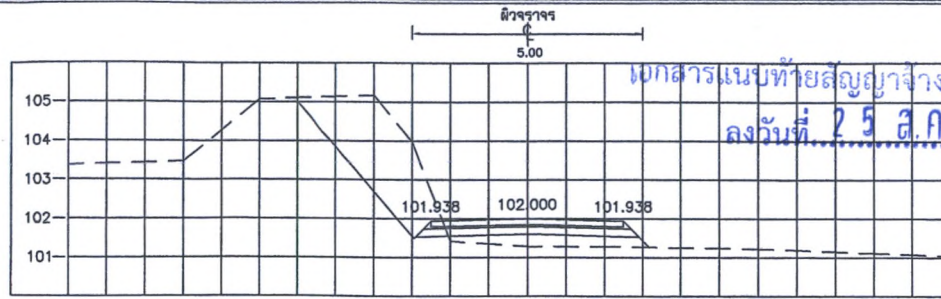


STA. 0+275.000
NGL = 101.287




STA. 0+250.000
NGL = 101.237

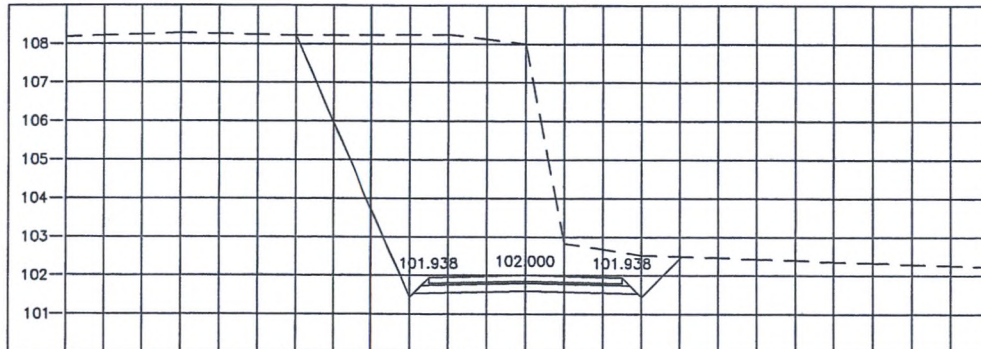


STA. 0+225.000
NGL = 108.000

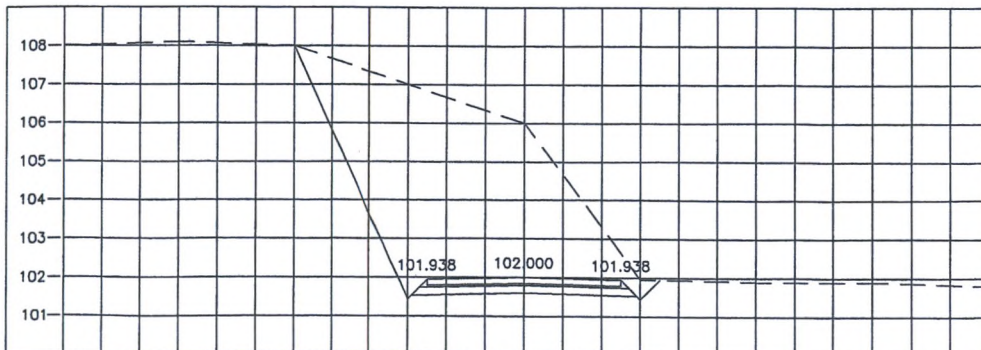


STA. 0+200.000
NGL = 106.000

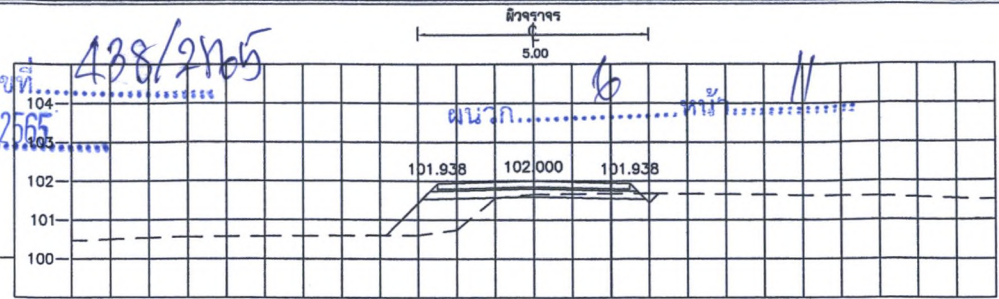


STA. 0+375.000
NGL = 101.657



STA. 0+350.000
NGL = 101.907













STA. 0+325.000
NGL = 102.007




STA. 0+300.000
NGL = 102.167

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
เส้นทางสาย สายเลี่ยงทางรถไฟ บ้านอาละวาด - บ้านมาลาฮิมแล	สำรวจ ออกแบบ แบบแสดง รูปตัดตามขวาง Sta. 0+200 - 0+375	นายอสมาน รุณี นายชินัน ยักษ์ นายอนันต์ ดาละ นายอินทรี ธีระ นายอานัน ดาละ นายสุเมธ รุ่งภักดิ์ นายสมบุญ เสงฆ์ นายสมบุญ เสงฆ์	เขียน นายอสมาน รุณี นายชินัน ยักษ์ นายอนันต์ ดาละ นายอินทรี ธีระ นายอานัน ดาละ นายสุเมธ รุ่งภักดิ์ นายสมบุญ เสงฆ์ นายสมบุญ เสงฆ์
นายอสมาน รุณี	นายชินัน ยักษ์	นายอนันต์ ดาละ	นายอินทรี ธีระ
นายอานัน ดาละ	นายสุเมธ รุ่งภักดิ์	นายสมบุญ เสงฆ์	นายสมบุญ เสงฆ์
นายอสมาน รุณี	นายชินัน ยักษ์	นายอนันต์ ดาละ	นายอินทรี ธีระ
นายอานัน ดาละ	นายสุเมธ รุ่งภักดิ์	นายสมบุญ เสงฆ์	นายสมบุญ เสงฆ์




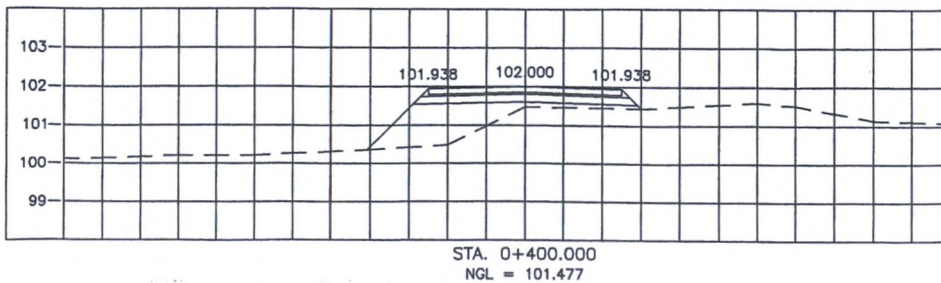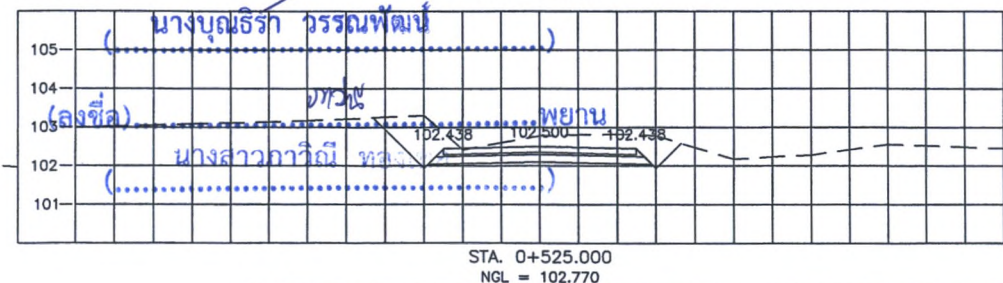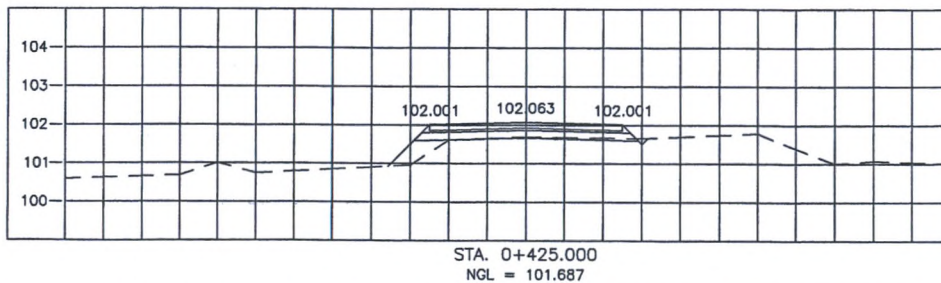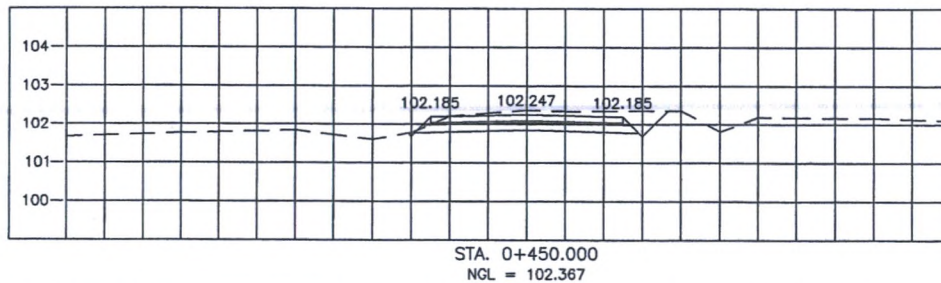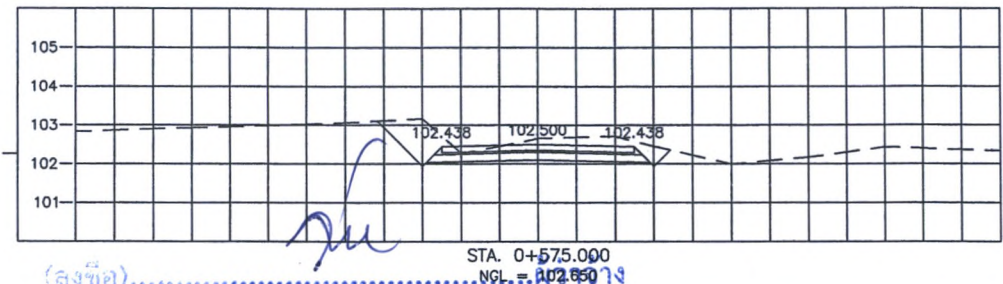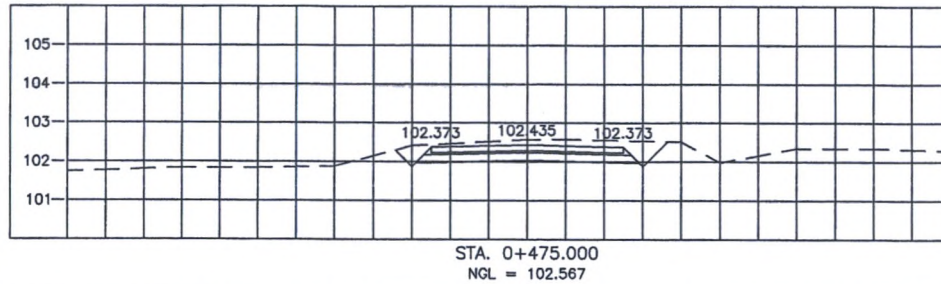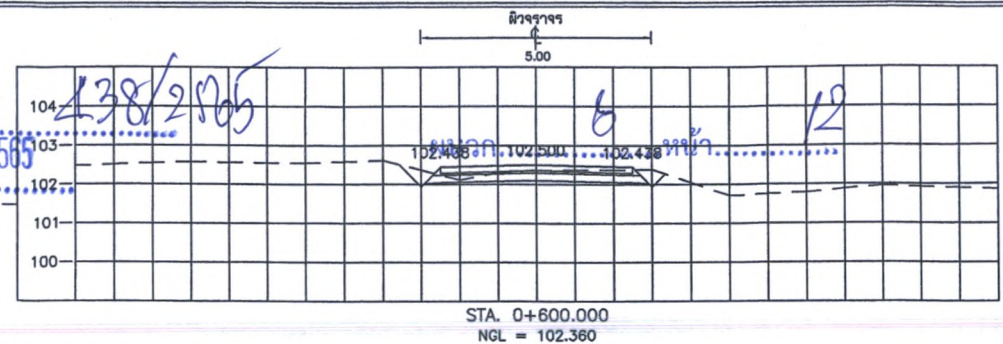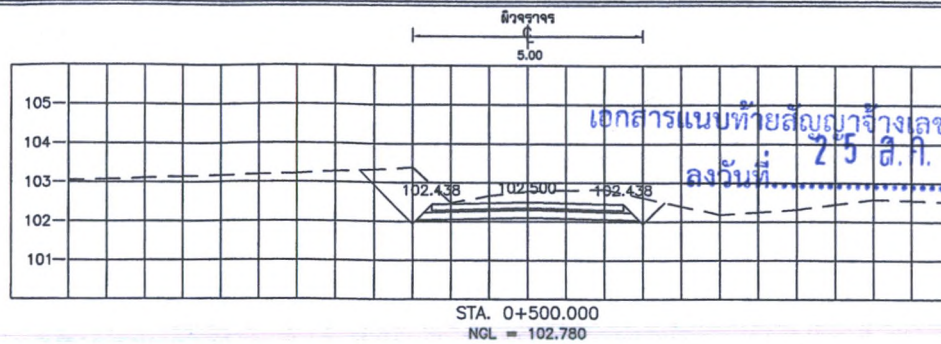


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
เส้นทางสาย	สำรวจ	นายสุมนาน หุ่น	เห็นชอบ
สายเชื่อมทางรถไฟ	สำรวจ	นายอิหม่าม ยานี	
โบราณวัตถุ - บ้านกลางสี่แยก	ออกแบบ	นายสมิธ คาสะ	
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายนิศุล เพ็ชร	รับผิดชอบการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
รูปตัดตามขวาง	เขียนแบบ	นายอานัน คาสะ	อนุมัติ
Sta. 0+400 - 0+600	ตรวจ	นายสุวัฒน์ รุ่งเรืองพันธ์	
แบบแสดง ๒๗.๕๐	แก้ไข 10	นายสมบุรณ์ เสงฆ์	
แก้ไขครั้งที่	ทวนซ้ำงานออกแบบ	นายสมบุรณ์ เสงฆ์	
	ทวนซ้ำงานออกแบบ		

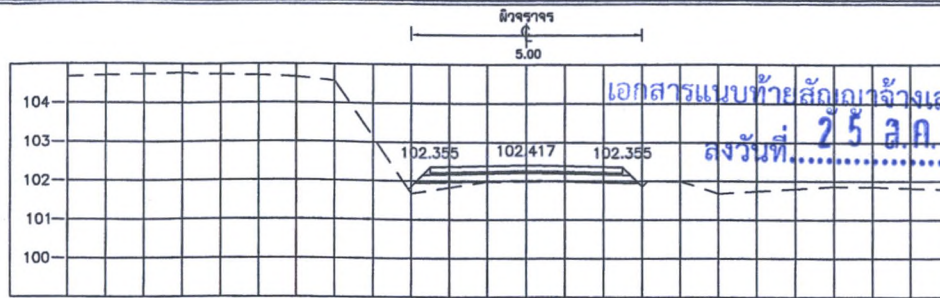


STA. 0+725.000
NGL = 101.994




STA. 0+700.000
NGL = 102.114




STA. 0+675.000
NGL = 102.354




STA. 0+650.000
NGL = 102.350




STA. 0+625.000
NGL = 102.230

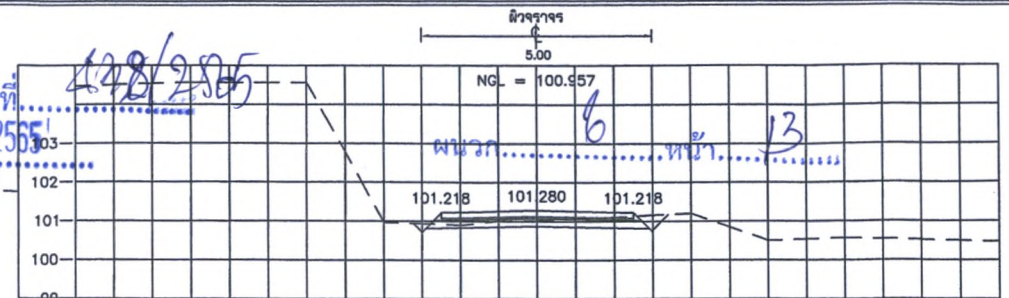


STA. 0+825.000
NGL = 101.017




STA. 0+800.000
NGL = 101.004




STA. 0+775.000
NGL = 101.634



STA. 0+750.000
NGL = 101.914




องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			
เส้นทางสาย	สำรวจ	นายอสมาน มูนิ	เป็นชอบ
สายเชื่อมทางรถไฟ	สำรวจ	นายชินัน ชัยบี	
บ้านเขาตะลุบัน - บ้านมาลาตีเนด	ออกแบบ	นายอสมิต คาละ	
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายนิศกุล ศิริสุข	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
รูปตัดตามขวาง	เขียนแบบ	นายอานัน คาละ	อนุมัติ
Sta. 0+625 - 0+825	ตรวจ	นายช่อฉวี วรรณพิสัย	
แบบเสร็จ	หน้า 11	นายสมบุญ แสนพริ	
แก้ไขครั้งที่	หน้า 11	นายสมบุญ แสนพริ	




เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๔๓๘/๒๐๕
 ลงวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕


ผนวก..... 6หน้า..... 14




STA. 0+922.000
 NGL = 100.023




STA. 0+900.000
 NGL = 100.457



STA. 0+875.000
 NGL = 100.687



STA. 0+850.000
 NGL = 100.957



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สะมะแอ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 (นางกลีสง เจ๊ะมะสาแล)
 หัวหน้าผู้จัดการ
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางบุญธิดา วรรณพัฒน์)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย	สำรวจ	นายสุสมาน มูนิ	เกินขอบ	
สายเคเบิลทางรถไฟ	สำรวจ	นายชัย ชัย		
โบราณวัตถุ - บ้านกลางใต้	ออกแบบ	นายสมิธ ศาและ		
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายนิรุจ พิเศษ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
รูปตัดตามขวาง	เขียนแบบ	นายอาหมิน ตาละ	อนุมัติ	
Sta.0+850 - 0+922	ตรวจ	นายสุโสมิ รุณภักดิ์		
แบบแสดง ๒๖๔.๕๐	แผ่นที่ 12	นายสมบูรณ์ แสนพงษ์		
แก้ไขครั้งที่	ทำโดยนายกรกฎ	นายสมบูรณ์ แสนพงษ์		

..... 6 15
..... หน้า
.....



					
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา					
เดินทางสาย สายเดิมทางรถไฟ โยนาคะซุว - โยนากาตีเผล	สำรวจ		นายสุมาน อูบิ	เห็นชอบ	
	สำรวจ		นายชินี ฮาบิ		
	ออกแบบ		นายสมิต ตาละ		
แบบแสดง	เขียนแบบ		นายนิศูล พิษฐ์	ปัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	เขียนแบบ		นายอาโนน ตาละ	อนุมัติ	
	ตรวจ		นายสุโยม รุ่งฤกษ์		
แบบขอ ชย.ยด.	หน้ายื่นสำรวจออกแบบ		นายสมภูมิ เสงพอร์		
แก้ไขครั้งที่	ทบทวนรายการค่าจ้าง		นายสมภูมิ เสงพอร์	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	

1. การติดตั้งป้ายให้ดูรายละเอียดในแบบแปลนที่ ทด-3-107, ทด-3-108
2. กรณีมีสิ่งกีดขวางในป้ายโครงการมีความยาวหลายทางในเกิน 1 บรรทัดให้ใช้สีของที่มีขนาดความสูงมากกว่า 7.5 ซม. ได้เด่นไม่เกิน 10 ซม.
3. หากมีพื้นที่ให้ใช้หมึกพิมพ์ชนิดโปรเจกต์ ที่มีอายุการรับประกันเทียบเท่าแผ่นสะท้อนแสง
4. ป้ายบังคับ ป้ายเตือนและป้ายแนะนำให้ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ทนไฟไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร
5. ค่าเผื่อ 1% หากใช้สีขาวและสีดำ อย่างน้อย 2 ครั้ง สีที่ใช้ตาม มอก.327

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่..... 438/261
ลงวันที่..... 25 ต.ค. 2565.....

ผนวก..... 6..... หน้า..... 16.....

0.30

0.30

1.20



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 210

0.35

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายเคเบิลทางรถไฟ บ้านอาตะควอ - บ้านบาลาสมิแล
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 922 เมตร

ผู้รับจ้าง ที่อยู่..... รับผิดชอบงานผู้รับจ้าง..... โทร.....

วันเริ่มต้นสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา..... รวมระยะเวลา.....วัน

วงเงินงบประมาณ คณะกรรมการตรวจการจ้าง..... (นายระเด่น สมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

ราคากลางค่าก่อสร้าง 1.....ประธาน โทร..... รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วงเงินตามสัญญาจ้าง 2.....กรรมการ โทร..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้ควบคุมงาน 1..... โทร..... 3.....กรรมการ (ลงชื่อ)..... (นางกลือชง เจ๊ะมุลลาห์) ผู้รับจ้าง

2..... โทร..... 4.....กรรมการ โทร..... (นางสาวภาวิณี ทองเทค) ผู้ช่วยผู้ว่าการ

5.....กรรมการ โทร.....

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

แบบแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง
NOT TO SCALE

(ลงชื่อ)..... พยาน

นางบุญธิรา วรรณพัฒน์

(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

นางสาวภาวิณี ทองเทค

(.....)

รายละเอียดป้าย

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม. หรือไวนิล
- พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
- ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
- โครงคร่าวไม้ขนาด 2" x 4"
- ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร
- มีติเป็นเมตรนอกจากรูปเป็นอย่างอื่น
- ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย	สำรวจ	นายอุดม นุ่น	เงินขอบ	
สายเคเบิลทางรถไฟ	สำรวจ	นายชัย ชัย		
บ้านอาตะควอ - บ้านบาลาสมิแล	ออกแบบ	นายสมิธ ตาละ		
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายนิศกร พิษฐ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	เขียนแบบ	นายอรัน ตาละ	อนุมัติ	
	ตรวจ	นายสุเมธ รุ่งภักดิ์		
แบบฉบับ อบจ.ยล	แผ่นที่ 14	นายสมบุญ เสงฆ์		
แก้ไขครั้งที่	หน้า	นายสมบุญ เสงฆ์	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 438/2565
ลงวันที่ 25 ส.ค. 2565

ผนวก.....7.....มีหน้า.....1.....ถึง.....3.....
จำนวน.....3.....ฉบับ

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

ผนวก.....7.....หน้า.....1.....

- ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ที่ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
- ในกรณีที่ เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
- กรณีที่ เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางกลีสง เจ๊ะมะสะแล)

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบุณรีรา วรรณพัฒน์)

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภาวิณี ทองเทศ)

(.....)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 438/2561
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2565

ผนวก..... 7 หน้า..... 2 ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

(นางชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายก อบจ. ยะลา

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางกลือซง เจ๊ะมะลิฮะ) ผู้รับจ้าง
(.....) หัวหน้าผู้จัดการ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางบุณธิดา วรรณพัฒน์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 438/2461
ลงวันที่ 25 ส.ค. 2565

หน้า 7
หน้า 8
ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

.....

(นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นางกลีสง เจ๊ะมะฮะมา)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ) พยาน

นางบุณธิรา วรรณพัฒน์

(.....)

(ลงชื่อ) พยาน

(.....)
