

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๐๑๙๒/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายระเด่น สะมะแอ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูฟี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๕ หมู่ ๑๑ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัด ยะลา โดย นายลูฟี่ อาลีมามะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๑๓๒๐๘๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเงาะกาโป - บ้านบาตูตางอ หมู่ที่ ๓ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ. ที่กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก ณ บ้านเงาะกาโป - บ้านบาตูตางอ หมู่ที่ ๓ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนก ๑ ใบเสนอราคาและบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ แผนก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ แผนก ๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ แผนก ๔ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ แผนก ๕ หนังสือรับรองวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองช่างผู้ควบคุม จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๖ แผนก ๖ แบบป้ายประชาสัมพันธ์และแบบแปลน จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๗ แผนก ๗ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๘ แผนก ๘ การจัดทำแผนการทำงาน จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

(.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายลูฟี่ อาลีมามะ)

Luffy Enterprise
Limited partnership

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๖,๔๐๐.- บาท (สองแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการ ค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับ จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๑๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสน สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๗๐,๐๕๖.๐๗ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๑๖,๕๑๘.๔๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเงาะกาโป - บ้านบาตูดางอ หมู่ที่ ๓ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายสุทธิ อภิบาล.....)
Luffy Enterprise
Limited partnership

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๑๖,๕๑๘.๔๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเงาะกาโป - บ้านบาตูดางอ หมู่ที่ ๓ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๗๐,๘๐๙.๖๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยเก้าบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายลูทฟี อาลีมามะ.....)

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไปแล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง


การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

(.....)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



(.....นายสุพิน อัคร์สุมาโน) Enterprise
Limited partnership

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุทธิ ภาณุ Enterprise
Limited partnership



ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกค้าจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่างด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกค้าจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่าง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกค้าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกค้าจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกค้าจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกค้าจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกค้าจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกค้าจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่าง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกค้าจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่างจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายลูทฟี อาลีมาฮะ Enterprise
Limited partnership

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายลูทฟี อาลี.....)
Lufti Enterprise
Limited partnership

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๐,๓๒๐.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะนอ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายลพ อาลีมามะ.....)

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายสุเทพ อาลีมาเย) Enterprise
Limited partnership

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ก่อสร้าง

๒๓.๒ โยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายสุทธิ อดิสรณ์) **Lobby Enterprise**
Limited partnership

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิ ออสมมะ)

Luffy Enterprise
Limited partnership

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๔๑๒๑๐๖๔

เลขคู่มือสัญญา ๖๗๐๓๒๒๐๒๓๒๓๐



อ.ส.5 ใบสัณห์หลังตราสาร

เลขที่ 01038
วันที่ 18 เมษายน 2567

เลขประจำตัว 0953565000335 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูฟี่ เอ็นเตอร์ไพรส์

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน 95030100172 ชื่ออาคาร -
ห้องเลขที่ - ชั้นที่ -
หมู่บ้าน - หมู่ที่ 11
เลขที่ 155 แยก -
ตรอก/ซอย - แขวง/ตำบล บึงนังस्ता
ถนน - จังหวัด ยะลา
เขต/อำเภอ บึงนังस्ता
รหัสไปรษณีย์ 95130

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000604238 เลขที่สาขา
ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

ได้เสียอากรแสดงเป็นเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดงปี พ.ศ. 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าอากรแสดงปี	3,858	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	3,858	00

จำนวนเงินเป็นตัวเลข (สามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 005883

ลงวันที่ 18 เมษายน 2567

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12950010-25670418-1-02-000036

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

(นางสาวยามิละ ระสิมพะมิ)

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัณห์หลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงปีของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01221/67

วันที่ 18 เมษายน 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูฟี่ อินเตอร์ไพรส์

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเงาะกาโป - บ้านบาดตางอ หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เป็นเงินสด	2112010101.001	206,400.00	สัญญาเลขที่ 00192/67 (CNTR-00192/67)
รวมเงิน			206,400.00	

ตัวอักษร (สองแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวนินุรีหซาน สะแลแม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะลา เลขที่บัญชี 909-1-00521-1
วันที่ 18 เมษายน 2567

: 206,400.00 บาท

รวม : 206,400.00 บาท



ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 18 เมษายน 2567 (ปีงบประมาณ 2567)

เจ้าหน้าที่กรินทร์ ทองเทศ (./Default.aspx?menu=0B8D6D79-D5A4-
หน้าที่ 4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list)

หน่วย

งาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ออกจากระบบ

(Default.aspx)

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

ระบบงบประมาณ

ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ()

รายงาน ()

18 เมษายน 2567[V.2024-03-07141.14]

ระบบข้อมูลรายรับ

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

เงินกู้ ()

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ
()

จัดทำใบนำส่งเงิน ()

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

ฐานข้อมูลเงินฝากกระทรวงการคลัง ()

ฐานข้อมูลลูกหนี้ ()

ฐานข้อมูลสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ()

ฐานข้อมูลเงินรอตรวจสอบ ()

ฐานข้อมูลรายได้ค่าสินค้าและบริการรับ
ล่วงหน้า ()

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม ()

ใส่วงเงินที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ ()

จัดทำฎีกา ()

จัดทำเช็ค ()

ยื่นเงิน ()

เงินประกัน ()

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

ฐานข้อมูลเงินเดือน/บำนาญ ()

ระบบบัญชี

รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี ()

การปรับปรุงบัญชี ()

ยื่นเงินสะสม ()

งานบัญชีสิ้นปี ()

จัดทำงบการเงินรวมประจำปี ()

รายงานงบการเงิน ()

ฐานข้อมูลเงินรับฝาก ()

ทะเบียนสินทรัพย์ ()

การบริหารระบบ

การกำหนดค่าตั้งต้น ()

การจัดการฐานข้อมูล ()

☐ ข้อมูลจากระบบ e-GP ☒ บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

ประวัติการแก้ไข

เลขที่โครงการ(e-GP) 67029121064

เลขคณสัญญา(e-GP)* 670322023230

เลขที่คณสัญญาของ อปท.* 00192/67

วันที่ทำสัญญา* 18/04/2567

วันสิ้นสุดสัญญา* 14/12/2567

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ระบบ GFMIS 00192/67

เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-00192/67

ชื่อเจ้าหน้าที่* ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพพี เอ็นเดอ ...

จำนวนเงินขอซื้อจ้าง 4,300,000.00 บาท

จำนวนเงินขณะการจัดซื้อจัดจ้าง 4,128,000.00 บาท

จำนวนเงินที่ทำสัญญา 4,128,000.00 บาท

สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

แหล่งที่มาของเงิน

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเงาะกาโป - บ้านมาตุตงอ หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	เงินงบประมาณ	9967031242110005	4,300,000.00	4,128,000.00	172,000.00
						4,128,000.00	

เงินล่วงหน้า

☐ มีเงินล่วงหน้า ☒ ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

☒ มีหลักประกันสัญญา ☐ ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา* เงินสด

ชื่อผู้จัดทำ* นางสาวกรินทร์ ทองเทศ

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินงบประมาณ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเงาะกาโป - บ้านมาตุตงอ หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	4,128,000.00	0.00	4,128,000.00

ที่ 100922132083



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0953565000335

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลุฟที เอ็นเตอร์ไพรส์

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายลูฟที อาลีมามะ

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

4,000,000.00 บาท

2. นางสาวนุรมา ตือราเซะ

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

1,000,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายลูฟที อาลีมามะ/

(ลงชื่อ) (นายระเด่น สะมะแอ)

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัดราชการแทน

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 155 หมู่ที่ 11 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 40 ข้อ ดังปรากฏในสัณเภาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้

โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) (นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ) Limited partnership

(นางสาวกรรณิการ์ ทองเทศ)

ออกให้ ณ วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ) (นายศรายุทธ บึงขงพงศ์)

(นายศรายุทธ บึงขงพงศ์)

(นางสาวไอลยุตธารัตน์ หอมสมบัติ)

นายทะเบียน



.....
.....
.....
.....
.....

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ที่ 100922132083



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922132083

- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(.....)
(ลงชื่อ) Limited partnership พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)



.....
.....
.....

.....

.....

.....



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:01 น.

Ref:66100922132083

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป



- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินนั้น ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหนี้เงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือโดยวิธีอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ก่อสร้างอาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทั้งสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโยธา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยอื่น
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิง
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

Luffy Enterprise
Limited partnership

(นางสาวกรินทร์ ทองเทศ)

นายศรัทธ เล็กบางพงค์

Luffy Enterprise
Limited partnership



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....40.....ข้อ ดังนี้

(22) ประเภอบกัการค้ำ ข้าว ผลัดภักขำข้าว ม้นสำปะหลัง ผลัดภักขำกับสำปะหลัง ข้าวโหล งา ถั่ว ทรักไทย ปอ นุ่น
ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ขาง คัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนั่งสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์และทะเล น้ำคาส อาหารสัตว์และ
พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

(23) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า
คู่มือ เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าว ไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว
เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และ
อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(24) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์
บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น

(25) ประกอบกิจการค้า ค้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องใช้ และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

(26) ประกอบกิจการค้าขายและมือกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เภยภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยารักษาโรค และสัตว์ทดลอง

(27) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น

(28) ประกอบกิจการค้ากระดาน เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ คู่มือเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน

(29) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน (นายระเด่น สะมะแอ)

(30) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน (นายระเด่น สะมะแอ)

(30) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องใช้เครื่องใช้ในทางการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท ตู้ เครื่องมือ
ทำสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

(31) ประกอบกิจการค้าขงคิบ ขางแผ่น หรือขางพนิคอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจกส่วนใดส่วนหนึ่งของคณขางทรวร รวม
คตยถึงขางเทียม สิ่งทอที่ซึม วัดอุณหภูมิหรือนันค้ำดักกล่าว โศกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(ลงชื่อ) _____
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

Luffy Enterprise Limited partnership
นาย

(ลงชื่อ)..... พยาน

นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

.....U550453103

.....

1038005

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 40 ข้อ ดังนี้

- (32) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการประกอบสัตว์
- (33) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่ายและออกหนังสือพิมพ์
- (34) ประกอบกิจการโรงงานแข็ง
- (35) ประกอบกิจการประมง แพรปลา สะพานปลา
- (36) ประกอบกิจการระบิดหินและย่อยหิน
- (37) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานโซไม และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิก และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานอ้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีด และหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องเค็ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
- (38) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หกแร่ แฉ่งแร่ ตำรวจแร่ และตรวจสอบแร่ ขนแร่
- (39) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (40) ประกอบกิจการประมูล เพื่อรับจ้างเหมาแรงงาน ในการดำเนินการต่างๆ ตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

ลuffy

Luffy Enterprise
Limited partnership

(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

นายศรียุทธ เล็กบางพด

Luffy Enterprise
Limited partnership

นายศราวุธ เล็กบางพงค์

Loffy Enterprise
Limited partnership

หากข้าพเจ้า...

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

-2-

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเรียกประกัน หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่มีความผูกพันที่จะรับค้ำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้นำพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่ต้องรับผิดชอบต่อ ความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้นำเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ) Lu A Luffy Enterprise
 (นาย เทพ อาลิมา)
 ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ
 ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
 (นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัด อบจ. ยะลา
 (ลงชื่อ) นายก อบจ. ยะลา

(นาย เทพ อาลิมา)
 (ลงชื่อ) ปลัด อบจ. ยะลา Limited partnership พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)พยาน

(นายศรัยฐ เล็กบางพงศ์)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

บันทึกการต่อรองราคา

จำนวน.....1.....ฉบับ
ผนวก.....1.....หน้า.....๒.....

การเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเงาะกาโป-บ้านบาตูดางอ

หมู่ที่ ๓ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือขอเชิญร่วมเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ที่ ยล ๕๑๐๐๙/๗๑๖-๗๒๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้เชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมยื่นข้อเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเงาะกาโป-บ้านบาตูดางอ หมู่ที่ ๓ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ ๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน) ราคาเป็นเงิน ๔,๑๓๖,๗๒๕.๖๒ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทแปดทศสิบสองสตางค์) โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย

๑. หจก.ลูฟี่ เอนเตอร์ไพรส์	เสนอราคา	๔,๑๓๓,๐๐๐.- บาท
๒. หจก.ทรัพย์สุโข	เสนอราคา	๔,๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. หจก.กาตือแป วัสดุ	เสนอราคา	๔,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด โดย หจก.ลูฟี่ เอนเตอร์ไพรส์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๔,๑๓๓,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

ในการนี้ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงได้ต่อรองราคากับ หจก.ลูฟี่ เอนเตอร์ไพรส์ ทาง หจก.ฯ ยินดีลดวงเงินให้ เป็นเงิน จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงินที่จัดจ้าง เป็นเงิน ๔,๑๒๘,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดทุกประการ โดยยื่นราคาที่เสนอ ๑๘๐ วัน และส่งมอบงาน ภายใน ๒๔๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
Luffy Enterprise Limited partnership

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นายลูฟี่ อาลีมามะ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
Luffy Enterprise Limited partnership

(นางดารณี สองแก้ว)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรุชิตา ยะมะลี)

(ลงชื่อ).....
(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิสรล จ๊ะชู)

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

จำนวน.....1.....ฉบับ

บัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเงาะกาโป - บ้านบาตูด่าง หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเงาะกาโป - บ้านบาตูด่าง หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 16 เมษายน 2567

คำนวณราคาโดย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูฟี่ เอ็นเตอร์ไพรส์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต				
	1.1 งานดิน				
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,700.00	5.53	14,931.00
	1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวคอนกรีต				
2	1.2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	4,500.00	16.65	74,925.00
3	1.2.2 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	972.00	282.87	274,949.64
4	1.2.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	225.00	915.23	205,926.75
	1.3 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต				
5	1.3.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	4,500.00	664.10	2,988,450.00
6	1.3.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	เมตร	445.00	222.08	98,825.60
7	1.3.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง	เมตร	900.00	98.28	88,452.00
	1.4 งานทางเชื่อม				
8	1.4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	385.00	664.10	255,678.50
	1.5 งานโครงสร้าง				
9	1.5.1 งานท่อกลมคสล. ขนาด 0.60 ม.	ม.	16.00	1,535.18	24,562.88
10	1.5.2 งานท่อกลมคสล. ขนาด 0.80 ม.	ม.	18.00	2,975.05	53,550.90
11	1.5.3 งานท่อกลมคสล. ขนาด 1.00 ม.	ม.	10.00	4,328.43	43,284.30
	1.8 งานเปิดเตล็ด				
12	1.8.1 แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	ตร.ม.	0.72	4,488.46	3,231.69
13	1.8.2 เสাপ้ายคอนกรีต	ม.	3.00	410.58	1,231.74
รวมค่าก่อสร้าง					4,128,000.00

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

(ตัวอักษร) สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันยี่สิบเก้า

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

(นายลูฟี่ อาลีมาน)

ลงชื่อ

Luffy Enterprise
(นายลูฟี่ อาลีมาน) limited partnership
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

Luffy Enterprise
limited partnership พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายศรัยร์ เล็กบางพงค์)

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน จำนวน..... 1 ฉบับ

งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเงาะกาโป - บ้านบาตูด่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๙.๗๘% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๘๑๖,๕๑๘.๔๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
- งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)
- งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่
- งานวางท่อกลม คสล.
- งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม
- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ปริมาณงาน ๓๒.๕๐ ลบ.ม.
- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ปริมาณงาน ๖๕๐.๐๐ ตร.ม.
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint)
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๔.๙๐% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๔๐,๖๗๒.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ปริมาณงาน ๑๐๕.๐๐ ลบ.ม.
- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ปริมาณงาน ๒,๑๐๐.๐๐ ตร.ม.
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint)
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)..... นายกระเด็น สุ่มะแอ
 (ลงชื่อ)..... นายกองศักดิ์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา จังหวัดยะลา
 (ลงชื่อ)..... นายกองศักดิ์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา จังหวัดยะลา

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๕.๓๒% ของค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๗๐,๘๐๙.๖๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยเก้าบาทหกสิบสตางค์) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต แล้วเสร็จ..... นายสมสวัสดิ์กรินทร์ ทองเทศ
- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต แล้วเสร็จ.....
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint) แล้วเสร็จ..... นายศรายุธ เล็กบางพงค์
- งานรอยต่อตามยาว (longitudinal joint) แล้วเสร็จ.....
- งานทางเชื่อมผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และงานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมดของโครงการจนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน พร้อมส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑. ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้..... ฉบับ

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้ 4 หน้า 1

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด
ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณีK = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือ
บวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๒. ค่า ESCALATION FACTOR หรือค่า K ได้แยกตามประเภทงานดังนี้

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ย
บดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเชื่อม คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล
ปฏิบัติงานสำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุม
คุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้
ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเชื่อมชลประทานทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED
MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

๒.๒ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบ
ด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดี่ยว
(DOWEL BAR) เหล็กยัด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง
แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

๒.๓ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพานรวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกัน (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น
ใช้นายกองกลางบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$ ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย
พาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด)

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา)

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ (ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา)

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวด
ราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาวัสดุเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

จำนวน.....¹.....ฉบับ

ผนวก.....5.....หน้า 1

หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่... ๑๐๖ ๑๗๐ ไร่

วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

๗. โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาง อัมพลาภรณ์ ปิณฑะกุล อายุ 27 ปี
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ - ถนน จิตติปัญจา
ตรอก/ซอย - ตำบล พะเนา อำเภอ พะเนา จังหวัด พะล
หมายเลขโทรศัพท์ 095-427-1911 สถานที่ทำงาน พ. นว พ. ล
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาคีวิศวกร สาขา โยธา
แขนง - ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ภย. 90587
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบทางวิ่ง - ขาทาง จำนวน 1โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เพื่อเป็นหลักฐานได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าราชการ

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ).....นายทองคกร พรหมสวัสดิ์.....

..... Luffy Enterprise

(ลงชื่อ)..... Limited partnership พยาน

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)..... พยา

นายทรายูร เล็กบางพงศ์

(ลงชื่อ)..... วิศวกร

(ทพ อปตจ) ไร่ ปิยะพันธ์ ๒๖

(ลงชื่อ).....ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/ทจก.

• (ဖေး ကျပ် ခရီးသည်)

(ลงชื่อ).....พยาน

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਭਾਈ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਭਾਈ)

สงชื่อ).....พยาน

ਮਨੁਸ਼ੀਯਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ

คำเตือน

1. ให้ชี้คมาข้อความที่ไม่ใช่ออก
2. ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพและภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้วิศวกรรับแจ้งให้้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

18 เม.ย. 2567
ลงวันที่.....

 Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 9589 00623 92 4
Identification Number
ชื่อตัวและสกุล นาย อับดุลสุไกร บือแนปีแน
Name Mr. Abdulsakor Buenaepinae
Last Name Buenaepinae
เกิดวันที่ 2 เม.ย. 2542
Date of Birth 2 Apr. 1999
ศาสนา อิสลาม
ที่อยู 52 หมู่ที่ ๓ บ้าน ด.ยธ. ๑
อ.ยธ. ๑ อ.ยธ. ๑
11 เม.ย. 2561
วันหมดอายุ 11 Apr. 2027
11 เม.ย. 2018 (สำคัญ ขุดเจาะ โสภณ)
Date of issue 1 Apr. 2027
1398-33-11111543

ลงนามผู้ก่อร่าง

ผู้

(นายระเด่น สมะแอ) ผู้จ้าง

รอนายกองคการบริษัส่วนจังหวัดยะลา บัญชีราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองคการบริษัส่วนจังหวัดยะลา บัญชีราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองคการบริษัส่วนจังหวัดยะลา บัญชีราชการแทน
Luffy Enterprise
Limited partnership
พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) นายศรีชัย เล็กบางพงค์ พยาน

(นายศรีชัย เล็กบางพงค์)

ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2567

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thai Professional Engineering License
 เลขประจำตัวประชาชน (ID) 1-9599-00623-92-4
 ชื่อและชื่อสกุล **นาย อับดุลสุกร บือนนปิ่น**
 Title/Name Surname **Mr. Abdulsukur Buenaepinae**
 เลขทะเบียน **ภช.90587** เลขที่มาชิกสามัญ **313337**
 License No. Member No.
 ระดับ **ภาควิศวกร** สาขา **โยธา**
 Level Associate Eng. Discipline Civil Eng.
 อนุญาต **14 มิ.ย. 2565** วันหมดอายุ **13 มิ.ย. 2570**
 Date of Issue 14 Jun 2022 Date of Expiry 13 Jun 2027
 (นายอับดุลสุกร บือนนปิ่น) (Signature)
 (นายอับดุลสุกร บือนนปิ่น) (Signature)
 นายอับดุลสุกร บือนนปิ่น (Signature)

อับดุลสุกร บือนนปิ่น

น

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)



นายอับดุลสุกร บือนนปิ่น (นายอับดุลสุกร บือนนปิ่น) (Signature)

(ลงชื่อ) นายอับดุลสุกร บือนนปิ่น

อ

Luffy Enterprise
 Limited partnership

000048687

สภาวิศวกร
 COUNCIL OF ENGINEERS
 www.coe.or.th

(ลงชื่อ) พยาน

(นายอับดุลสุกร บือนนปิ่น) (Signature)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายอับดุลสุกร บือนนปิ่น) (Signature)

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

หนังสือรับรองของช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ข้าพเจ้า นาย อนุวัฒน์ ไซฟุซัน ต่อม ภูส
สาขา ใจจ่า ตั้งสำเนาใบประกาศ หรือใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ขอรับรองว่า จะเป็นช่างควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเกาะก๊อป-บ้านนาตาขาว หมู่ 3 ตำบล ชะหนึ่งสงขลา จ.สง
ให้กับ
บริษัท/ห้างฯ ภูเก็ต คอฟฟี่ เอนเตอร์ไพรส์ ตั้งแต่วันเริ่มต้นตามสัญญาจ้างเป็นต้นไป จนกว่า
การก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนและรายการสัญญา เมื่อทางราชการได้ตกลงทำสัญญาจ้างให้บริษัท/ห้างฯ ภูเก็ต
คอฟฟี่ เอนเตอร์ไพรส์ เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
(นาย อนุวัฒน์ ไซฟุซัน ต่อม ภูส)

(ลงชื่อ).....
(นาย อนุวัฒน์ ไซฟุซัน ต่อม ภูส)
ตำแหน่ง ภูเก็ต คอฟฟี่ เอนเตอร์ไพรส์
ประเภทตรา (ถ้ามี) Limited partnership

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมนะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
(นาย อนุวัฒน์ ไซฟุซัน ต่อม ภูส)
Limited partnership

(ลงชื่อ).....
(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....
(นายศรัยฐ เล็กบางพงค์)

หมายเหตุ ต้องแนบสำเนาภาพถ่ายบัตร หรือ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ มาพร้อมหนังสือรับรองนี้ด้วย



จำนำลูกต๋อง

ผู้รับมัดไซฟูซามัน จ.มะ

(ลงชื่อ)..... (นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บัญชีการแทน
(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา บัญชีการแทน
(.....)..... Enterprise
Limited partnership
(ลงชื่อ)..... พยาน
(..... (นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ))
(ลงชื่อ).....
(..... นายศรีสุข เล็กบางพงค์

ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2567
ระเบียบแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

รหัสสถานศึกษา 1395016101 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา
จังหวัด ยะลา สถานศึกษาเดิม โรงเรียนคารุลยดาวิทยา
รหัสประจำตัว 6031210032 จังหวัด ยะลา
ชื่อ - ชื่อสกุล นายมูฮัมหมัดไซฟูซามัน สามะ ระดับการศึกษาที่จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม หน่วยกิต/หน่วยการเรียน 85 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.51
วัน เดือน ปีเกิด 4 กันยายน 2540 เข้าศึกษาเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
เลขประจำตัวประชาชน 1 9599 00553 70 5 หน่วยกิตที่รับโอน -
ชื่อบิดา นายหามิ สามะ หน่วยกิตที่เรียน 104
ชื่อมารดา นางมารีเยาะ บือซา หน่วยกิตที่ได้ 84
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.20
สาขาวิชา โยธา ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ 26 มีนาคม 2562
สาขางาน โยธา สำเร็จการศึกษาเมื่อ 27 มีนาคม 2563



รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วย กิต (1)	ผล การ เรียน (2)	(1) x (2)
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1					3121-2104	วิศวกรรมกรรมทาง	3	1.5	4.5
3001-1001	การบริหารงานคุณภาพในองค์กร	3	3.5	10.5	3121-8502	โครงการ 1	2	2.5	5.0
3001-2001	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ	3	3.5	10.5	3000-2005	กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม		ผ.	
3121-0001	กลศาสตร์โครงสร้าง	3	ผ.		ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 4				
3121-0002	วัสดุก่อสร้าง	3	ผ.		3000-1204	ภาษาอังกฤษโครงการ	1	2.0	2.0
3121-0007	การปฏิบัติงานก่อสร้าง	2	ผ.		3000-1304	วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน	3	2.0	6.0
3121-2005	คอนกรีตเทคโนโลยี	3	1.5	4.5	3000-1606	การคิดอย่างเป็นระบบ	2	3.0	6.0
3000-2001	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1		ผ.		3106-2110	กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง	2	1.5	3.0
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2					3121-2002	การเขียนแบบโยธาดำเนินการด้วยคอมพิวเตอร์	3	3.5	10.5
3000-1101	ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ	3	2.0	6.0	3121-2003	การประมาณราคางานโยธา	3	4.0	12.0
3000-1607	สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	1	3.5	3.5	3121-2004	การบริหารและการจัดการก่อสร้าง	3	1.0	3.0
3100-0105	ความแข็งแรงของวัสดุ	3	1.0	3.0	งานโยธา				
3121-0003	เทคนิคก่อสร้าง	3	ผ.		3121-2102	การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	3	1.0	3.0
3121-0004	การประมาณราคาก่อสร้าง	3	ผ.		3121-2108	ช่างไม้	3	2.0	6.0
3121-0006	การสำรวจเบื้องต้น	3	ผ.		ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 5				
3121-2006	ปฐพีกลศาสตร์	3	1.0	3.0	3100-0101	กลศาสตร์วิศวกรรม (*3)	3	1.0	3.0
3121-2109	ระบบสุขาภิบาล	2	2.5	5.0	3121-0005	การเขียนแบบก่อสร้าง (*3)	3	ผ.	
3000-2002	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2		ผ.		3000-2003	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3		ผ.	
ปีการศึกษา 2560 ภาคฤดูร้อน					ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 6				
3121-8001	ฝึกงาน	4	4.0	16.0	3100-0301	เทคโนโลยีการก่อสร้าง (*3)	3	2.5	7.5
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 3					3121-8503	โครงการ 2	2	2.5	5.0
3000-1203	ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน	2	1.5	3.0	3000-2004	กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4		ผ.	
3000-1209	ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม (*3)	3	1.5	4.5	สำนักงาน ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการ				
3000-1402	คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม	3	2.5	7.5					
3000-1501	ชีวิตกับสังคมไทย	3	3.0	9.0					
3108-1001	การเขียนแบบก่อสร้าง 1	3	2.5	7.5					
3121-2001	การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา	3	3.0	9.0					
3121-2007	วัสดุงานทางและการทดสอบ	3	1.0	3.0					
3121-2103	การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก	3	1.0	3.0					

ออกจากสถานศึกษาเมื่อ 27 มีนาคม 2563

เหตุที่ออก สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(นางดวงกมล แก้วนก)

หัวหน้างานทะเบียน

วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายเงินวิทย์ บุญช่วย)

ผู้อำนวยการ

วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนน วงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7320-3610 ต่อ 1441

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเงาะกาโป - บ้านบาตูดางอ หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน: ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,500.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูฟี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ ที่อยู่ 155 หมู่ที่ 11 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดย นายลูฟี่ อาลีมามะ โทร. 064-8237579

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา 19 เมษายน 2567 และระยะเวลายสิ้นสุดสัญญา 14 ธันวาคม 2567 รวมเป็นระยะเวลา 240 วัน

(ลงชื่อ).....

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....

(นาย)..... Enterprise

(ลงชื่อ)..... Limited partnership

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้ง 4,300,000.00 บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง 4,136,725.62 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 4,128,000.00 บาท

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางสาวกรรินทร์ ทองเทศ)

1. นายชูไฮมี ชุมชุมพันธ์ นายช่างโยธาอาวุโส

โทร. 0-7320-3625

1. นายนันต์ เพ็ชรการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 0-7320-3625

2. นายอามัน ดาละ นายช่างโยธาชำนาญงาน

โทร. 0-7320-3625

2. นายเอกราช ยี่เส้น

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

โทร. 0-7320-3625

3. นายอสมิล ดาละ

นายช่างโยธาวางาน

โทร. 0-7320-3625

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว โดยทำการติดตั้ง จำนวน 2 จุด ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ

ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

1.20 เมตร

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.20 เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 1441

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเงาะกาโป - บ้านบาตูดางอ หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสตา
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

0.60 เมตร

ปริมาณงาน: ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,500.00 ตารางเมตร
(ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด)

ปีงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง : ปี 2567

วงเงินค่าก่อสร้าง : 4,128,000.- บาท

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง : เงินรายได้ (เงินอุดหนุนทั่วไป)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายสมเด็จ สุขชนะ) ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา : 2 ปี
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา-เป็นประธาน
วันเริ่มต้นประกันสัญญา : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
วันสิ้นสุดการรับประกัน : (ลงชื่อ)
นายสมเด็จ สุขชนะ

(ลงชื่อ) นายสมเด็จ สุขชนะ
Luffy Enterprise
Limited partner

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) นายสมเด็จ สุขชนะ
นายสมเด็จ สุขชนะ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา ปฏิบัติราชการแทน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลายบ้านเงาะกาโป

(ลงชื่อ) นายกองคำการบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา
บ้านปากตอ

บ้านเงาะกาโป - บ้านบาตูด่าง หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) นายกองคำการบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา
Enterprise Limited partnership

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

ที่ STA. 0+000 - 0+900

(ลงชื่อ) พยาน

รวมความยาว 0.900 กิโลเมตร

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

ลงวันที่ 18 มี.ย. 2567 คำนำ

สารบัญแบบ

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 26 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงท้องถิ่น ได้ให้อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ดำเนินการกำหนด มาตรฐานและลักษณะของทางและงานทาง ประกอบแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ได้กำหนดภารกิจให้กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการจัดตั้งหรือปรับปรุงปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษา แนะนำทางวิชาการ ทั้งได้กำหนดพันธกิจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม และขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยให้จัดทำมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับงานทางและข้อกำหนดทางวิชาการ เป็นแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีการรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานและนำแบบมาตรฐานมาประยุกต์โดยคำนึงและให้ความสอดคล้องของแบบ เงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้งานได้เหมาะสมตรงกับสภาพงานก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะ อันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจะกาโบ - บ้านบาตุดาอ หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ขนาดผิวจราจรสองทิศทางเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,500.๐๐ ตารางเมตร จำนวน 1 โครงการ

รายการทั่วไป

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่าง ๆ ให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดี ของงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ
 - แจ้งขอเข้าปฏิบัติงาน
 - ส่งแบบการปฏิบัติงาน
 - ส่งแบบบุคลากรผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
 - ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด วัสดุ และ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ส่วนที่ ๒ ที่ กค. (กวจ) ๐405.2/ว.๑๑ สว. 18 ก.พ. 2564
 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการ
- วัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในการก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุอื่น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้าง ด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
- ค่าระดับและพิกัดหลักฐานแบบที่กำหนด (บม.) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
- เขตทางขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
- งานตัดได้แก่ งานตัดหิน , งานตัดหิน , งานตัดหินเชิงและงานตัดอื่น ๆ
- รถขนส่งวัสดุที่เครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
- ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานช่างของกรมทางหลวงชนบท (มทช.) เฉพาะในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนดให้ใช้
- ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน
- สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น
- ท่อ คล. ให้ใช้เพิ่มความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีกรณีใช้ในการก่อสร้าง
- ให้แต่งคันดินเดิม และ/หรือ ร่องน้ำเดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้สามารถระบายผ่านท่อได้โดยสะดวก
- จำนวนท่อในแต่ละแถว ตำแหน่งการวางท่อและค่าระดับทางเข้า - ออก อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสามารถระบายน้ำได้ดี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

รายการแบบ	แบบเลขที่	แผ่นที่
ใบปะหน้า		1
คำนำ, วัตถุประสงค์, สารบัญแบบและรายการทั่วไป		2
แผนที่สังเขป		3
แปลนถนนคสล.		4
รูปตัดและผังโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคุณสมบัติวัสดุ		5
แบบแปลนและผังการเสริมเหล็กถนน คสล.		6
ป้ายโครงการ/ป้ายประจำเส้นทาง		7 - 8

- ค่าแห่งก่อสร้างที่ตลอดเหี้ยม เครื่องหมายจราจร ขวางระบายน้ำ และบ่อพักอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ค่าแห่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการปรับแก้ตามข้อ 14, 15 และ 16 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณของมวลที่ขึ้นของและรายการน้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
- รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้แต่ยังไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามมติของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องหาบุคลากรในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากสภาพแวดล้อมที่กระทำหรือมีสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง... หากการก่อสร้างก่อให้เกิดอุบัติเหตุผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง ซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย ที่ใช้บังคับใช้ปัจจุบันและที่ประกาศใช้บังคับในภายหลังด้วย
- ผู้รับจ้างจะต้องคิดค่าเผื่อเงิน เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างที่สูญหายหรือชำรุดเสียหายจนต้องเปลี่ยนใหม่
- มีติดค้าง มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่นไว้ในแบบ
- ในการนี้ที่จำแนกและให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อาจจะมีมุมต่างแบบและมุม (SKEW ANGLE) ของแนวท่อลอดเหนือพื้น หรือลอดถนน, ขวางระบายน้ำ จากแบบก่อสร้าง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
- ถ้าบริเวณก่อสร้าง มีอาคารระบายน้ำเดิมอยู่ ผู้รับจ้างจะต้องทำการขออนุญาตและขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อถมหรือปรับพื้นที่ก่อนดำเนินการ

หมายเหตุ

(ลงชื่อ) Limited partnership

- หลังประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้
- วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
- ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของปริมาณเหล็ก
- ที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑) ไว้เป็นหลักฐาน
- นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย	สำรวจ	นายอุดม นุ้ย	เห็นชอบ	
สายบ้านจะกาโบ - บ้านบาตุดาอ	สำรวจ	นายสุเมธ ชุมภะพันธ์		
	ออกแบบ	นายสมคิด ศาตะ		
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายนิรุฒ เจริญ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
สารบัญแบบ	เขียนแบบ	นายชวรินทร์ ศาตะ	อนุมัติ	
	ตรวจ	นายสุเมธ ชุมภะพันธ์		
แบบเลขที่ อบ.ย.ค	แผ่นที่ 2	นายเอกกร ชื่น		
แก้ไขครั้งที่		นายนิรุฒ เจริญ		

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

เลขวท.....หน้า 5

จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ
ที่ STA. 0+000
N 06.2546637 , E 101.2493502

จุดสิ้นสุดโครงการ ฯ
ที่ STA. 0+900
N 06.2472965 , E 101.2460994



แผนที่ประเทศไทย

ลักษณะ



ทางหลวงแผ่นดิน(กรมทางหลวง)



ทางโครงการฯ ที่จะทำการก่อสร้าง



แม่น้ำ , ลำคลอง



หนองน้ำ , ห้วย



ทฤษฎีบท



২০১৩, ২০১৪, ২০১৫

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26



(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ) Rongkhan

รองนายกองค์การบริหารส่วน

(ลงชื่อ) นายพลนันทกำริพรหม อดิศัย

323

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภิรรินทร์ ทองเทศ)

(.....)

(27/3)

นางสาวสุภาวดี เล็กบางพงค์

.....

แผนกที่สี่ เขบ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เส้นทางสาย		สำรวจ		นายอุดม นุญ	เห็นชอบ 	ปตท.จำกัดการบริการส่วนจังหวัดยะลา
สายบ้านจะกาโป - บ้านนาุดาจะ		สำรวจ		นายชไม ชุมภพันธ์		
		ออกแบบ		นายอดิศักดิ์ ตาละ		
แบบแสดง		เขียนแบบ		นายนิรุติ เจริญ	อนุมัติ 	
แผนที่สังเขป		เขียนแบบ		นายอรามัน ตาละ		
		ตรวจ		นายชไม ชุมภพันธ์		
แบบครั้งที่ ๑ บ.ย.ค.	แผ่นที่ ๓	หน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ		นายเอกรักษ์ ยี่สิบ		
แก้ไขครั้งที่ ๑		ผู้อำนวยการกองช่าง		นายบัณฑิต เพ็ชรवार	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ
ที่ STA. 0+000
N 06.2546637 , E 101.2493502

ถนนคสล.เดิม กว้าง 5.00 ม.

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ
Luffy Enterprise Limited partnership

(ลงชื่อ)

นายศรายุธ เล็กบางพด

STA. 0+061

ท่อเพิ่ม คสล. 1 - Ø 0.60 x 8 = 8 เมตร
และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

STA. 0+300

ท่อเพิ่ม คสล. 1 - Ø 0.60 x 8 = 8 เมตร
และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

STA. 0+350

ท่อเพิ่ม คสล. 1 - Ø 0.60 x 9 = 9 เมตร
และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

STA. 0+601

ท่อเพิ่ม คสล. 1 - Ø 0.60 x 9 = 9 เมตร
และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

STA. 0+790


ท่อเพิ่ม คสล. 1 - Ø 1.00 x 10 = 10 เมตร
และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

จุดสิ้นสุดโครงการ ฯ
ที่ STA. 0+900
N 06.2472965 , E 101.2460994




องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เดินทางสาย	สำรวจ	นายสุสมาน ชูนิ	เงินรอบ
สายบ้านเกาะปาย - บ้านบุดดา	สำรวจ	นายสุโสม ชูนิ	
	ออกแบบ	นายอสมิต ตาละ	
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายนิศกุล เจ๊ะชู	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แปลนถนนคสล.	เขียนแบบ	นายอามัน ตาละ	อนุมัติ
	ตรวจ	นายสุโสม ชูนิ	
แบบเสร็จที่ อบจ.ยล	หน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายเอกราช ยี่เส้น	
แก้ไขครั้งที่	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายนิศกุล เจริญการ	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

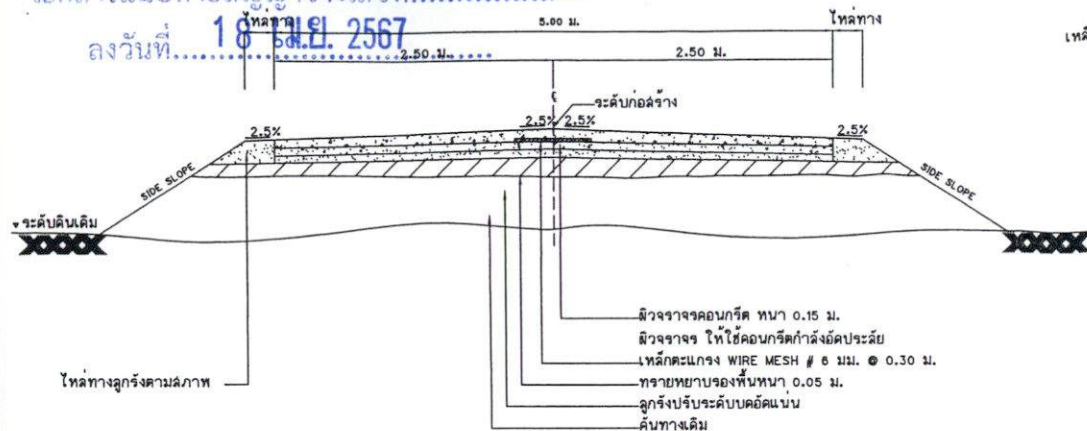

รูปตัดแสดงโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคุณสมบัติวัสดุ

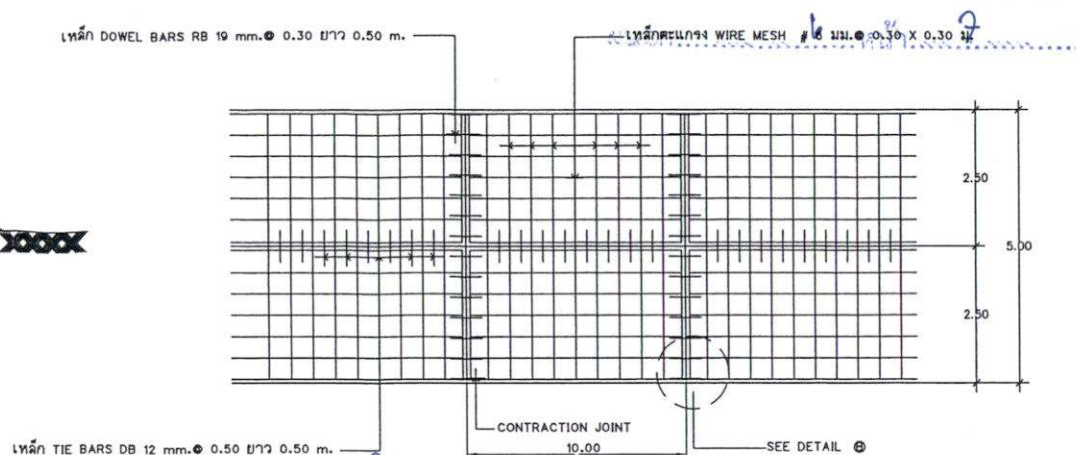

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ส.ล.

บัญชีปริมาณงาน

ลำดับ	รายการแบบ	หน่วย	ปริมาณงาน	อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง
1	งานถางป่าและขุดคอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	2,700.00	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม	4,500.00	แบบเลขที่ ทด-2-201 (2)
3	งานรองพื้นทางลูกรัง บดคั่นบนหนา 20 ซม.	ลบ.ม.	972.00	แบบเลขที่ ทด-2-201 (2)
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	225.00	แบบเลขที่ ทด-2-201 (2)
5	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ๓	ตร.ม.	4,500.00	แบบเลขที่ ทด-2-201 (2)
6	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	445.00	แบบเลขที่ ทด-2-202
7	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	900.00	แบบเลขที่ ทด-2-202
8	งานทางเชื่อมผิวทาง คลสิ. หนา 15 ซม.	ตร.ม.	385.00	แบบเลขที่ ทด-2-201 (2)
9	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	แบบเลขที่ ทด-2-202
10	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	แบบเลขที่ ทด-2-202
11	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ๕ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	16.00	แบบเลขที่ ทด-5-101
12	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ๕ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	16.00	แบบเลขที่ ทด-5-101
13	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ๕ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	10.00	แบบเลขที่ ทด-5-101
14	งานแผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	ตร.ม.	0.72	แบบเลขที่ ทด-3-108
15	งานเสาป้ายคอนกรีต ขนาด 0.12 x 0.12 ม.	ม.	3.00	แบบเลขที่ ทด-3-108

หมายเหตุ

1. จำนวนพื้นที่และแถวและตำแหน่งในการวางที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมสภาพพื้นที่อันอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ทั้งยังขอความร่วมมือจากเดิม
2. ตำแหน่งก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดใต้ดิน, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ และบ่อที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. ไรต์ทาง อันเกี่ยวกับสภาพพื้นที่
4. งานตัด (ได้แก่ งานตัดดิน, งานตัดหินทุบ, งานตัดหินแข็ง และงานคั่นหินฯ)
5. อาจมีแบบมาตรฐานจากทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ตารางที่ 1. แล่งขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

BAR MESH (fs = 1,200 Ksc) (เหล็กเส้นกลม SR 24)		WIRED MESH (fs = 2,750 Ksc) (เหล็กเชื่อมตะแกรงลวดรีดรูป)	
DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม. / ม.)	DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม. / ม.)
Ø 6 มม. @ 0.40 ม.	0.710	Ø 4 มม. @ 0.30 ม.	0.419
Ø 9 มม. @ 0.30 ม.	2.12	Ø 6 มม. @ 0.30 ม.	0.940

รายการก่อสร้างถนน

1. การก่อฉาบฉาบ คสล. ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามวิถุประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำหนด
2. EXPANSION JOINT จะใช้เฉพาะกรณีที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างที่มีฐานจากมันลงหรือบริเวณทางแยกที่เป็นถนนคอนกรีต
3. ใช้ฉาบบนรอยต่อของเส้นบดหินปูนชนิดฟูลคอร์ต (POUR-ON CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
4. ใช้ฉาบบนรอยต่อของคอนกรีต (JOINT FILLER) โดยใช้ราคาขายน้อยที่สุดตามมตร.มอก.1041
5. ค่ารับบดอัด (SLUMP) ไม่ต่ำกว่า 7 ซม. และแรงกด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./คว.ซม.
6. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.20 และ มอก.24
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH มีบท.737 ตามมาตราที่ 1. และ BAR MESH ได้ โดยให้ผู้จ้างดูแลในบริเวณคุณภาพจากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ โดยอาจเขียนแบ่งดังกล่าวให้มีผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือจากตารางพื้นที่หน้าตัดเหล็กตะแกรง (STEEL AREA) ที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า ที่จะปัวไว้ในตารางที่ 1
8. มิติต่างๆ บนผังไว้เป็นบรรทัด อาจจะมีระบุไม่ครบอย่างอื่น
9. การทำผิวบน คอนกรีตใหม่ยาก ให้ทำโดยวางแปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง โดยช่องที่เกิดจะตึงดีไม่เกิน 2 มม.
10. การเดินรางน้ำ ให้ได้เฉพาะเส้นแบ่งทิศทางรางน้ำ (GUTTER LINE) โดยใช้สีเทอร์โมพลาสติก ตาม มอก.542
11. ระยะความกว้างขอบแนวระนาบ ขึ้นอยู่กับอัตราบรรทุก 15ตัน ปริมาณจราจร (ADT) 200 คันต่อวัน
12. การบดอัดคอนกรีต เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะต้องบ่มอย่างน้อยไม่น้อยกว่า 7 วัน




องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


เส้นทางสาย สายบ้านจระกาศไป - บ้านนาหวาง	สำรวจ		นายสุตมาน ภูมิ	เห็นชอบ	 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อนุมัติ 
	สำรวจ		นายสุโขทัย ชุมชนพันธ์		
แบบแสดง	ออกแบบ		นายอสมิต ฑาละ		
รูปตัดและโครงการ ถนนอนุสาวรีย์เสริมหลัก	เขียนแบบ		นายนิศุต เจริญ		
	เขียนแบบ		นายธานี ฑาละ		
	ตรวจ		นายสุโขทัย ชุมชนพันธ์		
แบบเสร็จ ๒๗.๐๓	แผ่นที่ 5	หน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายเอกกร ธิเย็น		
แก้ไขครั้งที่		ผู้อำนวยการกองช่าง	นายนิศุต เพ็ชรवार		นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567


หน้า 8




CONTRACTION JOINT



LONGITUDINAL JOINT



CONSTRUCTION JOINT



แปลนไม้กวาด


รูปด้านหน้า

รูปด้านข้าง

แบบขยายไม้กวาดลากผิวพื้น ค.ล.ล.

เหล็ก DOWEL BARS RB 19 mm. 0.30 ม/ท 0.50 ม.

เหล็กตะแกรง WIRE MESH # 6 มม. 0.30 X 0.30 ม.

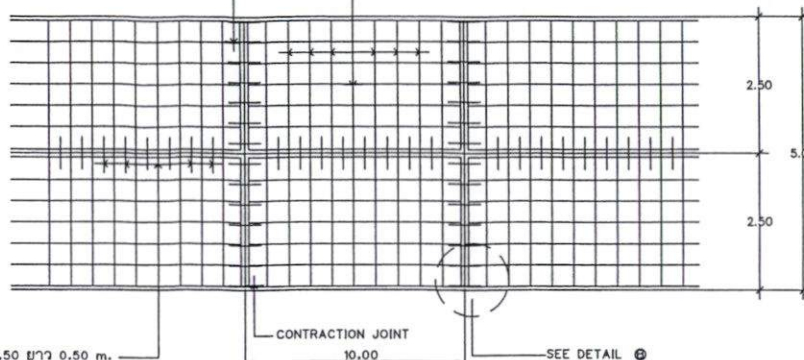

เหล็ก TIE BARS DB 12 mm. 0.50 ม/ท 0.50 ม.

แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ล.ล.

ข้อกำหนดรายการประกอบแบบก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(นาย อัจฉริยะ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)

นายศรายุทธ เล็กบางพงค์

- ยกเลิกข้อความรายการประกอบแบบ ข้อที่ 1 แบบเลขที่ ทอ-2-202 มิฉะนั้นจะคอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 325 กก./ซม. ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม.
- ยกเลิกแผ่นพลาสติก CONTRACTION JOINT, CONSTRUCTION JOINT
- MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้ตามมาตรฐาน AASHTO M.173-60 (1974) , ASTM D. 190-74
- JOINT FILLER ให้ใช้ตาม AASHTO M. 153-70 , ASTM 1753-67 (1973)
- อุปกรณ์เสริมที่ใช้ WIRE MESH (มอก.) แทนเหล็กเสริมตามตารางที่ 1 ได้โดยผู้รับจ้างจะต้องแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตให้วิศวกรตรวจสอบก่อนดำเนินการและในกรณีที่มีการตัดทอน WIRE MESH ระยะการตัดทอนจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม. ทั้งนี้พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า MINIMUM EQUIVA STEEL AREA OF WIRE MESH ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
- วัสดุที่ไม่ได้กำหนดในแบบนี้ ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานงานหลวงชนบท
- มิติเป็น "เมตร" ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
- รอยต่อในคอนกรีตยกเว้น EXPANSION JOINT ให้ทำรอยต่อด้วยเครื่องเจาะร่องคอนกรีต
- การเทคอนกรีตให้ใช้ CONCRETE PAVER ในกรณีที่จำเป็นจะต้องเทคอนกรีตด้วยแรงคนให้เทคอนกรีตได้เฉพาะช่วงที่เว้นไว้อย่างน้อย 30 เมตร
- การทำผิวหน้าให้ทราบ ให้ทำโดยลากแปรงจากฉากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ และให้หล่อลื่นกับโดยช่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.



องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เส้นทางสาย	สำรวจ	นายสุมนาน บุญ	เห็นชอบ
สายบ้านมะกาไป - บ้านคุดคาง	สำรวจ	นายสุเมธ ชุมมนพันธ์	
	ออกแบบ	นายอศมิล ดาละ	
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายนิศกุล เจริญ	ปัดช่องการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
	เขียนแบบ	นายอานัน ดาละ	อนุมัติ
	ตรวจ	นายสุเมธ ชุมมนพันธ์	
แบบร่างที่ ๑๓๐๓	แผ่นที่ ๑	นายเอกรักษ์ ยี่เสน	
แก้ไขครั้งที่	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายนิพนธ์ เพ็ชรภาพาร	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

หน้า 9

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเงาะกาโป - บ้านบาตูดางอ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร	
ปีงบประมาณ: 2567 แหล่งเงินที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา วงเงินก่อสร้าง:	ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา วันเริ่มต้นประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

รายละเอียดด้านหน้าป้าย

(นายระเด่น สะมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ) พยาน

(นางสาวภิรินทร์ ทองเทศ) พยาน

(นายศรายุธ เล็กบางพงค์) พยาน

รายการประกอบแบบ

- การติดตั้งป้ายให้ดูรายละเอียดในแบบเลขที่ ทด-3-107, ทด-3-108
- กรณีซื้อขายทางใบป้ายโครงการมีความยาวหลายทางไม่เกิน 1 บรรทัดให้ใช้อักษรที่มีขนาดความสูงมากกว่า 7.5 ซม. ได้แก่ ไม่เกิน 10 ซม.
- หมึกพิมพ์ให้ใช้หมึกพิมพ์ชนิดโปรงแลง ที่มีอายุการรับประกันเทียบเท่าแผ่นละทอนแลง
- ป้ายบังคับ ป้ายเตือนและป้ายแนะนำให้ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบล้างกะดี ทนไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
- เล่า คลด. ให้ทำดีขาวและสีดำ อย่างน้อย 2 ครั้ง สีที่ใช้ตาม มอก.327

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
เส้นทางสาย	สำรวจ	นายอุสมาน ยูนิ	เห็นชอบ	
สายบ้านเงาะกาโป - บ้านบาตูดางอ	สำรวจ	นายอุสมาน ยูนิ		
	ออกแบบ	นายอสมิต ตาละ		
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายนิศกุล เจ๊ะซู	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	เขียนแบบ	นายอสมิต ตาละ	ขมูติ	
	ตรวจ	นายอุสมาน ยูนิ		
แบบครั้งที่ ๑๖๕๓	แผ่นที่ ๗	นายอุสมาน ยูนิ		
แก้ไขครั้งที่	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	นายเอกราช ยี่เส้น		
		นายนิคม เพ็ชรภากร	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

2.40

0.30

0.30

1.20

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ถนนวงเวียน 2 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทร. 073-203610 ต่อ 210

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสลายบ้านเงาะกาโป - บ้านบาตูดางอ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร

ผู้รับจ้างที่อยู่..... ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง.....โทร.....

วันเริ่มต้นสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา..... รวมระยะเวลา.....วัน

วงเงินงบประมาณ คณะกรรมการตรวจการจ้าง (นายระเด่น สะมะแอ)

ราคากลางค่าก่อสร้าง 1.....ประธาน ร้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วงเงินตามสัญญาจ้าง 2.....กรรมการ โทร.....นายทองเล็ก อบจ. จ. ยะลา

ผู้ควบคุมงาน 1.....โทร..... 3.....กรรมการ โทร.....

2.....โทร..... 4.....กรรมการ โทร.....

5.....กรรมการ โทร.....

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

0.35

แบบแผนป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง
NOT TO SCALE

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ)พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

รายละเอียดป้าย

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไม้อัด ขนาด 4 มม. หรือไวนิล
- พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรและเส้นขอบสีขาว
- ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
- โครงคร่าวไม้ขนาด 2" x 4"
- ตัวป้ายติดตั้งสูงจากพื้นดิน 2.00 เมตร
- มีติดเป็นเมตรนอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
- ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เส้นทางสาย	สำรวจ	นายอุดม นุญ	เห็นชอบ
สายบ้านเงาะกาโป - บ้านบาตูดางอ	สำรวจ	นายสุโขทัย ชุมพันธ์	
	ออกแบบ	นายสมนึก ตาตะ	
แบบแสดง	เขียนแบบ	นายนิศุต เพ็ญ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แบบนำเสนอรายละเอียดงานก่อสร้าง	เขียนแบบ	นายอามิน ตาตะ	อนุมัติ
	ตรวจ	นายสุโขทัย ชุมพันธ์	
แบบครั้งที่ ๒๒๒๒๒	หน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ	นายเอกธวัช ยี่เต็น	
แก้ไขครั้งที่	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายนิศุต เพ็ญ	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามในสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๓. ในกรณีที่เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
๔. กรณีที่เป็นวัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตามข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถตรวจสอบเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองเอกการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(.....) Enterprise

(ลงชื่อ).....Limited partnership พยาน

(นางสาวภริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาค่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) Luffy Enterprise
Limited partnership

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2567

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายระเด่น สมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปณิธานีการแทน

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) บริษัท อธิปไตย Enterprise
Limited partnership

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567

ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ

รายการพัสดุทั้งโครงการ

xxx รายการ

มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ

xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- ☐ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ ร้อยละ ๖๐ พสดุทั่วไป (มูลค่า)
- ☐ ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

- ☐ ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

(นายระเด่น สมะแอ) ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลัด อบจ. ยะลา

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ) Enterprise

(ลงชื่อ) Limited partnership พยาน

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)

(ลงชื่อ) พยาน

นายศรายุธ เล็กบางพงค์

การจัดทำแผนการทำงาน

คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้
แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา สำหรับตัวอย่างการจัดทำแผนการทำงานรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผ่น

(ลงชื่อ)

(นายระเด่น สะมะแอ)

ผู้ว่าราชการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)  **Luifly Enterprise**

(ลงชื่อ)

Luifly Enterprise Limited partnership

(นางสาวกิริรินทร์ ทองเทศ)


(ลงชื่อ)

 พยาน

(นายศรายุทธ เล็กบางพงค์)

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง					
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2	งานสีผิวทาสี					
	รายการ...	ตร.ม.				
	รายการ...	ตร.ม.				
	รวม					0%

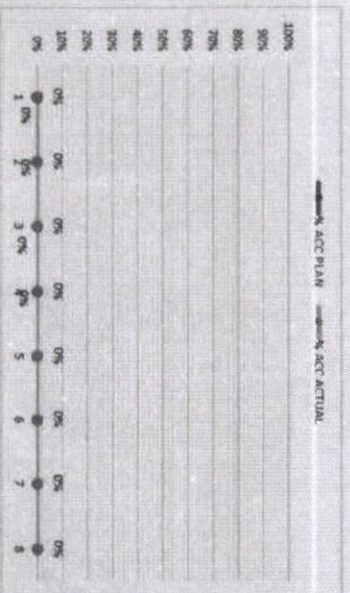

Money	เงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
AccMoney	(ลงชื่อ) นายระเด่น สิมะเนอ							
% PLAN	รวมยอดค่าจ้างบริการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง							
% ACC PLAN	(ลงชื่อ) นายระเด่น สิมะเนอ							
% ACTUAL	(ลงชื่อ) นายระเด่น สิมะเนอ							
% ACC ACTUAL	(ลงชื่อ) นายระเด่น สิมะเนอ							
% ACC DIFF	(นางสาวกิริยาพร หอมผล)							
% PLAN/2	(ลงชื่อ) นายระเด่น สิมะเนอ							
% PLAN/2 DIFF	(ลงชื่อ) นายระเด่น สิมะเนอ							

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบค่าเป็นงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายเหตุ: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแนบค่าเป็นงานของแผนโครงการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง
 - หมายเหตุ: ร้อยละของงานที่ได้รับจากข้อบังคับการก่อสร้างตามแนบค่าเป็นงานของแผนโครงการ
 - Money: มูลค่างานโครงการ ค่าจ้างจากข้อบังคับการก่อสร้างตามแนบค่าเป็นงานของแผนโครงการ
 - % PLAN: ร้อยละของแนบค่าเป็นงาน ค่าจ้างจากข้อบังคับการก่อสร้างตามแนบค่าเป็นงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานที่โครงการ

นายระเด่น สิมะเนอ
Luivy Enterprise
Limited-partnership


(นางสาวกิริยาพร หอมผล)

พยาน

ลงวันที่ ๘. เม.ย. 2567

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเสริม	a1	100	5,000	500,000	16%
		a2	120	2,000	240,000	8%
2	งานไฟฟ้า	b1	400	2,000	800,000	26%
		b2	300	5,000	1,500,000	49%
		รวม			3,040,000	100%

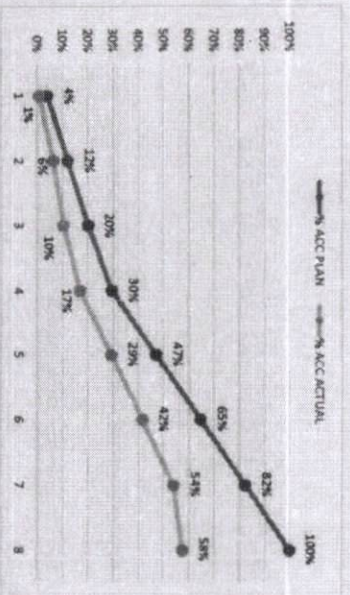


	1	2	3	4	5	6	7	8
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								
พค								
ศค								
มค								
กค								
จค								
ซค								
ดค								
คค								

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม					
	a1	กบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	กบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานอื่นๆ					
	b1	กบ.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	กบ.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
					3,040,000	100%

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$

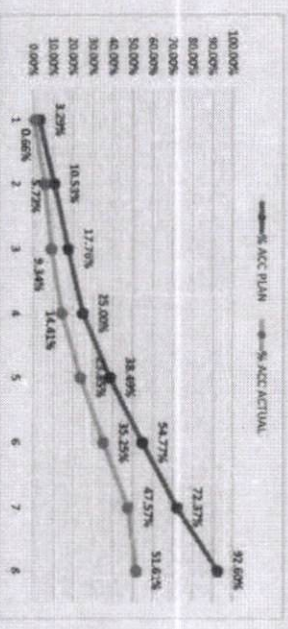

เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8
คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
20	20	20	20	20	20	20	20
50	50	50	50	50	50	50	50
15	15	15	15	15	15	15	15
10	10	10	10	10	10	10	10
25	25	25	25	25	25	25	25
25	25	25	25	25	25	25	25

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	100%	220%	220%	220%	410%	495%	535%	615%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	10.53%	10.53%	10.53%	10.53%	10.53%	10.53%
% ACTUAL	0.66%	1.72%	1.72%	1.72%	1.72%	1.72%	1.72%	1.72%
% ACC ACTUAL	3.29%	5.72%	5.72%	5.72%	5.72%	5.72%	5.72%	5.72%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.53%	10.53%	10.53%	10.53%	10.53%

หมายเหตุ: 1) การคำนวณดังกล่าวเป็นการประมาณการตามแผนการดำเนินงาน 2) ข้อควรระวัง: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนการดำเนินงาน 3) ข้อควรระวัง: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนการดำเนินงาน 4) ข้อควรระวัง: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนการดำเนินงาน 5) ข้อควรระวัง: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนการดำเนินงาน 6) ข้อควรระวัง: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนการดำเนินงาน 7) ข้อควรระวัง: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนการดำเนินงาน 8) ข้อควรระวัง: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนการดำเนินงาน 9) ข้อควรระวัง: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนการดำเนินงาน 10) ข้อควรระวัง: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนการดำเนินงาน

(ลงชื่อ)

นายศรีรายณ์ เล็กบางพงค์

พยาน

(ลงชื่อ)

นายศรีรายณ์ เล็กบางพงค์

พยาน

สิ่งทีเ่ด่งมาด้วย ๔

အိတ်ကုန်း

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$


- 1) *Средства формирования и развития мышления* (100 экз.)
- 2) *Средства формирования и развития мышления* (100 экз.)
- 3) *Средства формирования и развития мышления* (100 экз.)
- 4) *Средства формирования и развития мышления* (100 экз.)
- 5) *Средства формирования и развития мышления* (100 экз.)

12

11. 11. 11

100

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਗ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๑๖๘/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเงาะกาโป - บ้านบาตูดางอ หมู่ที่ ๓ ตำบลบันนังสตา
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเงาะกาโป - บ้านบาตูดางอ หมู่ที่ ๓ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเงาะกาโป - บ้านบาตูดางอ หมู่ที่ ๓
ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. นางดารุณี สองแก้ว

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

๒. นางสาวรุชีต้า ยะมะลี

กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๓. นายนันทรุส เจ๊ะซู

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายนันต์ เพ็ชรการ

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายเอกราช ยี่เส้น

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๓. นายอสมิต ตาละ

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกงานด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายชูโฮมี ชุมชุมพันธ์

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาอาวุโส

๒. นายอามัน ตาละ

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน และรับผิดชอบคำนวณขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึงกำหนดให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงาน พร้อมรายงานผลผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุทุก ๓ เดือน จนกว่าจะสิ้นภาระผูกพันตามสัญญาให้ทราบด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
